



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"



INFORME MENSUAL

Unidad de Ejecución de Obras

Setiembre 2014

OBRA EN EJECUCION
 I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO DE MENDOZA
 La Libertad - Santiago de Chuco
 Monto Contratado : S/.27,806,000.00
 Avance Fisico : 13.33%



Unidad Gerencial de Estudios y Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Contenido:



- 01.- Obras en Ejecución a Setiembre 2014**
- 02.- Procesos de Convocatoria**
- 03.- Obras Terminadas de Ene. - Set. 2014**
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú**
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.**
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión**
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2014 (Setiembre)**
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias**
- 09.- Términos y Definiciones.**
- 10.- Descripción Visual de Actividades y/o de elementos empleados en diversas Obras Civiles**

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED
Anexo 25513 - Ans. Boris Alvarez Rodriguez



PERÚ

Ministerio
de Educación





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	21
2	PROGRAMA REGULAR	2
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	3
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		26

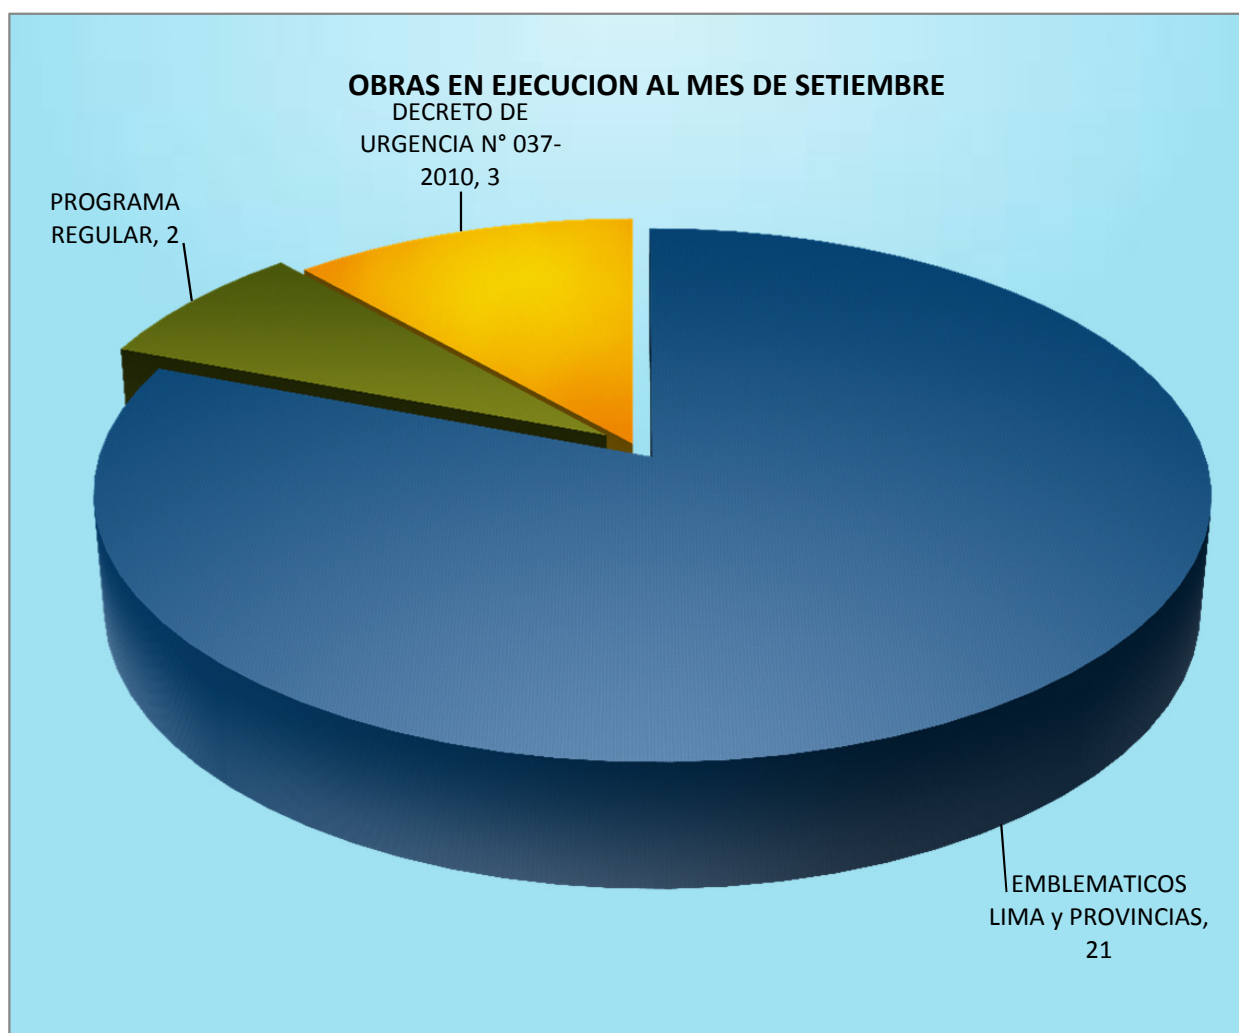

**Unidad de Ejecución de Obras
PRONIED**



PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EN EJECUCION

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PAGOS Tramitados (*)	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito				Inicio	Fin	

EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS

1	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENS	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116,708.99	78,519.57	65	19/07/2014	21/09/2014	67.28%
2	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29,676,844.92	28,712,752.22	399	25/01/2011	27/02/2012	98.60%
3	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36,049,600.51	24,714,275.14	420	19/09/2013	12/11/2014	45.58%
4	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26,471,455.63	25,664,404.52	360	22/08/2013	16/08/2014	91.66%
5	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4,768,794.46	3,773,368.50	210	08/04/2014	03/11/2014	47.36%
6	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19,695,000.00	13,505,340.57	300	01/04/2014	25/01/2015	59.87%
7	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6,577,174.33	1,706,536.64	240	10/05/2014	04/01/2015	8.45%
8	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29,472,235.45	12,685,382.05	360	04/07/2014	28/06/2015	3.76%
9	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22,630,000.00	11,873,376.90	360	06/05/2014	30/04/2015	27.59%
10	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHU	SANTIAGO DE CHU	27,806,000.00	11,329,946.60	360	14/06/2014	08/06/2015	13.33%
11	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18,429,104.54	5,302,453.30	360	06/06/2014	31/05/2015	11.45%
12	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24,270,355.38	25,522,555.69	424	30/01/2013	29/03/2014	99.49%
13	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32,677,940.09	30,975,710.29	620	14/12/2012	25/08/2014	89.25%
14	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION (P)	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32,532,033.80	32,715,324.10	656	14/12/2012	30/09/2014	99.79%
15	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	37,843,592.07	36,340,144.74	656	04/01/2013	21/10/2014	93.78%
16	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	33,133,680.41	29,131,512.11	662	22/01/2013	14/11/2014	90.35%
17	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	27,522,410.07	26,624,797.92	622	03/01/2013	16/09/2014	91.48%
18	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	32,951,466.31	29,368,756.82	595	19/01/2013	05/09/2014	69.58%
19	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	22,474,984.17	19,103,790.00	603	26/02/2013	21/10/2014	64.36%
20	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	14,485,990.52	8,786,723.88	603	15/02/2013	10/10/2014	71.60%
21	IE AURELIO CARDENAS PACHAS	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	15,475,681.57	13,825,319.28	599	16/02/2013	07/10/2014	85.53%

PROGRAMA REGULAR

1	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv- 10Kv (P)	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296,149.36	0.00	75	14/08/2014	27/10/2014	-
2	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE P	2,850,259.95	1,046,425.90	180	07/06/2014	03/12/2014	20.42%

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 9 DE DICIEMBRE	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	3,329,900.07	3,164,775.28	270	23/12/2013	18/09/2014	90.96%
2	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5,586,133.51	2,897,944.84	221	14/05/2014	20/12/2014	19.54%
3	IE 22424	ICA	PALPA	RIO GRANDE	2,381,260.63	1,894,943.11	180	26/03/2014	21/09/2014	68.35%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la USOM. (*) La información de pagos tramitados, corresponden a datos del control de la Unidad de Obras. Los plazos de ejecución incluye las ampliaciones de plazo aprobadas por la Entidad. Asimismo, el monto contractual considera los importes por obras adicionales y/o deductivos.
 - (P) = Obra Paralizada.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	28
2	POR CONVOCAR	9
TOTAL DE OBRAS EN PROCESO		37



**Unidad de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA PROCESOS POR CONVOCAR Y EN CONVOCATORIA

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Procesos en Convocatoria :

-	EMBLEMATICAS - PROV.	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	0111-2014-ED	13/03/2014	9,189,672.59	POR INICIAR : OBRA : CONSORCIO JUNIN SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISION SAN JOSE
-	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	0110-2014-ED	13/03/2014	1,984,719.35	POR INICIAR : OBRA : CONSORCIO ALFA SUPERVISION : Proceso RECURSO DE APELACION
-	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	0073-2014-ED	25/02/2014	25,210,178.52	POR INICIAR : OBRA : CONSORCIO BRACAMOROS SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR SEPI (proceso adjudicado - firma contrato 23/10/14)
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	0162-2014-ED	10/04/2014	6,552,048.51	OBRA : MG BUILDERS EIRL. (firma contrato el 15.10.14) SUPERVISION : Proceso de convocatoria BUENA PRO 09.10.14
2	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	0195-2014-ED	29/04/2014	180,031.44	OBRA: FORMULACION DE CONSULTAS SUPERVISION : Por convocar
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	0285-2014-ED	02/07/2014	34,528,233.91	OBRA: PROGRAMACION Y COSTOS desde el 27/0/2014 para inclusión al PAC. SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR RUPA RUPA
4	EMBLEMATICAS - PROV.	LEONCIO PRADO - II ETAPA	HUANUCO	0109-2014-ED	13/03/2014	5,871,624.66	OBRA: CONSORCIO CALLERIA (firma contrato el 14/10/14) SUPERVISION : HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	0357-2014-ED	26/08/2014	38,540,023.79	OBRA : Proceso convocatoria - BUENA PRO 06/11/14 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR : VILLA MARIA (proceso Adjudicado - firma contrato 20/10/14)
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE GRANDA	LIMA	0314-2014-ED	24/07/2014	38,049,681.12	OBRA : Proceso de convocatoria BUENA PRO 02/10/2014 SUPERVISION : CONSORCIO P&G (Firma contrato el 02/10/14)
7	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 - JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	0301-2014-ED	14/07/2014	3,486,304.37	OBRA : PRONUNCIAMIENTO OSCE /30.07.14 SUPERVISION : LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION 20.08.14
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	0075-2014-ED	25/02/2014	21,786,098.82	OBRA : CONTRATA E INGENIERIA SA SUCURSAL DEL PERU SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR TORIBIO
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	0132-2014-ED	25/03/2014	24,307,392.07	OBRA : CONSORCIO MESONES (adjudicado- firma contrato 21/10/14) SUPERVISION : En proceso BUENA PRO 13.10.14
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	0088-2014-ED	05/03/2014	21,133,335.64	OBRA: Proceso BUENA PRO 14/10/14 SUPERVISION : En Proceso BUENA PRO 01.10.14 - INTEGRACION BASE
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	0002-2014-UGEO	23/09/2014	21,714,288.11	OBRA : Proceso de convocatoria BUENA PRO 17/10/2014 SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR LEONCIO PRADO (Adjudicado-firma contrato 21/10)
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	0131-2014-ED	25/03/2014	18,813,900.40	OBRA : CONSORCIO JUNIN (Adjudicado-firma contrato 23/10) SUPERVISION : En proceso BUENA PRO 09.10.14
13	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	0099-2014-ED	06/03/2014	21,664,782.30	OBRA : CONSORCIO UNION (Adjudicado-firma contrato 20/10) SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR PACASMAYO (Firma contrato el 01/10/14)
14	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	0300-2014-ED	14/07/2014	18,139,135.40	OBRA : Proceso de convocatoria BUENA PRO 17/10/2014 SUPERVISION : ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA (Adjudicado)
15	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	0185-2014-ED	24/04/2014	15,424,464.16	OBRA : Proceso BUENA PRO 29/09/14- INTEGRACION BASE SUPERVISION : En Proceso BUENA PRO 07.10.14
16	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	0152-2014-ED	03/04/2014	12,537,440.55	OBRA : CONSORCIO UNIVERSO II (Adjudicado-firma contrato 28/10) SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAVELICA (Adjudicado-firma contrato 28/10)
17	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	0151-2014-ED	03/04/2014	12,605,133.99	OBRA : VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA. SUCURSAL DEL PERU (Adjud.-F. Contrato 23/10) SUPERVISION : En Proceso BUENA PRO 16.10.14

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA

PROCESOS POR CONVOCAR Y EN CONVOCATORIA

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				RESOLUCION	FECHA	MONTO	
18	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	0186-2014-ED	24/04/2014	1,226,926.61	OBRA : En Proceso BUENA PRO 10/10/14 SUPERVISION : CONSTRUCTOR ANIR EIRL.
19	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	0153-2014-ED	03/04/2014	22,101,902.53	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 24.10.14 SUPERVISION : En Proceso BUENA PRO 06.10.14
20	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	0194-2014-ED	29/04/2014	23,808,077.05	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 20.10.14 SUPERVISION : En Proceso BUENA PRO 16.10.14
21	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	0236-2014-ED	27/05/2014	16,456,566.22	OBRA : ELEVACION DE OBSERVACIONES A OSCE 29/09/14 SUPERVISION : En Proceso BUENA PRO para el 16/10/14
22	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAVELICA	0003-2014-UGEO	23/09/2014	2,660,327.08	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 31.10.14 SUPERVISION : CONSORCIO BRAVAJAL
23	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	0237-2014-ED	28/05/2014	979,478.73	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 03.10.14 SUPERVISION : En proceso BUENA PRO 30.09.14 - INTEG. BASES
24	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	0238-2014-ED	28/05/2014	14,307,150.37	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 16.10.14 SUPERVISION : Por convocar
25	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	0251-2014-ED	05/06/2014	14,280,245.66	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 17.10.14 SUPERVISION : Por Convocar
26	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	0215-2014-ED	14/05/2014	16,189,378.22	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 22.10.14 SUPERVISION : Por Convocar
27	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	0313-2014-ED	24/07/2014	3,453,173.29	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 06.11.14 SUPERVISION : Por Convocar
28	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	0284-2014-ED	01/07/2014	6,493,337.95	OBRA : Proceso convocatoria BUENA PRO 06.11.14 SUPERVISION : Por Convocar

02.- Procesos por Convocar :

1	PROGRAMA REGULAR	IE 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION - MEDIA TENSION	LIMA	0038-2014-ED	28/01/2014	200,091.04	PROCESO POR CONVOCAR
2	PROGRAMA REGULAR	IE JOHN F. KENNEDY - SISTEMA MEDIA TENSION	ICA	0265-2014-ED	19/06/2014	239,551.46	PROCESO POR CONVOCAR
3	EMBLEMATICAS - PROV.	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	0076-2014-ED	26/02/2014	451,531.90	PROCESO POR CONVOCAR
4	PROGRAMA REGULAR	IE 22468 MARIA PARADO DE BELLIDO - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	ICA	0179-2014-ED	22/04/2014	228,388.05	PROCESO POR CONVOCAR
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	0249-2014-ED	04/06/2014	28,615,249.50	PROCESO POR CONVOCAR
6	EMBLEMATICAS - PROV.	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	0295-2014-ED	09/07/2014	212,776.37	PROCESO POR CONVOCAR
7	EMBLEMATICAS - PROV.	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	0001-2014-UGEO	15/09/2014	1,613,854.44	PROCESO POR CONVOCAR
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	0005-2014-UGEO	29/09/2014	25,120,109.35	PROCESO POR CONVOCAR
9	PROGRAMA REGULAR	IE 20191 ALFONSO UGARTE - MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	LIMA	0269-2014-ED	24/06/2014	242,998.49	PROCESO POR CONVOCAR
37							



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Setiembre 2014

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	6
2	PROGRAMA REGULAR	1
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	3
TOTAL OBRAS TERMINADAS		10

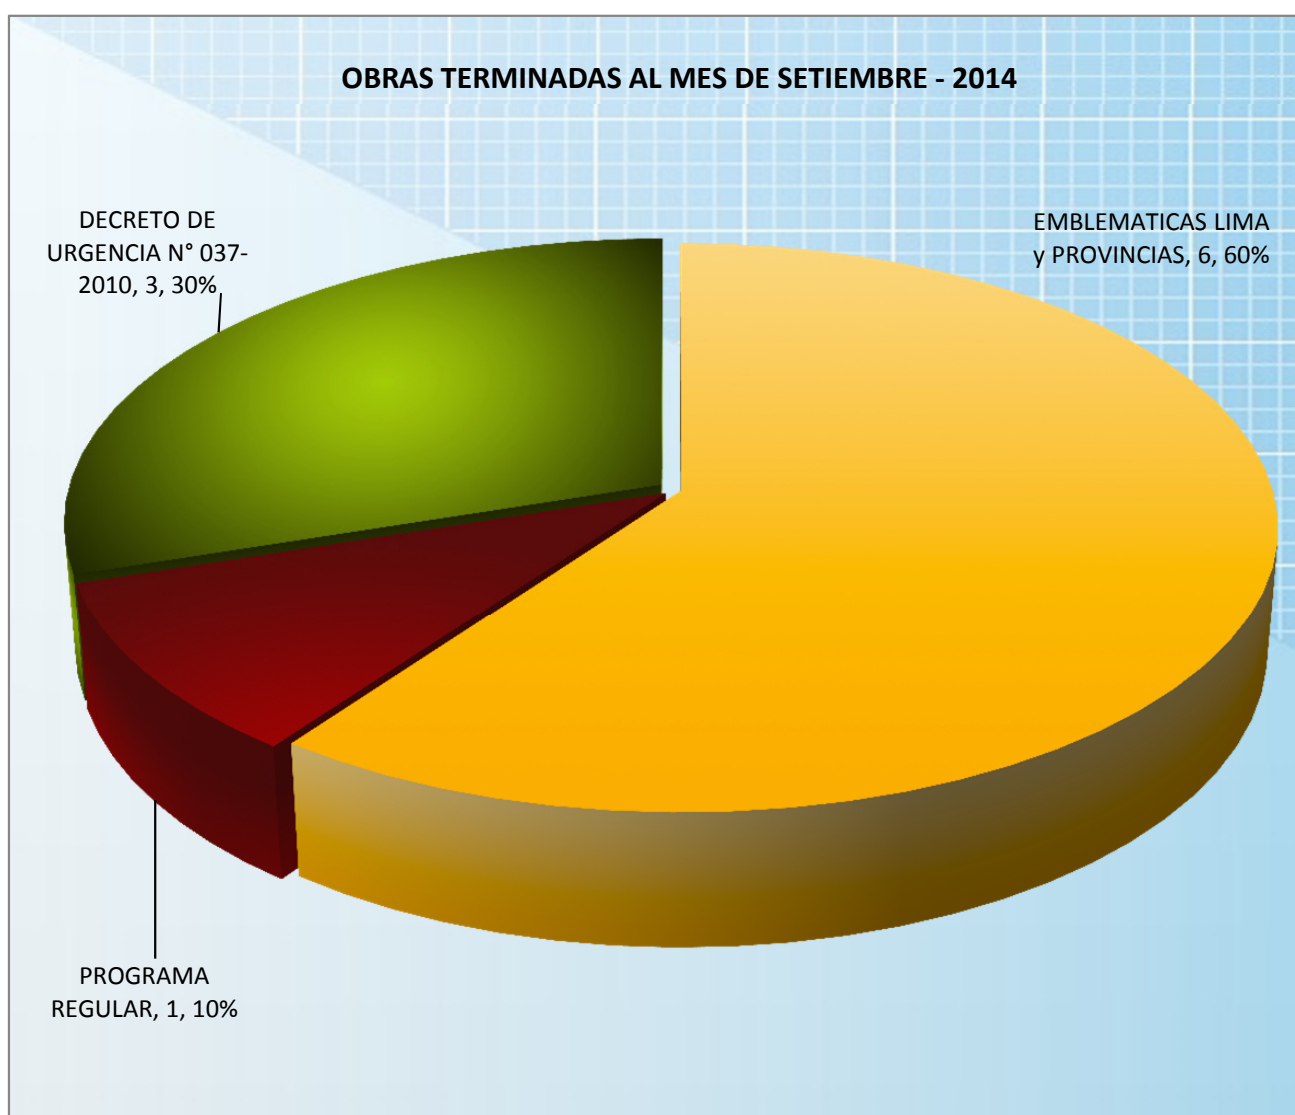

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DE ENERO A SETIEMBRE 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	1,616,926.40	21/04/2014
2	D. URGENCIA N°037-2010	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	5,057,490.13	23/04/2014
3	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	3,547,736.98	-
4	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10, 22.9 KV	ICA	PISCO	PISCO	397,704.05	26/05/2014
5	EMBLEMATICAS - PROV.	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	24,699,549.55	30/04/2014
6	EMBLEMATICAS - PROV.	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	28,360,108.20	09/04/2014
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURICO	20,609,619.62	11/08/2014
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	21,823,821.04	-
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	39,127,289.90	26/06/2014
10	PROGRAMA REGULAR	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	1,869,793.32	13/06/2014

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS - OBSERVADOS

1	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	2,247,766.20	(1)
2	EMBLEMATICAS - PROV.	GUE SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	39,662,413.51	(2)
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	23,682,900.79	(3)

(*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) ONTRATO DE OBRA DECLARADO NULO MEDIANTE RM-0053-2014-ED, : POR HABERSE CONFIGURADO EL SUPUESTO LEGAL DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS FALSOS, POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA MARIA - VIRGO SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL - C&S GUTIERREZ S.R.L.

(2) EN PROCESO DE RESOLUCION DE OBRA, CON MEMORANDUM N°00524-2014-MINEDU-VMGI-OINFE, LA UNIDAD DE OBRAS, JUSTIFICA LA DECLARACION DE RESOLUCION DEL CONTRATO N°0201-2010-ME-SG-OGA-UA-APP, SOLICITANDO AL JEFE DE LA OGA, DAR TRAMITE AL EXPEDIENTE Y DECLARAR LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. (EXP. N° 20386-2014).

(3) CONTRATO RESUELTO, CON CARTA NOTARIAL N°007-2014-CR-RL-FRS DE FECHA 31-03-2014, EL CONTRATISTA COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. - LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRA SE PROGRAMO PARA EL 03-04-2014.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Se vienen ejecutando a la fecha

26

Obras de Infraestructura Educativa

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE SETIEMBRE 2014



Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	90.35%
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	89.25%
3	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	98.60%
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	91.48%
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	69.58%
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	27.59%
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	93.78%
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	59.87%
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	71.60%
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE AURELIO CARDENAS PACHAS	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	85.53%
11	D. URGENCIA N°037-2010	IE 9 DE DICIEMBRE	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	90.96%
12	D. URGENCIA N°037-2010	IE 22424	ICA	PALPA	RIO GRANDE	68.35%
13	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	47.36%
14	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUO	SANTIAGO DE CHUO	13.33%
15	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	99.79%
16	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	91.66%
17	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	8.45%
18	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	-
19	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	19.54%
20	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	20.42%
21	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	11.45%
22	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	99.49%
23	EMBLEMATICAS - PROV.	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	67.28%
24	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	45.58%
25	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	64.36%
26	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	3.76%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la USOM.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	15		
		➡	15	60%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	11	40%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			26	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

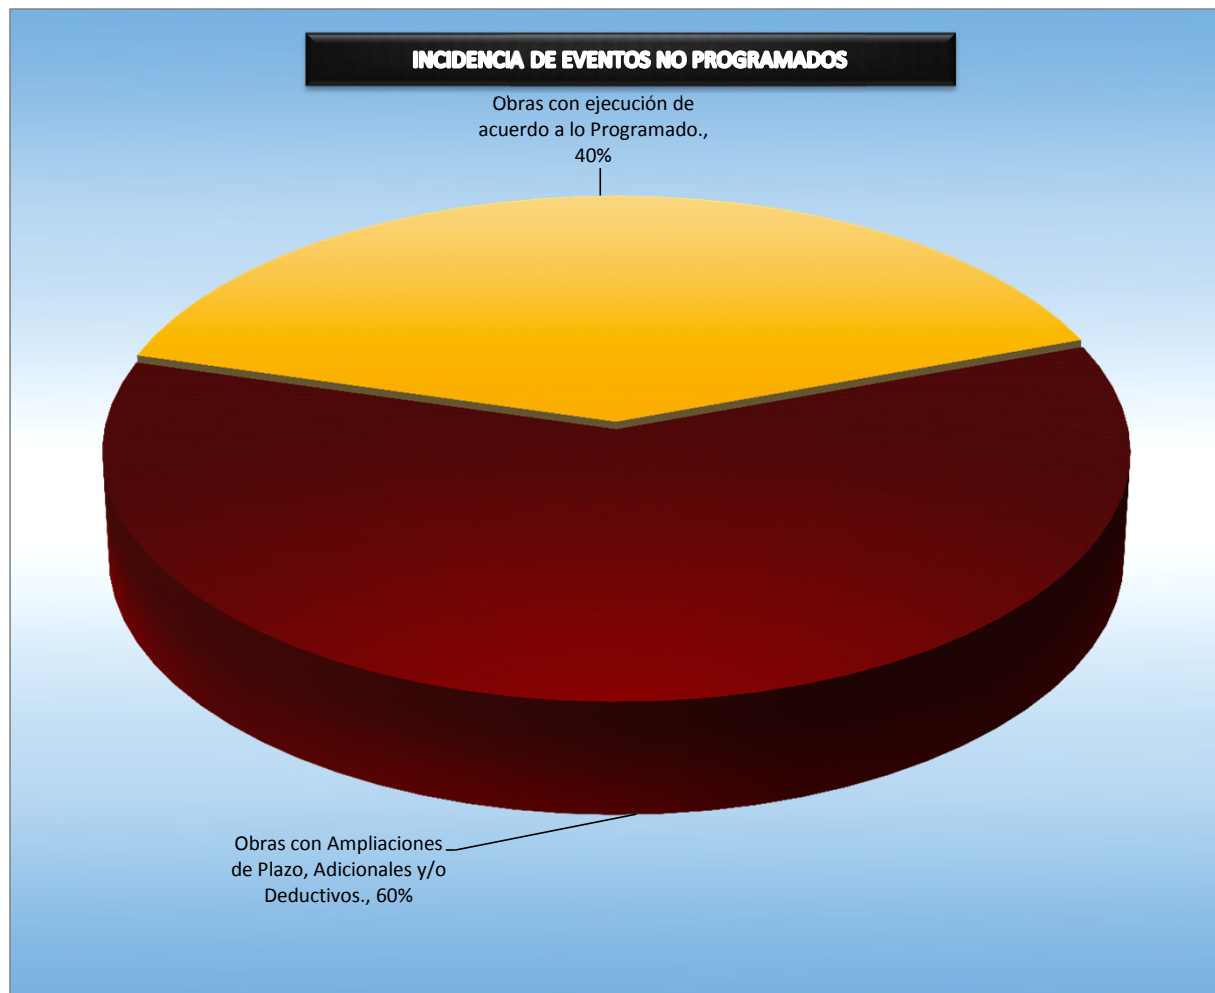

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra , pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construcción, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Setiembre 2014)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - SET	21	13	34 (*)
		21	13	34

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.

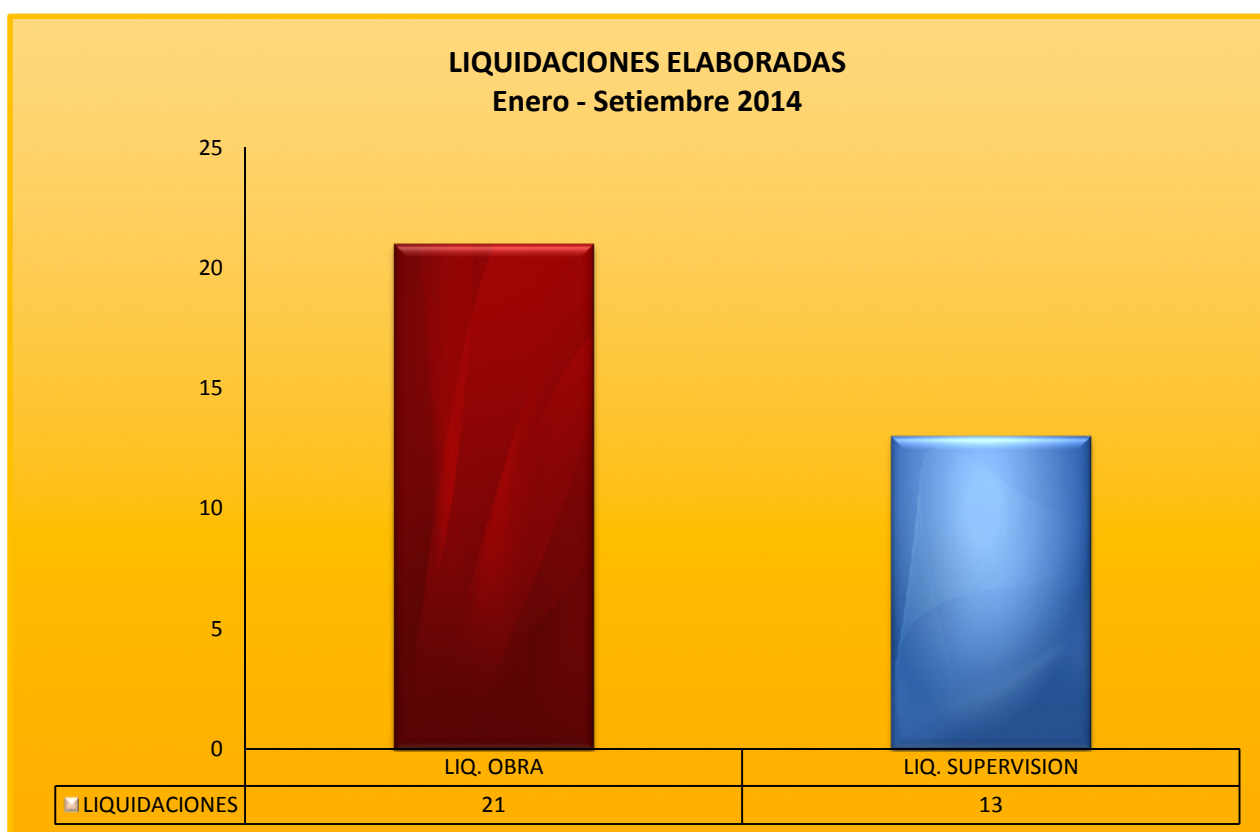

Unidad de Ejecución de Obras PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - SETIEMBRE 2014)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	IE 7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA	TORRES HARO CARLOS ALBERTO	LIMA	289,436.22	RJ-0003-2014-ED	03/01/2014	301,368.72
2	IE 6073 JORGE BASADRE	ONO ASOCIADOS S.A.C.	LIMA	294,568.15	RJ-0005-2014-ED	03/01/2014	304,365.83
3	IE 38083 LOS LICENCIADOS - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO	AYACUCHO	115,200.66	RJ-0004-2014-ED	03/01/2014	115,200.66
4	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	FAMOGA E.I.R.L	APURIMAC	242,850.10	RJ-0007-2014-ED	06/01/2014	238,767.68
5	IE 649 SANTA ROSA DE LIMA	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	LIMA	244,003.94	RJ-0030-2014-ED	24/01/2014	253,534.99
6	IE BANDERA DEL PERU	M & C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.LTDA	ICA	6,030,816.18	RJ-0033-2014-ED	24/01/2014	6,410,069.22
7	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	FAMOGA E.I.R.L	APURIMAC	242,850.10	RJ-0062-2014-ED	17/02/2014	238,767.68
8	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	RF CONSTRUCCION & INVERSIONES S.A.C.	ICA	348,161.19	RJ-0063-2014-ED	20/02/2014	359,096.92
9	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	CONSORCIO FANNING II	LIMA	17,676,984.47	RJ-0178-2014-ED	22/04/2014	18,073,494.12
10	IE 80844	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	611,425.51	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	595,670.02
11	IE 80875	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	529,720.60	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	515,036.37
12	IEI 1831	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	394,191.58	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	388,348.02
13	IE 80061	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	1,021,863.44	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	750,646.56
14	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO GRUPO MAIN - MATH CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAC - INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES SAC	SAN MARTIN	5,050,746.00	RJ-0316-2014-ED	25/07/2014	5,231,495.20
15	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1,616,926.40	RJ-0342-2014-ED	13/08/2014	1,679,673.71
16	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1,616,926.40	RJ-0358-2014-ED	26/08/2014	Reformulación
17	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CONSORCIO CUSCO - A.R.C. S.R.L. - CORRALES INGENIEROS S.R.L.	CUSCO	23,946,215.94	RJ-0340-2014-ED	13/08/2014	25,280,692.28
18	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	JAST S.R.L. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES	AREQUIPA	25,113,894.42	RJ-0331-2014-ED	06/08/2014	28,952,632.48
19	IE MARIANO MELGAR	MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES	AREQUIPA	38,754,082.09	RJ-0353-2014-ED	21/08/2014	39,909,149.47
20	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	LIMA	1,869,793.32	RD-0023-2014-ED	15/09/2014	1,956,090.54
21	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO DEL CARMEN	CAJAMARCA	22,087,820.38	RD-0016-2014-ED	08/09/2014	21,893,461.93

02.- SUPERVISION

1	MIGUEL GRAU	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	APURIMAC	1,114,000.00	RJ-0085-2014-ED	04/03/2014	1,237,977.94
2	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C.	LIMA	940,069.51	RJ-0097-2014-ED	05/03/2014	968,271.56
3	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	900,451.81	RJ-0086-2014-ED	05/03/2014	1,026,577.37
4	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	900,451.81	RJ-0103-2014-ED	11/03/2014	1,026,577.37
5	IE 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES	CONSORCIO ICA	ICA	148,701.72	RJ-0113-2014-ED	14/03/2014	126,387.52
6	DOS DE MAYO	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	MADRE DE DIOS	465,817.44	RJ-0226-2014-ED	20/05/2014	523,513.36
7	IE SANTA ISABEL	CONSORCIO SUPERVISOR ALFA - JUAN ERNESTO ROMUALDO SANCHEZ MAYORA - REGNER BASURCO JIMENEZ	JUNIN	2,124,000.00	RJ-0036-2014-ED	28/01/2014	112,572.00
8	IE 5088 HEROES DEL PACIFICO	CONSORCIO ZUÑIGA - ESTELA PALOMINO RUIZ - ELMER ALFONSO SULCA BARRON	CALLAO	183,633.94	RJ-0037-2014-ED	28/01/2014	192,601.95
9	IE HIPOLITO UNANUE	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	310,000.00	RJ-0011-2014-ED	08/01/2014	354,827.41
10	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO MORE & ORUE	CAJAMARCA	1,138,022.52	RJ-0266-2014-ED	20/06/2014	1,138,022.52
11	IE TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	CONSORCIO FERNICE INGENIEROS	AMAZONAS	560,000.00	RJ-0290-2014-ED	03/07/2014	602,834.00
12	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	CUSCO	659,604.66	RJ-0337-2014-ED	11/08/2014	901,643.69
13	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO ING. JULIAN MENDOZA & ING. CESAR TAPIA JULCA	SAN MARTIN	222,645.19	RJ-0356-2014-ED	21/08/2014	222,645.19

**PERÚ**Ministerio
de Educación

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2014


Resumen :

PERIODO		OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01. -	PERIODO - 2006	44	48,465,534.33
02.-	PERIODO - 2007	64	52,142,241.97
03.-	PERIODO - 2008	25	40,765,868.98
04.-	PERIODO - 2009	29	61,225,516.19
05.-	PERIODO - 2010	67	243,203,569.79
06.-	PERIODO - 2011	42	589,848,336.93
07.-	PERIODO - 2012	36	390,716,522.88
08.-	PERIODO - 2013	29	289,457,225.51
09.-	PERIODO - 2014 (Enero - Setiembre)	10	153,609,053.40
Total Obras e Inversión Estimada		346	1,869,433,869.98

(*) No Estan consideradas las Obras Resueltas.

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

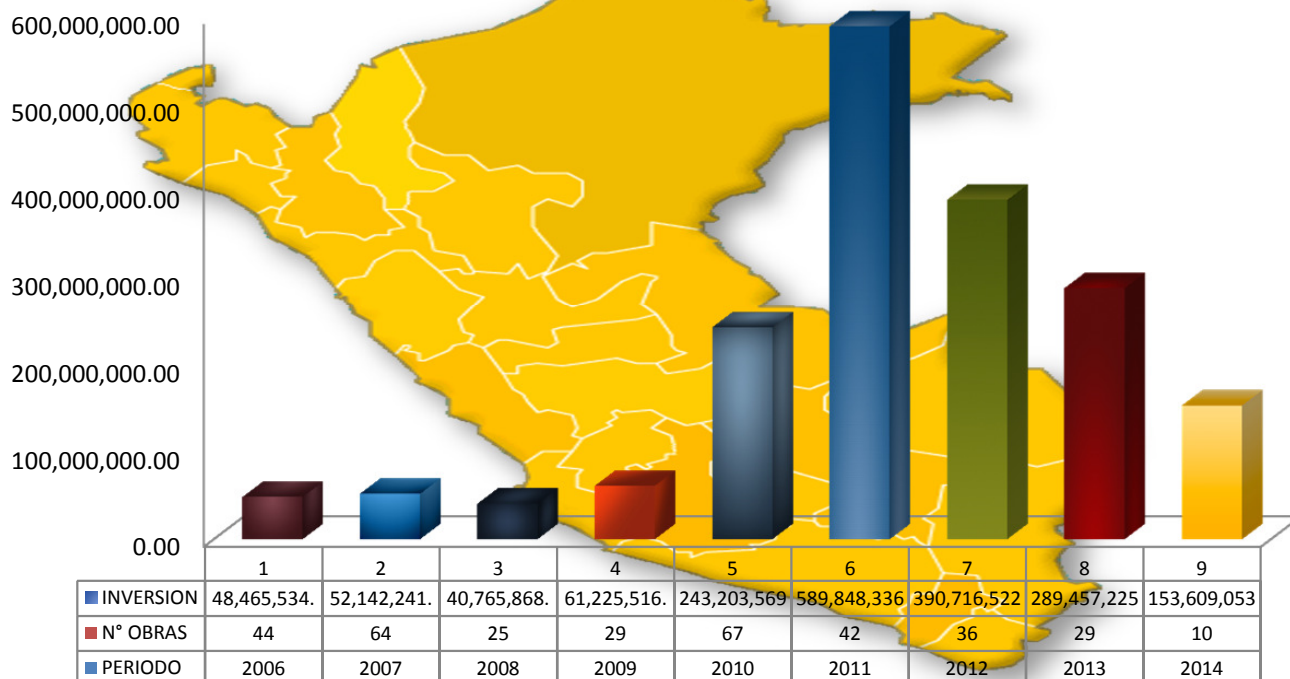

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboracion de Expediente Técnico, Ejecucion de Obra y Supervisión, asi como importes generados por Obras Adicionales etc.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"



OBRAS EMBLEMATICAS

Lima y Regiones al Mes de Setiembre 2014



RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	2	2	48
2	REGIONES	41	19	25	85
Totales :		85	21	27	133

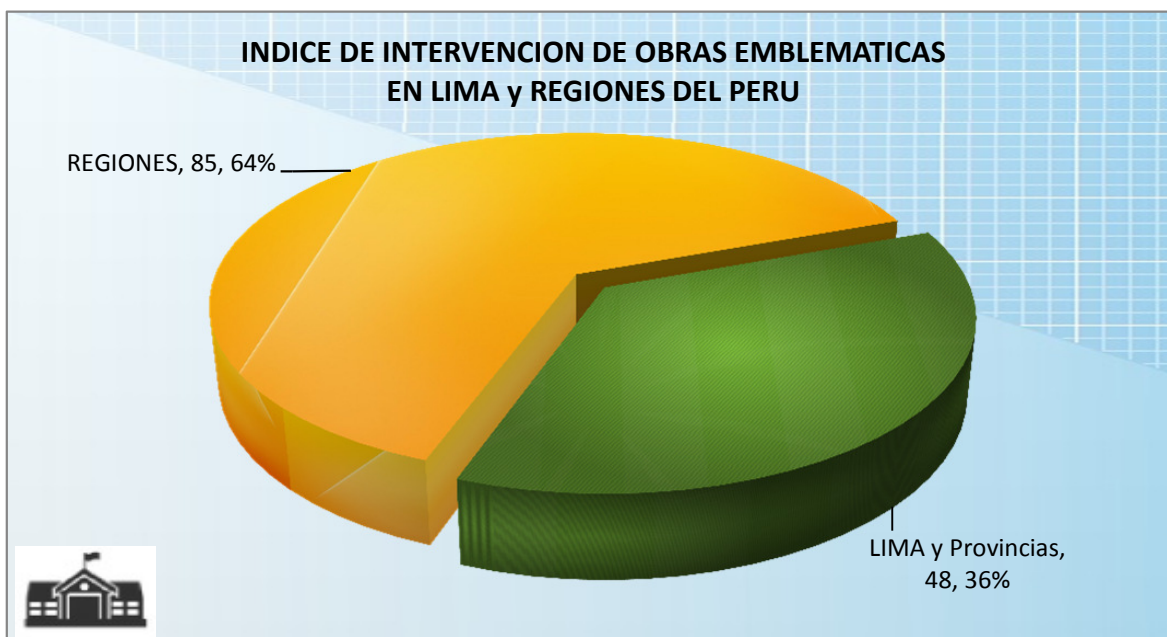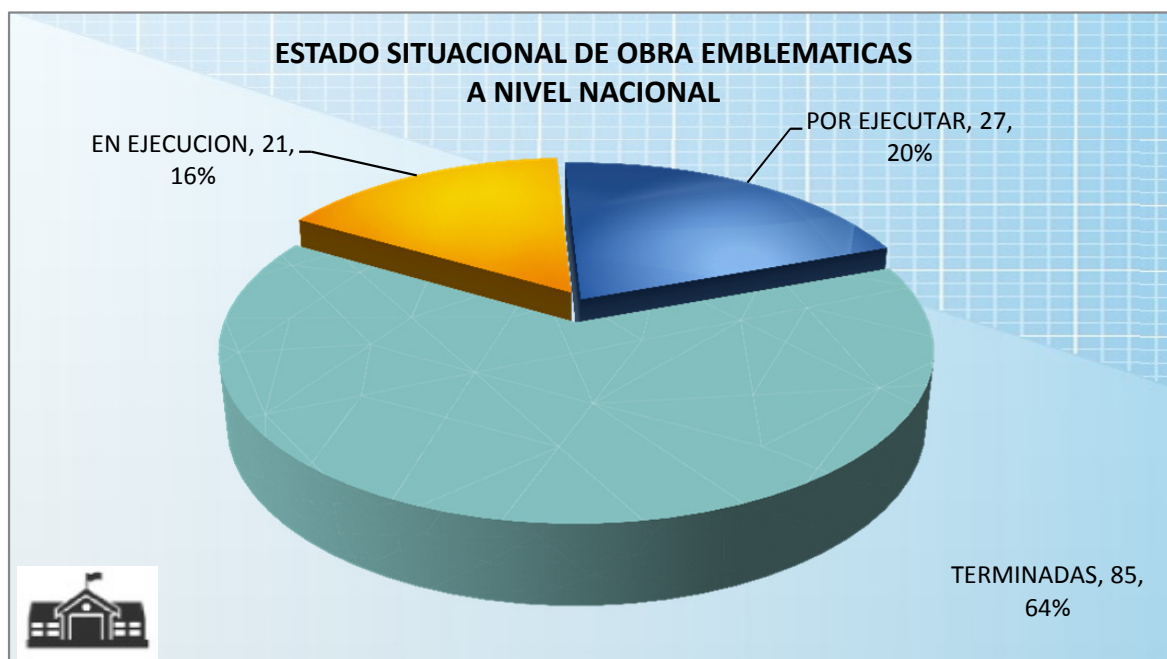

PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Setiembre 2014




RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	2	2	48
2	REGIONES	41	19	25	85
Totales :		85	21	27	133

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS EN LIMA PROVINCIAS

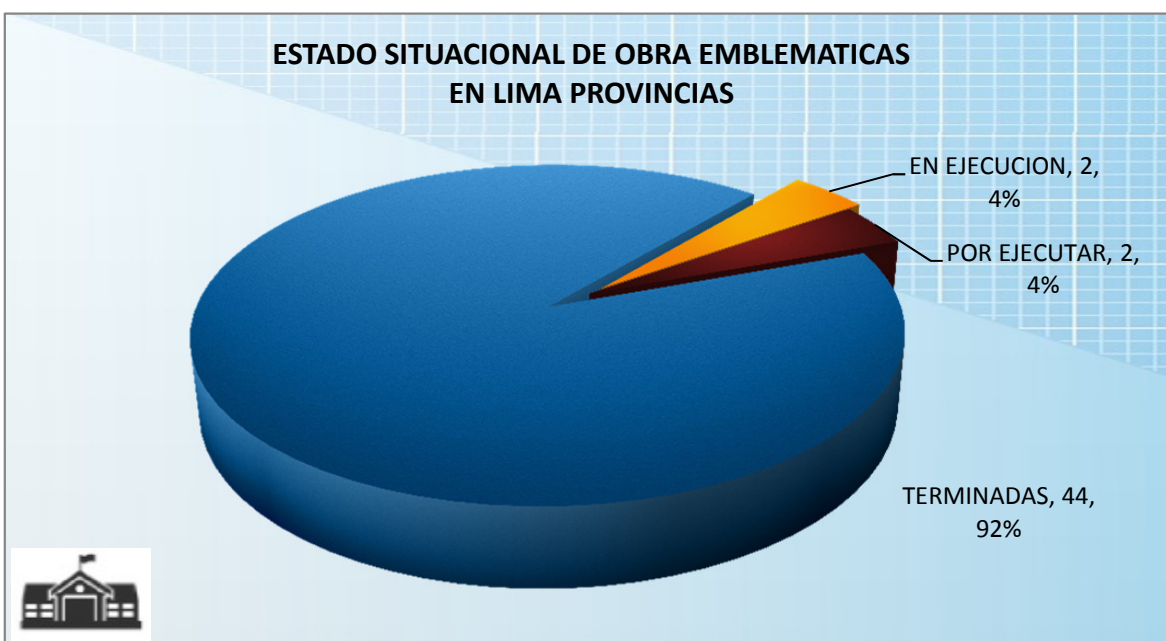

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS PROVINCIAS

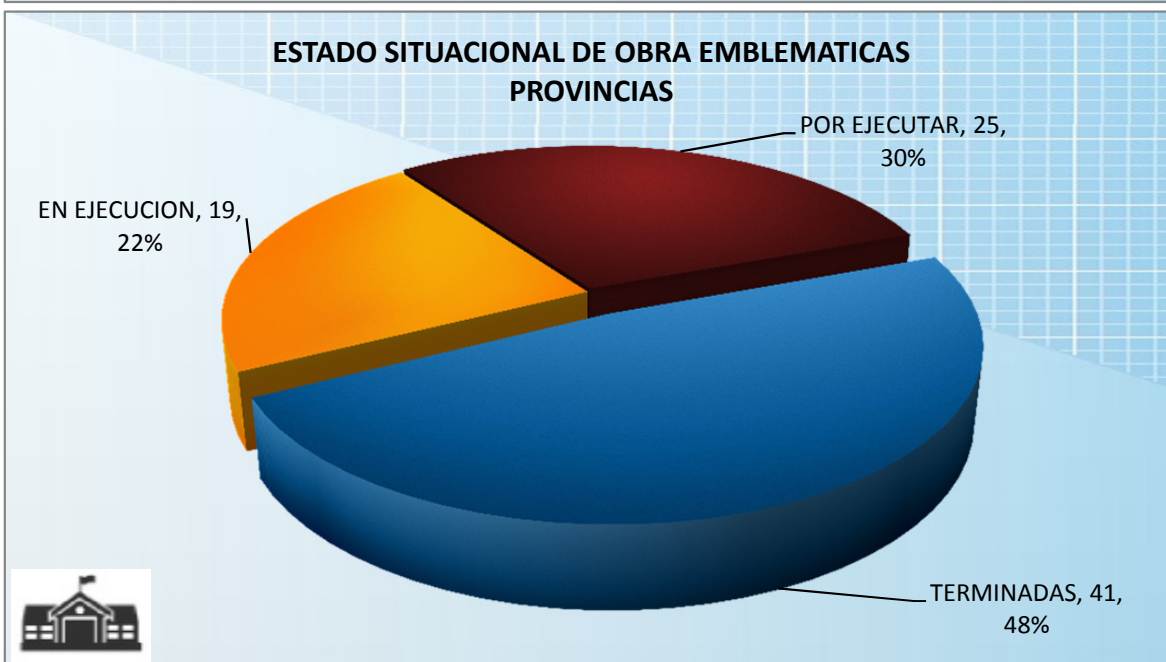**PERÚ**Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS
OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
								Contractual	Contrato			Recep.
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242,850.10	90	100.00%	100.00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397,704.05	35	100.00%	100.00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19,247,752.85	240	100.00%	100.00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10,984,825.12	240	100.00%	100.00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7,499,087.49	240	100.00%	100.00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14,698,756.22	270	100.00%	100.00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17,809,857.86	240	100.00%	100.00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST	24,850,130.00	300	100.00%	100.00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44,922,369.46	288	100.00%	100.00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56,895,969.19	420	100.00%	100.00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	7,546,407.26	240	100.00%	100.00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12,552,231.68	240	100.00%	100.00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22,606,616.90	210	100.00%	100.00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18,733,216.84	300	100.00%	100.00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553,458.16	60	100.00%	100.00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8,498,883.99	180	100.00%	100.00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54,450,760.00	360	100.00%	100.00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7,725,531.18	240	100.00%	100.00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16,352,313.60	300	100.00%	100.00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28,760,197.28	360	100.00%	100.00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27,303,268.20	300	100.00%	100.00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20,567,329.08	300	100.00%	100.00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39,709,126.15	300	100.00%	100.00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10,819,997.45	270	100.00%	100.00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODR	SAN NICOLAS	21,830,737.21	270	100.00%	100.00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5,192,205.06	180	100.00%	100.00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22,087,820.38	330	100.00%	100.00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5,803,114.30	180	100.00%	100.00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9,966,975.86	240	100.00%	100.00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15,001,252.09	150	100.00%	100.00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15,716,683.73	240	100.00%	100.00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2,762,375.59	120	100.00%	100.00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12,926,017.97	180	100.00%	100.00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109,160.87	45	100.00%	100.00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23,946,215.94	270	100.00%	100.00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193,598.06	45	100.00%	100.00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS N	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25,113,894.42	360	100.00%	100.00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2,546,695.38	120	100.00%	100.00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77,103.64	30	100.00%	100.00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38,754,082.09	420	100.00%	100.00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196,003.67	45	100.00%	100.00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6,950,503.23	180	100.00%	100.00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14,730,418.50	240	100.00%	100.00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10,598,133.02	240	100.00%	100.00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13,274,564.17	270	100.00%	100.00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11,568,701.69	240	100.00%	100.00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10,386,423.92	210	100.00%	100.00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13,699,468.94	240	100.00%	100.00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7,669,799.25	180	100.00%	100.00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11,540,886.61	270	100.00%	100.00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6,450,213.48	180	100.00%	100.00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16,102,546.53	270	100.00%	100.00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18,976,461.40	270	100.00%	100.00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13,767,910.99	240	100.00%	100.00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12,337,712.85	180	100.00%	100.00%	27/09/2011
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5,955,773.30	45	100.00%	100.00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2,727,463.60	75	100.00%	100.00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3,775,993.03	90	100.00%	100.00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NU	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3,723,072.73	90	100.00%	100.00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8,121,877.69	120	100.00%	100.00%	21/01/2011

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14,489,268.00	300	100.00%	100.00%	20/02/2012
62	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11,224,843.00	240	100.00%	100.00%	21/09/2011
63	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29,943,516.23	270	100.00%	100.00%	13/02/2013
64	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14,955,474.15	240	100.00%	100.00%	25/08/2011
65	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920,031.48	30	100.00%	100.00%	28/10/2010
66	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2,677,215.75	150	100.00%	100.00%	03/10/2011
67	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26,519,751.67	300	100.00%	100.00%	01/04/2013
68	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28,750.88	20	100.00%	100.00%	24/11/2011
69	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3,569,179.06	90	100.00%	100.00%	17/05/2011
70	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19,932,413.36	300	100.00%	100.00%	23/04/2014
71	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33,382,049.92	360	100.00%	100.00%	02/04/2014
72	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6,785,340.79	120	100.00%	100.00%	29/12/2011
73	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8,206,571.31	270	100.00%	100.00%	10/10/2012
74	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26,740,032.38	360	100.00%	100.00%	04/09/2013
75	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17,676,984.47	270	100.00%	100.00%	07/01/2013
76	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979,595.01	90	100.00%	100.00%	09/01/2012
77	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5,695,943.21	150	100.00%	100.00%	04/05/2012
78	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6,094,843.57	150	100.00%	100.00%	09/08/2012
79	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DE	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4,013,808.33	90	100.00%	100.00%	08/11/2012
80	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1,969,105.31	120	100.00%	100.00%	21/03/2012
81	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1,079,857.24	45	100.00%	100.00%	11/04/2012
82	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4,884,836.81	240	100.00%	100.00%	11/02/2014
83	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3,757,857.00	120	100.00%	100.00%	06/11/2012
84	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURICO	20,829,352.78	330	100.00%	100.00%	11/08/2014
85	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22,117,574.83	330	100.00%	100.00%	-

OBRAS EN EJECUCION

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	AMC	39	2014	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116,708.99	30	68.48%	67.28%	-
2	EXON	154	2010	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29,432,256.47	240	100.00%	98.60%	-
3	LP	1	2013	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36,049,600.51	420	80.32%	45.58%	-
4	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26,641,088.84	360	100.00%	91.66%	-
5	LP	25	2013	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4,768,794.46	210	72.05%	47.36%	-
6	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19,695,000.00	300	59.76%	59.87%	-
7	LP	29	2013	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6,577,174.33	240	36.34%	8.45%	-
8	LP	33	2013	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29,472,235.45	360	3.34%	3.76%	-
9	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22,630,000.00	360	19.68%	27.59%	-
10	LP	35	2013	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE C	SANTIAGO DE CHU	27,806,000.00	360	6.73%	13.33%	-
11	LP	36	2013	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18,429,104.54	360	16.02%	11.45%	-
12	PESP	49	2012	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24,270,355.38	330	100.00%	99.49%	-
13	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32,704,918.75	360	100.00%	89.25%	-
14	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32,532,033.80	360	99.03%	99.79%	(P)
15	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36,254,919.00	360	100.00%	93.78%	-
16	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29,796,899.66	360	98.06%	90.35%	-
17	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25,890,382.85	360	100.00%	91.48%	-
18	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31,029,000.00	420	100.00%	69.58%	-
19	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20,665,659.98	360	99.50%	64.36%	-
20	PESP	67	2012	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13,010,208.00	300	66.17%	71.60%	-
21	PESP	68	2012	IE AURELIO CARDENAS PACHAS	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	13,694,839.87	300	100.00%	85.53%	-

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la USOM.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS POR INICIAR - ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Referencial	PLAZO Ejecución	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	-	-	-	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUJA	JAUJA	8,720,999.29	240	-	-	POR INICIAR
2	-	-	-	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22,666,666.66	360	-	-	POR INICIAR
3	-	-	-	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19,607,488.94	360	-	-	POR INICIAR
4	-	-	-	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	24,307,392.07	360	-	-	-
5	-	-	-	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	15,424,464.16	300	-	-	-
6	-	-	-	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	18,139,135.40	300	-	-	-
7	-	-	-	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	22,101,902.53	300	-	-	-
8	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	21,133,335.64	360	-	-	-
9	-	-	-	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	14,280,245.66	240	-	-	-
10	-	-	-	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	12,537,440.55	300	-	-	-
11	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	21,714,288.11	360	-	-	-
12	-	-	-	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	34,528,233.91	390	-	-	-
13	-	-	-	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	18,813,900.40	360	-	-	-
14	-	-	-	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	21,664,782.30	300	-	-	-
15	-	-	-	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	38,049,681.12	380	-	-	-
16	-	-	-	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	38,540,023.79	380	-	-	-
17	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	25,120,109.35	360	-	-	-
18	-	-	-	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	23,808,077.05	360	-	-	-
19	-	-	-	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	12,605,133.99	300	-	-	-
20	-	-	-	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI	16,189,378.22	330	-	-	-
21	-	-	-	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	28,615,249.50	360	-	-	-
22	-	-	-	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	180,031.44	45	-	-	-
23	-	-	-	LEONCIO PRADO - II ETAPA	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5,871,624.66	240	-	-	-
24	-	-	-	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	456,398.79	90	-	-	-
25	-	-	-	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	16,456,566.22	270	-	-	-
26	-	-	-	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	212,776.37	60	-	-	-
27	-	-	-	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1,613,854.44	120	-	-	-

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES



1. MATERIALES

1.1 EL CEMENTO

El cemento es un material que combinado con la arena, la piedra y el agua, crea una mezcla capaz de endurecerse hasta adquirir la consistencia de una piedra.

El cemento se vende en bolsas de un pie cúbico que pesan 42.5 kg (ver figura 19). Existen diferentes marcas y variedades, siendo los más usados los tipos I e IP; todas las características se encuentran impresas en sus respectivas bolsas.

Entre los más conocidos están:

Cemento Tipo I

De uso común y corriente en construcciones de concreto y trabajos de albañilería donde no se requieren propiedades especiales.



Cemento Puzolánico IP

Cemento al que se ha añadido puzolana hasta en un 15%, material que le da un color rojizo y que se obtiene de arcillas calcinadas, de cenizas volcánicas o de ladrillos pulverizados. La ventaja de reemplazar parte del cemento por este material, es que permite retener agua, por lo que se obtiene una mayor capacidad de **adherencia***.

Esto retrasa, además, el tiempo de fraguado y es conveniente cuando se necesita de más tiempo, por ejemplo, para frotachar un piso de concreto.

Cemento Tipo II

De moderada resistencia al ataque de los sulfatos, se recomienda usar en ambientes agresivos. Los sulfatos son sustancias que aparecen en las aguas subterráneas o en los suelos, que cuando entran en contacto con el concreto, lo deterioran.

Cemento Tipo III

De desarrollo rápido de resistencia. Se recomienda usar cuando se quiera adelantar el desencofrado. Al fraguar, produce alto calor, por lo que es aplicable en climas fríos.

Cemento Tipo IV

Al fraguar produce bajo calor, recomendable para vaciados de grandes masas de concreto. Por ejemplo, en presas de concreto.

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES




Cemento Tipo V

De muy alta resistencia al ataque de sales, recomendable cuando el elemento de concreto esté en contacto con agua o ambientes salinos.

Los cementos tipo III y IV no son fabricados en nuestro país.

Consideraciones

- No es conveniente comprar el cemento con más de dos semanas de anticipación.
- Durante su almacenamiento, debe estar protegido para que mantenga sus propiedades. Por eso, hay que cubrirlo para que no esté expuesto a la humedad y aislarlo del suelo colocándolo sobre una tarima de madera (ver figura 20).

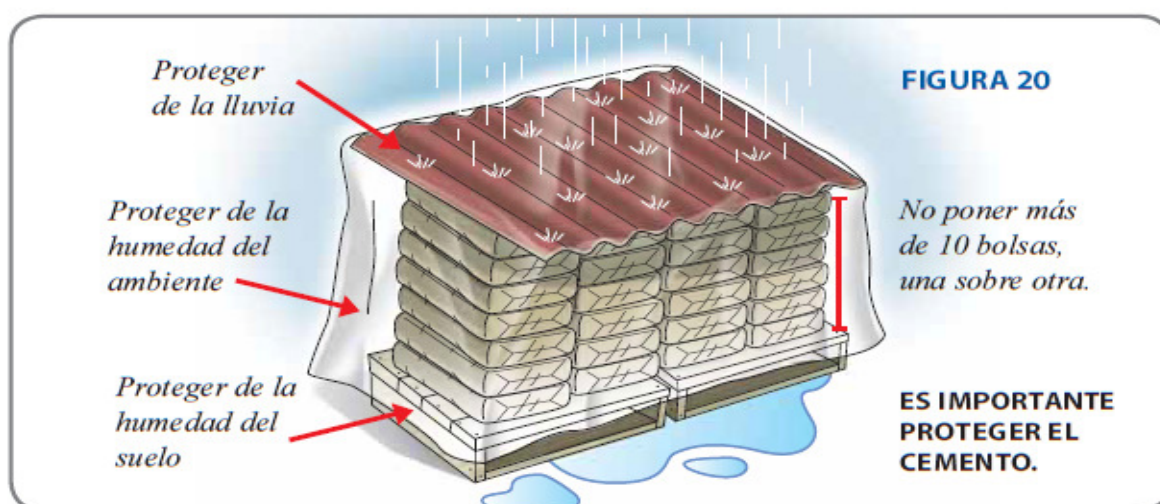

- La altura máxima que se debe alcanzar al apilar el cemento es de 10 bolsas, para evitar que las bolsas inferiores se compriman y endurezcan.
- El tiempo máximo de almacenamiento recomendable en la obra es de un mes. Antes de usarse, se debe verificar que no se hayan formado grumos. Si los hubiera, el cemento se podrá usar, siempre y cuando puedan deshacerse fácilmente comprimiéndolos con la yema de los dedos.
- El cemento, al reaccionar con el agua, hace que el concreto comience a endurecerse y alcance la resistencia especificada en los planos de estructuras a los 28 días de mezclado; posteriormente, la resistencia continuará aumentando pero en menor medida. Para ello, el cemento debe mantenerse húmedo después del vaciado, mojándolo varias veces al día durante la primera semana. A este proceso se le llama **curado***.

Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS

¿QUÉ ES ALBAÑILERÍA CONFINADA ?

La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc.

En este tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo en conjunto con las vigas. (Ver figura 1).

Figura 1



Albañilería
confinada

Desde hace muchos años atrás, las viviendas de este tipo son las construcciones más populares en las zonas urbanas de nuestro país y en la actualidad esta tendencia continúa.

Por otro lado, si tú estás a cargo de una obra de este tipo, debes tener en cuenta tres factores:

- a. El diseño estructural.
- b. El control de los procesos constructivos.
- c. El control de la calidad de los materiales.

Es importante que consideres estos tres factores, ya que para que una vivienda pueda soportar exitosamente los efectos devastadores de un terremoto, debe tener una estructura sólida, fuerte y resistente.

Un sismo causará daños a una vivienda, si ésta carece de diseño estructural o si fue mal construida . La vivienda puede incluso derrumbarse, causando pérdidas materiales importantes, heridas graves a sus ocupantes y hasta la muerte de alguno de ellos.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

"Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa."



PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRESO PARA TODOS

Trabajamos con responsabilidad y transparencia por una educación de calidad



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO, CONTAMOS CONTIGO!



Oficina General de Ética Pública y Transparencia



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Unidad de Ejecución de Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED
