



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"



INFORME MENSUAL

Equipo de Ejecución de Obras

Noviembre 2014

OBRA POR EJECUTAR
I.E. DANIEL HERNANDEZ
Huancavelica - Tayacaja - Pampas
Valor Referencial : S/. 12,537,440.55
Plazo de Ejecución : 300dc



Unidad Gerencial de Estudios y Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Contenido:



- 01.- Obras en Ejecución a Noviembre 2014**
- 02.- Procesos de Convocatoria**
- 03.- Obras Terminadas de Ene. - Nov. 2014**
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú**
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.**
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión**
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2014 (Noviembre)**
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias**
- 09.- Términos y Definiciones.**
- 10.- Descripción Visual de Actividades y/o de elementos empleados en diversas Obras Civiles**

Equipo de Ejecución de Obras - PRONIED
Anexo 25513 - Ans. Boris Alvarez Rodriguez



PERÚ

Ministerio
de Educación





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	21
2	PROGRAMA REGULAR	3
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	4
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		28

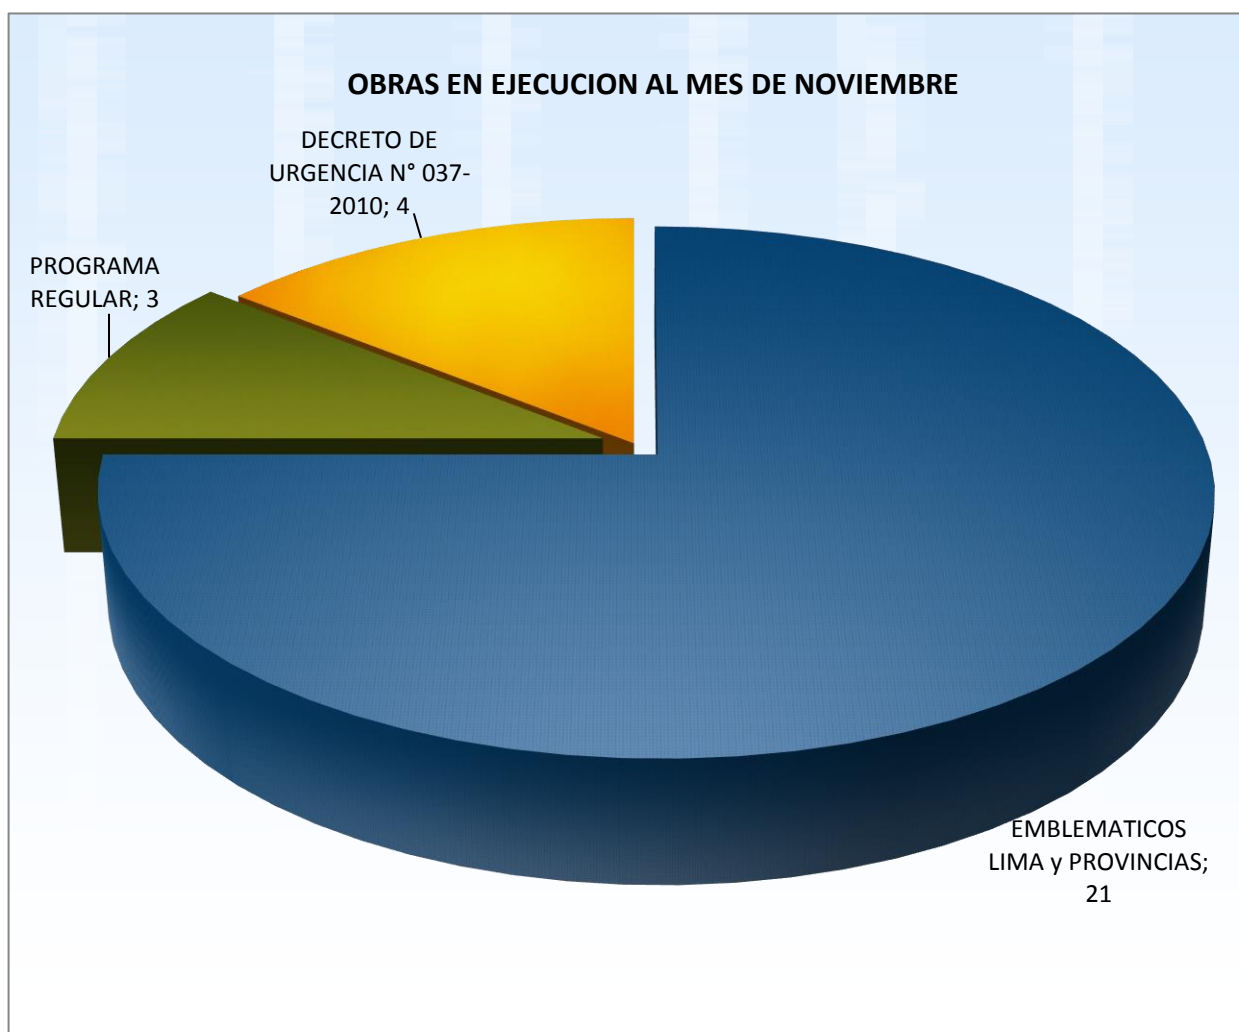

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EN EJECUCION

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PAGOS Tramitados (*)	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito				Inicio	Fin	

EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS

1	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	8.720.999,29	5.209.182,92	240	25/09/2014	22/05/2015	8,04%
2	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.676.844,92	28.712.752,22	399	25/01/2011	27/02/2012	98,60%
3	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.111.744,08	26.006.883,49	436	19/09/2013	28/11/2014	51,58%
4	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	4.147.696,03	210	08/04/2014	03/11/2014	61,01%
5	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	16.367.867,50	300	01/04/2014	25/01/2015	77,65%
6	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.630.395,58	1.973.893,64	240	10/05/2014	04/01/2015	15,20%
7	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	19.428.316,78	360	04/07/2014	28/06/2015	8,70%
8	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	13.497.860,52	369	06/05/2014	09/05/2015	39,19%
9	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	27.806.000,00	12.776.046,57	360	14/06/2014	08/06/2015	21,29%
10	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18.429.104,54	6.767.449,43	360	06/06/2014	31/05/2015	24,25%
11	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	659.728,37	360	10/10/2014	04/10/2015	3,53%
12	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	4.163.603,94	360	15/10/2014	09/10/2015	1,50%
13	LEONCIO PRADO - II ETAPA	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	0,00	240	01/11/2014	28/06/2015	-
14	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	25.539.879,19	424	30/01/2013	29/03/2014	99,54%
15	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.677.940,09	32.737.772,83	620	14/12/2012	25/08/2014	95,61%
16	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.758.286,09	32.998.511,77	726	14/12/2012	09/12/2014	99,37%
17	IE MATEO PUMACAHUA (P)	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	37.843.592,07	36.428.599,52	676	04/01/2013	10/11/2014	93,89%
18	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	33.273.903,71	31.893.438,52	772	22/01/2013	04/03/2015	90,98%
19	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	32.951.466,31	29.845.299,32	595	19/01/2013	05/09/2014	72,33%
20	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	22.474.984,17	20.960.596,28	603	26/02/2013	21/10/2014	89,01%
21	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	14.485.990,52	10.812.542,74	612	15/02/2013	19/10/2014	71,69%

PROGRAMA REGULAR

1	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv- 10Kv (P)	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296.149,36	0,00	75	14/08/2014	27/10/2014	-
2	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2.850.259,95	1.102.384,63	180	07/06/2014	03/12/2014	23,34%
3	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1.786.247,42	285.138,04	150	04/10/2014	02/03/2015	11,88%

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5.896.843,66	1.179.368,73	180	04/11/2014	02/05/2015	-
2	IE 9 DE DICIEMBRE	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	3.518.333,47	3.346.409,82	340	23/12/2013	27/11/2014	96,06%
3	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5.586.133,51	3.524.010,30	221	14/05/2014	20/12/2014	42,11%
4	IE 22424	ICA	PALPA	RIO GRANDE	2.362.645,23	2.292.966,37	233	26/03/2014	13/11/2014	91,99%

- Observación : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la USOM. (*) La información de pagos tramitados, corresponden a datos del control de la Unidad de Obras. Los plazos de ejecución incluye las ampliaciones de plazo aprobadas por la Entidad. Asimismo, el monto contractual considera los importes por obras adicionales y/o deductivos.
 - (P) = Obra Paralizada.

**PERÚ**Ministerio de
Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	13
2	POR CONVOCAR	15
TOTAL DE OBRAS EN PROCESO		28

PROCESOS DE CONVOCATORIA DE OBRAS

POR CONVOCAR; 15



EN PROCESO DE
CONVOCATORIA; 13

NOTA:
EL GRAFICO NO CONSIDERA LAS
OBRAS POR INICIAR, EL REPORTE
SI LAS DETALLA.

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"**PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA
PROCESOS POR CONVOCAR Y EN CONVOCATORIA**

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Procesos en Convocatoria y Obras por Iniciar:

	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	019828	0186-2014-ED	24/04/2014	1.104.233,95	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 20/10/2014 a A.S.A. Asociados S.A.
	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	022192	0237-2014-ED	28/05/2014	881.530,86	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 03/10/2014 a Constructora y Consultora g & F Hnos. S.A.C.
	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 - JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	016447	0301-2014-ED	14/07/2014	3.137.673,94	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 24/10/2014 a Consorcio Encinas Franco (Villegas Kanashiro Amparo Gabriela - Constructora Uranio S.A.C.)
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	019818	0099-2014-ED	06/03/2014	19.498.304,07	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 20/10/2014 a Consorcio Unión (Comsa S.A. Sucursal Perú - Obracon S.A.C.)
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	019814	0088-2014-ED	05/03/2014	19.020.002,08	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 20/10/2014 a Consorcio Cajamarca (Construcciones Ruesma S.A. - Corporación Constructora Tercer Milenio S.A.C.)
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	021468	0185-2014-ED	24/04/2014	13.398.369,29	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 29/09/2014 a Consorcio Amazonia Math-TR (Math Construcción y Consultoría SAC - TR Construya, S.L.U. Sucursal en el Perú)
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	020265	0132-2014-ED	25/03/2014	20.590.000,00	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 22/09/2014 a Consorcio Mesones (Construkselva S.R.L. - Conassa S.R.LTDA.)
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	019975	0151-2014-ED	03/04/2014	11.344.620,60	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 24/09/2014 a VVO Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	020264	0131-2014-ED	25/03/2014	16.507.594,95	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 24/09/2014 a Consorcio Junin (Constructora y Consultora Chan Chan S.A.C. - Construcciones Reusma SA)
	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	022193	0238-2014-ED	28/05/2014	12.876.435,34	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 23/10/2014 a Contratas e Ingeniería S.A., Sucursal del Perú
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	022109	0251-2014-ED	05/06/2014	12.852.221,10	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 24/10/2014 a Consorcio Huancavelica (Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del Perú - Vímec S.A. Sucursal del Perú)
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAVELICA	019821	0003-2014-UGEO	23/09/2014	2.660.327,08	Buena Pro otorgada el 05/11/2014 a Constructora JHR S.R. Ltda. Monto Adjudicado S/. 2,394,294.38
2	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	023547	0284-2014-ED	01/07/2014	6.493.337,95	Buena Pro otorgada el 12/11/2014 a Consorcio Pachacamac (Chung & Tong Ingenieros S.A.C. - A.S.A. Asociados S.A.) Monto Adjudicado S/. 5.844,004.16
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	019841	0300-2014-ED	14/07/2014	18.139.135,40	Buena Pro otorgada el 21/11/2014 a Consorcio Arequipa (Construcciones Reusma S.A. - Construcciones y Consultoría Chan Chan SAC - J & F Contratistas y Constructores del Perú S.A.C.) Monto Adjudicado S/. 16,325,221.86
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	019978	0153-2014-ED	03/04/2014	22.101.902,53	En Proceso de Convocatoria
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	019817	0002-2014-UGEO	23/09/2014	21.714.288,11	Buena pro otorgada el 17/11/2014 a Consorcio Amazonia MATH - TR (TR Construya, S.L.U. Sucursal en el Perú - MATH Construcciones y Consultoría SAC) Monto Adjudicado S/. 18'348,999.00
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	016814	0285-2014-ED	02/07/2014	34.528.233,91	Buena Pro otorgada el 26/11/2014 a Consorcio Constructor Amazonico (Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. - Alianza Constructora de Obras S.A.C.) Monto Adjudicado S/. 29,998,129.62

**PERÚ**Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"**PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA
PROCESOS POR CONVOCAR Y EN CONVOCATORIA**

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE GRANDA	LIMA	019822	0314-2014-ED	24/07/2014	38.049.681,12	Buena pro otorgada el 31/10/2014 a Construcciones Lujan S.A. Sucursal Perú Monto Adjudicado S/. 34,244,713.01
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	019789	0357-2014-ED	26/08/2014	38.540.023,79	Buena Pro otorgada el 26/11/2014 a Consorcio Triunfo (Rover Alcisa Perú - Empresa Constructora A.R.C. S.R. Ltda.) Monto Adjudicado S/. 34,686,021.42
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	021498	0194-2014-ED	29/04/2014	23.808.077,05	Buena pro otorgada el 24/11/2014 a Consorcio Constructor Amazonico (Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. - Alianza Constructora de Obras S.A.C.) Monto Adjudicado S/. 21,141,572.42
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	021465	0215-2014-ED	14/05/2014	16.189.378,22	Buena pro otorgada el 28/10/2014 a Consorcio Juanjui (Proconces E.I.R.L. - Huracan Inversiones E.I.R.L. - Contratista Atlas E.I.R.L. - Comeco S.R.LTDA.) Monto Adjudicado S/. 13,718,000.00
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	022190	0249-2014-ED	04/06/2014	28.615.249,50	En Proceso de Convocatoria
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	022191	0236-2014-ED	27/05/2014	16.456.566,22	Buena Pro otorgada el 10/11/2014 a Consorcio TCT Amazonia (Terrak S.A. - Torres Camara y Cia de Obras S.A. Sucursal del Perú) Monto Adjudicado S/. 13,870,000.00
13	EMBLEMATICAS - PROV.	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	019846	0004-2014-UGEO	23/09/2014	456.398,79	En Proceso de Convocatoria

02.- Procesos por Convocar :

1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	019977	0152-2014-ED	03/04/2014	12.537.440,55	Proceso Declarado Nulo
2	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	024904	0313-2014-ED	24/07/2014	3.453.173,29	Proceso Declarado Nulo
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	029009	0008-2014-UGEO	15/10/2014	34.495.555,12	Proceso por Convocar
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	028057	0006-2014-UGEO	01/10/2014	20.587.624,82	Proceso por Convocar
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	027857	0005-2014-UGEO	29/09/2014	25.120.109,35	Proceso por Convocar
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	I.E. JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	031119	0012-2014-UGEO	10/11/2014	32.835.984,47	Proceso por Convocar
7	EMBLEMATICAS - LIMA	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	031058	0013-2014-UGEO	11/11/2014	1.305.954,62	Proceso por Convocar
8	PROGRAMA REGULAR	IE 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION - MEDIA TENSION	LIMA	019825	0038-2014-ED	28/01/2014	200.091,04	Proceso por Convocar
9	PROGRAMA REGULAR	IE 22468 MARIA PARADO DE BELLIDO - SISTEMA TENSION 10-22.9 Kv	ICA	026471	0179-2014-ED	22/04/2014	228.388,05	Proceso por Convocar
10	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 Kv	CAJAMARCA	019824	0009-2014-UGEO	24/10/2014	201.709,62	Declarado Desierto - No se presentaron postores
11	PROGRAMA REGULAR	IE JOHN F. KENNEDY - SISTEMA MEDIA TENSION	ICA	022996	0265-2014-ED	19/06/2014	239.551,46	Declarado Desierto - No se presentaron postores
12	PROGRAMA REGULAR	IE 20191 ALFONSO UGARTE - MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	LIMA	019819	0269-2014-ED	24/06/2014	242.998,49	Proceso por Convocar
13	EMBLEMATICAS - PROV.	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 Kv	UCAYALI	024788	0295-2014-ED	09/07/2014	212.776,37	Declarado Desierto - No se presentaron postores
14	EMBLEMATICAS - PROV.	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	027759	0001-2014-UGEO	15/09/2014	1.613.854,44	Proceso por Convocar
15	EMBLEMATICAS - PROV.	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	029417	0007-2014-UGEO	15/10/2014	8.876.818,95	Proceso por Convocar
28								

**PERÚ**Ministerio de
Educación


**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Noviembre 2014

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	9
2	PROGRAMA REGULAR	1
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	3
TOTAL OBRAS TERMINADAS		13

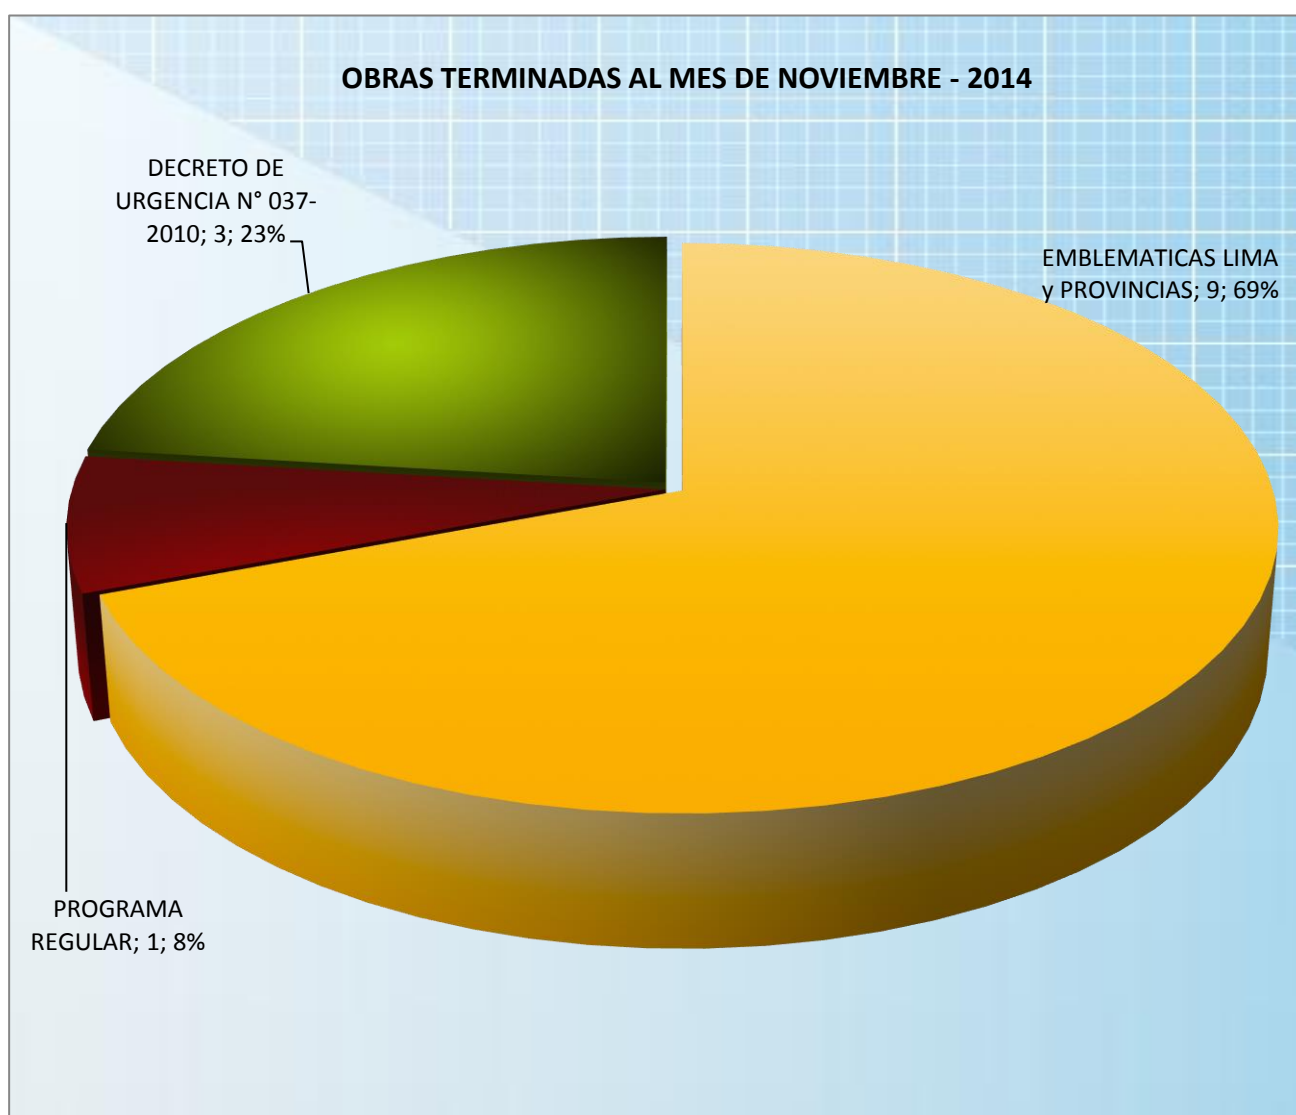

Equipo de Ejecución de Obras - PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DE ENERO A NOVIEMBRE 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	1.616.926,40	21/04/2014
2	D. URGENCIA N°037-2010	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	5.050.746,00	23/04/2014
3	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	3.441.687,51	-
4	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	26/05/2014
5	EMBLEMATICAS - PROV.	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	-
6	EMBLEMATICAS - PROV.	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	30/04/2014
7	EMBLEMATICAS - PROV.	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	09/04/2014
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	-
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	20.829.352,78	11/08/2014
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	-
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	26/06/2014
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	-
13	PROGRAMA REGULAR	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	1.869.793,32	13/06/2014

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS - OBSERVADOS

1	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	2.247.766,20	(1)
2	EMBLEMATICAS - PROV.	GUE SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	39.662.413,51	(2)
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	23.682.900,79	(3)
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE AURELIO CARDENAS PACHAS	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	13.694.839,87	(4)

(*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) ONTRATO DE OBRA DECLARADO NULO MEDIANTE RM-0053-2014-ED, : POR HABERSE CONFIGURADO EL SUPUESTO LEGAL DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS FALSOS, POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA MARIA - VIRGO SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL - C&S GUTIERREZ S.R.L.

(2) EN PROCESO DE RESOLUCION DE OBRA, CON MEMORANDUM N°00524-2014-MINEDU-VMGI-OINFE, LA UNIDAD DE OBRAS, JUSTIFICA LA DECLARACION DE RESOLUCION DEL CONTRATO N°0201-2010-ME-SG-OGA-UA-APP, SOLICITANDO AL JEFE DE LA OGA, DAR TRAMITE AL EXPEDIENTE Y DECLARAR LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. (EXP. N° 20386-2014).

(3) CONTRATO RESUELTO, CON CARTA NOTARIAL N°007-2014-CR-RL-FRS DE FECHA 31-03-2014, EL CONTRATISTA COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. - LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRA SE PROGRAMO PARA EL 03-04-2014.

(4) CONTRATO RESUELTO : CON MEMORANDUM N°0929-2014-UGEO, SE INFORMA A LA OGA SOBRE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE DECLARE LA RESOLUCION AL NO HABER CUMPLIDO EL CONTRATISTA CON SUS OBLIGACIONES CONTRATUALES EXP. 7593-2014.

**PERÚ**Ministerio de
Educación



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Se vienen ejecutando a la fecha

28

Obras de Infraestructura Educativa

Equipo de Ejecución de Obras



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE NOVIEMBRE 2014



Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	90,98%
2	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	-
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	95,61%
4	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	98,60%
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	3,53%
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	I E TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	1,50%
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	72,33%
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	39,19%
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MATEO PUMACAHUA (P)	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	93,89%
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	77,65%
11	EMBLEMATICAS - PROV.	LEONCIO PRADO - II ETAPA	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	-
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	71,69%
13	D. URGENCIA N°037-2010	IE 9 DE DICIEMBRE	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	96,06%
14	D. URGENCIA N°037-2010	IE 22424	ICA	PALPA	RIO GRANDE	91,99%
15	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	11,88%
16	EMBLEMATICAS - PROV.	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUJA	JAUJA	8,04%
17	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	61,01%
18	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUC	SANTIAGO DE CHUC	21,29%
19	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	99,37%
20	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	15,20%
21	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv (P)	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	-
22	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	42,11%
23	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	23,34%
24	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	24,25%
25	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	99,54%
26	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	51,58%
27	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	89,01%
28	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	8,70%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la USOM.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	15		
		➡	15	50%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	13	50%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			28	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

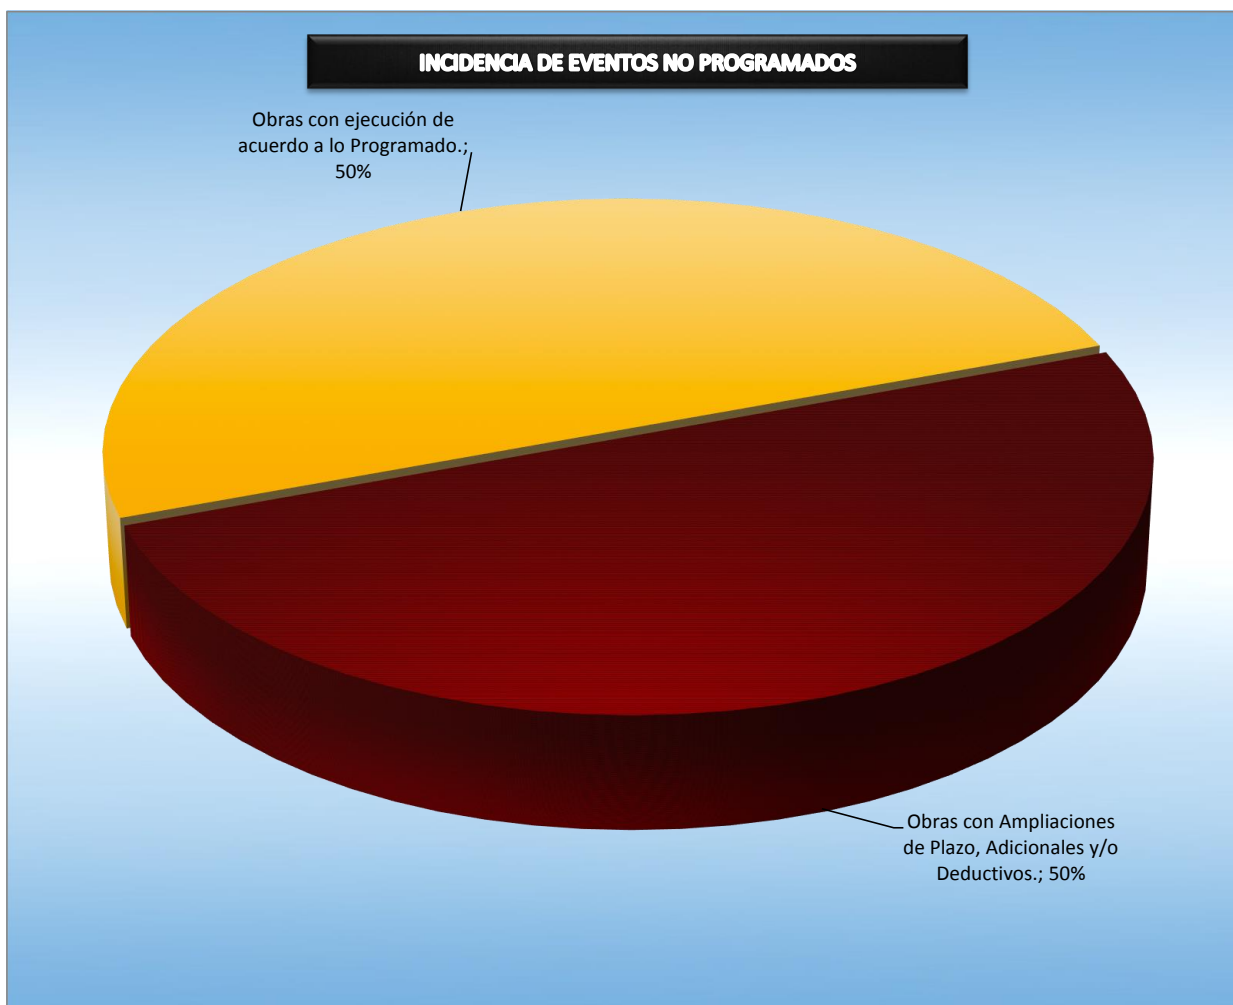

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra , pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construcción, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Noviembre 2014)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - NOV	22	17	39 (*)
		22	17	39

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.

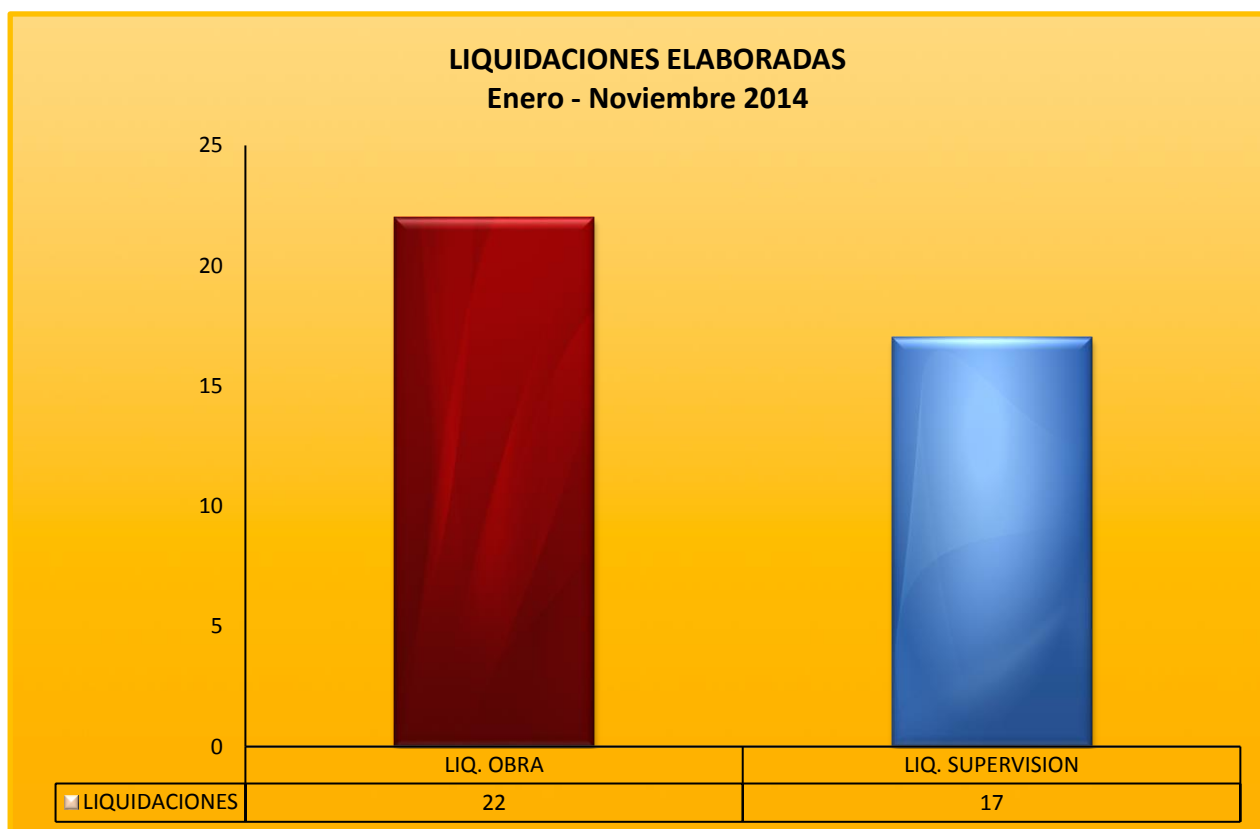

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - NOVIEMBRE 2014)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	IE 7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA	TORRES HARO CARLOS ALBERTO	LIMA	289.436,22	RJ-0003-2014-ED	03/01/2014	301.368,72
2	IE 6073 JORGE BASADRE	ONO ASOCIADOS S.A.C.	LIMA	294.568,15	RJ-0005-2014-ED	03/01/2014	304.365,83
3	IE 38083 LOS LICENCIADOS - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO	AYACUCHO	115.200,66	RJ-0004-2014-ED	03/01/2014	115.200,66
4	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	FAMOGA E.I.R.L	APURIMAC	242.850,10	RJ-0007-2014-ED	06/01/2014	238.767,68
5	IE 649 SANTA ROSA DE LIMA	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	LIMA	244.003,94	RJ-0030-2014-ED	24/01/2014	253.534,99
6	IE BANDERA DEL PERU	M & C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.LTDA	ICA	6.030.816,18	RJ-0033-2014-ED	24/01/2014	6.410.069,22
7	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	FAMOGA E.I.R.L	APURIMAC	242.850,10	RJ-0062-2014-ED	17/02/2014	238.767,68
8	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	RF CONSTRUCCION & INVERSIONES S.A.C.	ICA	348.161,19	RJ-0063-2014-ED	20/02/2014	359.096,92
9	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	CONSORCIO FANNING II	LIMA	17.676.984,47	RJ-0178-2014-ED	22/04/2014	18.073.494,12
10	IE 80844	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	611.425,51	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	595.670,02
11	IE 80875	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	529.720,60	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	515.036,37
12	IEI 1831	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	394.191,58	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	388.348,02
13	IE 80061	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	1.021.863,44	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	750.646,56
14	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO GRUPO MAIN - MATH CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAC - INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES SAC	SAN MARTIN	5.050.746,00	RJ-0316-2014-ED	25/07/2014	5.231.495,20
15	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1.616.926,40	RJ-0342-2014-ED	13/08/2014	1.679.673,71
16	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1.616.926,40	RJ-0358-2014-ED	26/08/2014	Reformulación
17	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CONSORCIO CUSCO - A.R.C. S.R.L. - CORRALES INGENIEROS S.R.L.	CUSCO	23.946.215,94	RJ-0340-2014-ED	13/08/2014	25.280.692,28
18	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	JAST S.R.L. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES	AREQUIPA	25.113.894,42	RJ-0331-2014-ED	06/08/2014	28.952.632,48
19	IE MARIANO MELGAR	MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES	AREQUIPA	38.754.082,09	RJ-0353-2014-ED	21/08/2014	39.909.149,47
20	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	CONSTRUCCIONES EQQU S.A.	LIMA	1.869.793,32	RD-0023-2014-ED	15/09/2014	1.956.090,54
21	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO DEL CARMEN	CAJAMARCA	22.087.820,38	RD-0016-2014-ED	08/09/2014	21.893.461,93
22	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO DEL CARMEN	CAJAMARCA	22.087.820,38	RD-0102-2014-ED	14/11/2014	Reformulación

02.- SUPERVISION

1	MIGUEL GRAU	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	APURIMAC	1.114.000,00	RJ-0085-2014-ED	04/03/2014	1.237.977,94
2	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C.	LIMA	940.069,51	RJ-0097-2014-ED	05/03/2014	968.271,56
3	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	900.451,81	RJ-0086-2014-ED	05/03/2014	1.026.577,37
4	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	900.451,81	RJ-0103-2014-ED	11/03/2014	1.026.577,37
5	IE 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES	CONSORCIO ICA	ICA	148.701,72	RJ-0113-2014-ED	14/03/2014	126.387,52
6	DOS DE MAYO	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	MADRE DE DIOS	465.817,44	RJ-0226-2014-ED	20/05/2014	523.513,36
7	IE SANTA ISABEL	CONSORCIO SUPERVISOR ALFA - JUAN ERNESTO ROMUALDO SANCHEZ MAYORA - REGNER BASURCO JIMENEZ	JUNIN	2.124.000,00	RJ-0036-2014-ED	28/01/2014	112.572,00
8	IE 5088 HEROES DEL PACIFICO	CONSORCIO ZUÑIGA - ESTELA PALOMINO RUIZ - ELMER ALFONSO SULCA BARRON	CALLAO	183.633,94	RJ-0037-2014-ED	28/01/2014	192.601,95
9	IE HIPOLITO UNANUE	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	310.000,00	RJ-0011-2014-ED	08/01/2014	354.827,41
10	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO MORE & ORUE	CAJAMARCA	1.138.022,52	RJ-0266-2014-ED	20/06/2014	1.138.022,52
11	IE TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	CONSORCIO FERNICE INGENIEROS	AMAZONAS	560.000,00	RJ-0290-2014-ED	03/07/2014	602.834,00
12	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	CUSCO	659.604,66	RJ-0337-2014-ED	11/08/2014	901.643,69
13	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO ING. JULIAN MENDOZA & ING. CESAR TAPIA JULCA	SAN MARTIN	222.645,19	RJ-0356-2014-ED	21/08/2014	222.645,19
14	IE ANTENOR ORREGO	ROJAS PAZOS ENRIQUE FERNANDO	LIMA	1.033.000,72	RD-0040-2014-ED	02/10/2014	967.003,45
15	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI	CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	LORETO	590.000,00	RD-0097-2014-ED	12/11/2014	564.282,07
16	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI	CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	LORETO	590.000,00	RD-0111-2014-ED	21/11/2014	Reformulación
17	EL TRIUNFO - II ETAPA	CONSULTORIA Y SUPERVISION G y M S.A.C	TUMBES	289.896,26	RD-0091-2014-ED	11/11/2014	289.896,26

**PERÚ**Ministerio de
Educación

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2014


Resumen :

PERIODO		OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01. -	PERIODO - 2006	44	48.465.534,33
02.-	PERIODO - 2007	64	52.142.241,97
03.-	PERIODO - 2008	25	40.765.868,98
04.-	PERIODO - 2009	29	61.225.516,19
05.-	PERIODO - 2010	67	243.203.569,79
06.-	PERIODO - 2011	42	589.848.336,93
07.-	PERIODO - 2012	36	390.716.522,88
08.-	PERIODO - 2013	29	289.457.225,51
09.-	PERIODO - 2014 (Enero - Noviembre)	13	210.362.363,17
Total Obras e Inversión Estimada		349	1.926.187.179,75

(*) No Estan consideradas las Obras Resueltas.

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

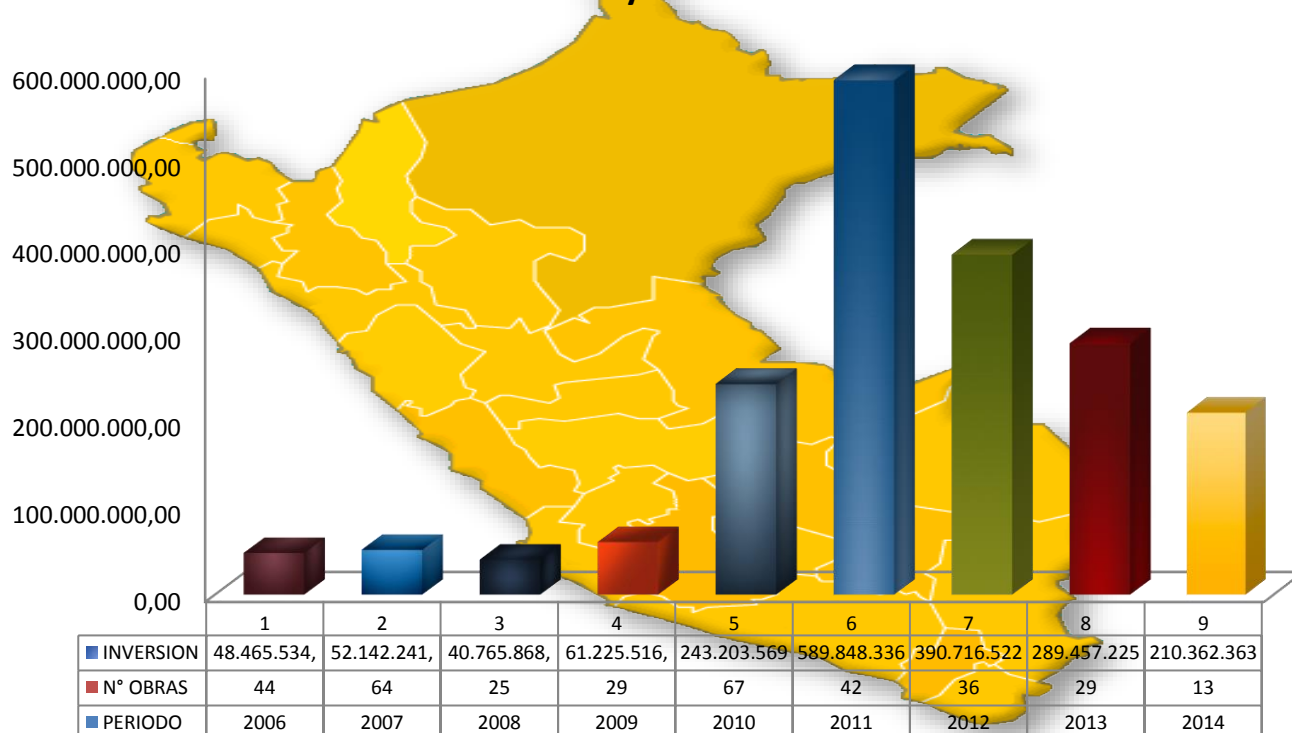

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión, así como importes generados por Obras Adicionales etc.




OBRAS EMBLEMATICAS

Lima y Regiones al Mes de Noviembre 2014



RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	2	4	50
2	REGIONES	44	19	24	87
Totales :		88	21	28	137

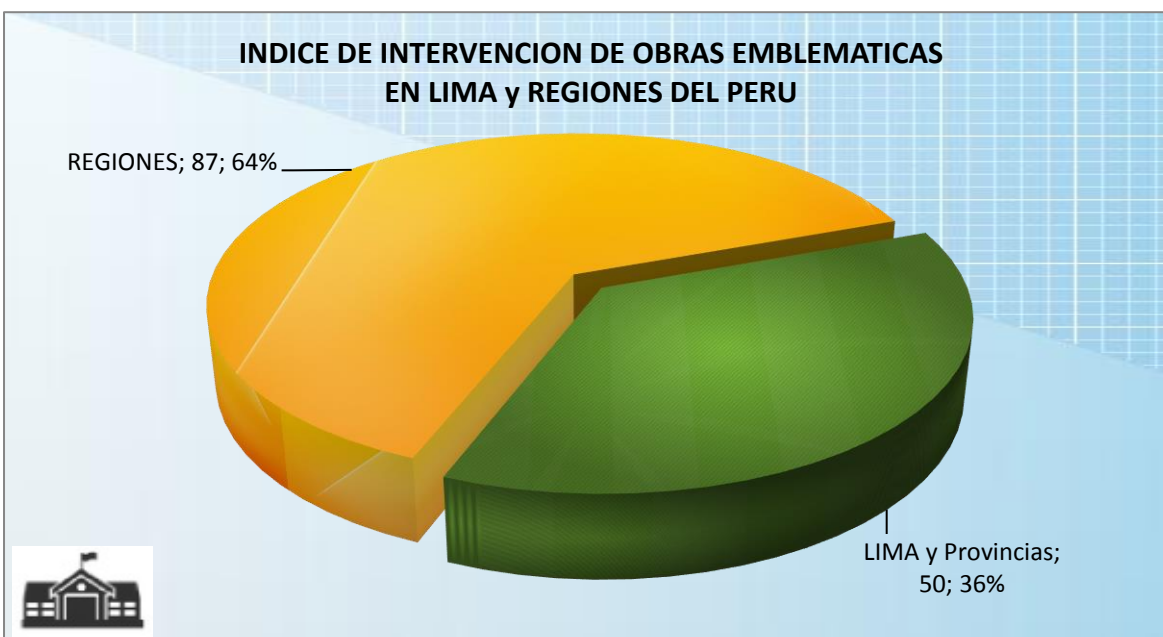



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EMBLEMATICAS

Lima y Regiones al Mes de Noviembre 2014




RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	2	4	50
2	REGIONES	44	19	24	87
Totales :		88	21	28	137

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS EN LIMA PROVINCIAS



ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS PROVINCIAS

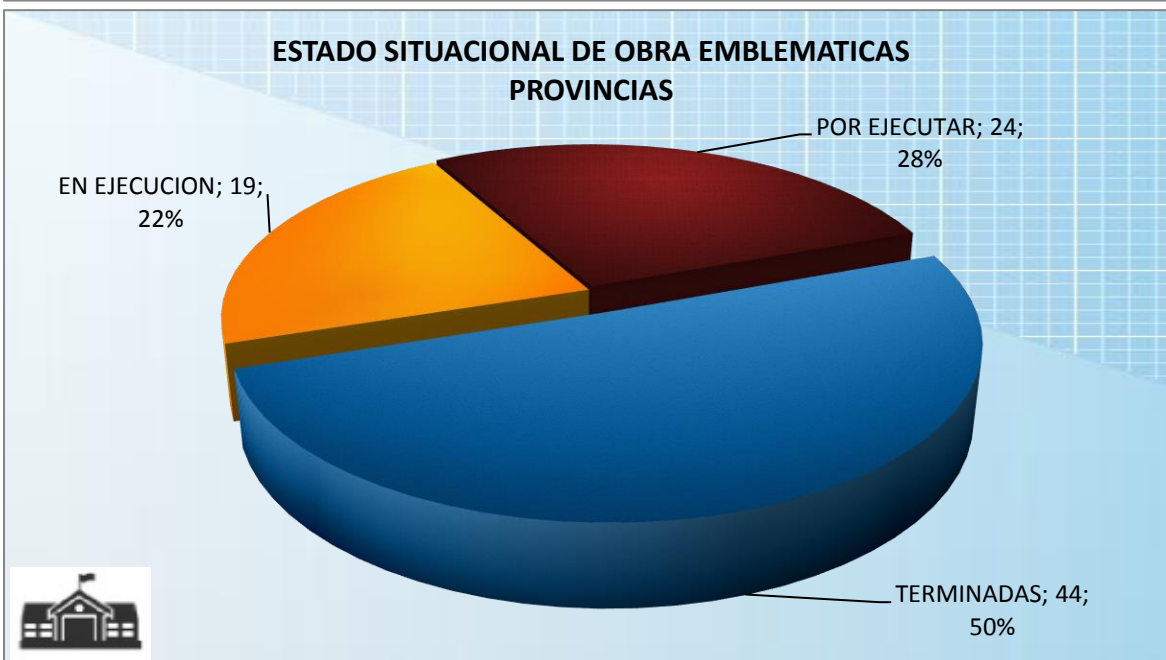

PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS
OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242.850,10	90	100,00%	100,00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	35	100,00%	100,00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19.247.752,85	240	100,00%	100,00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10.984.825,12	240	100,00%	100,00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7.499.087,49	240	100,00%	100,00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14.698.756,22	270	100,00%	100,00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17.809.857,86	240	100,00%	100,00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST.	24.850.130,00	300	100,00%	100,00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44.922.369,46	288	100,00%	100,00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56.895.969,19	420	100,00%	100,00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	7.546.407,26	240	100,00%	100,00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12.552.231,68	240	100,00%	100,00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22.606.616,90	210	100,00%	100,00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18.733.216,84	300	100,00%	100,00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553.458,16	60	100,00%	100,00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8.498.883,99	180	100,00%	100,00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54.450.760,00	360	100,00%	100,00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7.725.531,18	240	100,00%	100,00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16.352.313,60	300	100,00%	100,00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28.760.197,28	360	100,00%	100,00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27.303.268,20	300	100,00%	100,00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20.567.329,08	300	100,00%	100,00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39.709.126,15	300	100,00%	100,00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10.819.997,45	270	100,00%	100,00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODRI	SAN NICOLAS	21.830.737,21	270	100,00%	100,00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5.192.205,06	180	100,00%	100,00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22.087.820,38	330	100,00%	100,00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5.803.114,30	180	100,00%	100,00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9.966.975,86	240	100,00%	100,00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15.001.252,09	150	100,00%	100,00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15.716.683,73	240	100,00%	100,00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2.762.375,59	120	100,00%	100,00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12.926.017,97	180	100,00%	100,00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109.160,87	45	100,00%	100,00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	270	100,00%	100,00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193.598,06	45	100,00%	100,00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	360	100,00%	100,00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2.546.695,38	120	100,00%	100,00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77.103,64	30	100,00%	100,00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	420	100,00%	100,00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196.003,67	45	100,00%	100,00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6.950.503,23	180	100,00%	100,00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14.730.418,50	240	100,00%	100,00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10.598.133,02	240	100,00%	100,00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13.274.564,17	270	100,00%	100,00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11.568.701,69	240	100,00%	100,00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10.386.423,92	210	100,00%	100,00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13.699.468,94	240	100,00%	100,00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7.669.799,25	180	100,00%	100,00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.540.886,61	270	100,00%	100,00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6.450.213,48	180	100,00%	100,00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16.102.546,53	270	100,00%	100,00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18.976.461,40	270	100,00%	100,00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13.767.910,99	240	100,00%	100,00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12.337.712,85	180	100,00%	100,00%	27/09/2011
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5.955.773,30	45	100,00%	100,00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2.727.463,60	75	100,00%	100,00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3.775.993,03	90	100,00%	100,00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUE	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3.723.072,73	90	100,00%	100,00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8.121.877,69	120	100,00%	100,00%	21/01/2011



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS TERMINADAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14.489.268,00	300	100,00%	100,00%	20/02/2012
62	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.224.843,00	240	100,00%	100,00%	21/09/2011
63	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29.943.516,23	270	100,00%	100,00%	13/02/2013
64	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14.955.474,15	240	100,00%	100,00%	25/08/2011
65	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920.031,48	30	100,00%	100,00%	28/10/2010
66	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2.677.215,75	150	100,00%	100,00%	03/10/2011
67	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26.519.751,67	300	100,00%	100,00%	01/04/2013
68	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28.750,88	20	100,00%	100,00%	24/11/2011
69	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3.569.179,06	90	100,00%	100,00%	17/05/2011
70	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19.932.413,36	300	100,00%	100,00%	23/04/2014
71	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33.382.049,92	360	100,00%	100,00%	02/04/2014
72	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6.785.340,79	120	100,00%	100,00%	29/12/2011
73	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8.206.571,31	270	100,00%	100,00%	10/10/2012
74	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26.740.032,38	360	100,00%	100,00%	04/09/2013
75	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17.676.984,47	270	100,00%	100,00%	07/01/2013
76	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979.595,01	90	100,00%	100,00%	09/01/2012
77	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5.695.943,21	150	100,00%	100,00%	04/05/2012
78	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6.094.843,57	150	100,00%	100,00%	09/08/2012
79	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DE	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4.013.808,33	90	100,00%	100,00%	08/11/2012
80	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1.969.105,31	120	100,00%	100,00%	21/03/2012
81	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1.079.857,24	45	100,00%	100,00%	11/04/2012
82	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4.884.836,81	240	100,00%	100,00%	11/02/2014
83	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3.757.857,00	120	100,00%	100,00%	06/11/2012
84	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIC	20.829.352,78	330	100,00%	100,00%	11/08/2014
85	AMC	39	2014	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	30	100,00%	100,00%	-
86	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	330	100,00%	100,00%	-
87	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	360	100,00%	100,00%	-
88	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	360	100,00%	100,00%	-

OBRAS EN EJECUCION

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	95,40%	90,98%	-
2	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	360	100,00%	95,61%	-
3	EXON	154	2010	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	240	100,00%	98,60%	-
4	LP	4	2014	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	3,45%	3,53%	-
5	LP	5	2014	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	1,11%	1,50%	-
6	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	420	100,00%	72,33%	-
7	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCIO	SANTA ANA	22.630.000,00	360	39,09%	39,19%	-
8	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	100,00%	93,89%	(P)
9	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	83,46%	77,65%	-
10	LP	13	2014	LEONCIO PRADO - II ETAPA	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	-	-	-
11	PESP	67	2012	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	300	100,00%	71,69%	-
12	AMC	56	2014	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUJA	JAUJA	8.720.999,29	240	7,98%	8,04%	-
13	LP	25	2013	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	210	93,31%	61,01%	-
14	LP	35	2013	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE C	SANTIAGO DE CHUC	27.806.000,00	360	20,09%	21,29%	-
15	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	360	99,79%	99,37%	-
16	LP	29	2013	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALD	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	240	71,70%	15,20%	-
17	LP	36	2013	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18.429.104,54	360	24,56%	24,25%	-
18	PESP	49	2012	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	330	100,00%	99,54%	-
19	LP	1	2013	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	420	96,77%	51,58%	-
20	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	360	100,00%	89,01%	-
21	LP	33	2013	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	360	13,29%	8,70%	-

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la USOM.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Referencial	PLAZO Ejecución	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	LP	12	2014	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	19.498.304,07	300	-	-	POR INICIAR
2	LP	14	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	-	-	POR INICIAR
3	LP	15	2014	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	-	-	POR INICIAR
4	LP	17	2014	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	-	-	POR INICIAR
5	LP	20	2014	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	-	-	POR INICIAR
6	LP	21	2014	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	-	-	POR INICIAR
7	LP	37	2014	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	-	-	POR INICIAR
8	-	-	-	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	12.537.440,55	300	-	-	-
9	-	-	-	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	18.139.135,40	300	-	-	-
10	-	-	-	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	22.101.902,53	300	-	-	-
11	-	-	-	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	34.495.555,12	360	-	-	-
12	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	21.714.288,11	360	-	-	-
13	-	-	-	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	34.528.233,91	390	-	-	-
14	-	-	-	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	20.587.624,82	360	-	-	-
15	-	-	-	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	38.049.681,12	380	-	-	-
16	-	-	-	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	38.540.023,79	380	-	-	-
17	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	25.120.109,35	360	-	-	-
18	-	-	-	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	23.808.077,05	360	-	-	-
19	-	-	-	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI	16.189.378,22	330	-	-	-
20	-	-	-	I.E. JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	32.835.984,47	420	-	-	-
21	-	-	-	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	28.615.249,50	360	-	-	-
22	-	-	-	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.305.954,62	60	-	-	-
23	-	-	-	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	201.709,62	45	-	-	-
24	-	-	-	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	456.398,79	90	-	-	-
25	-	-	-	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	16.456.566,22	270	-	-	-
26	-	-	-	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	212.776,37	60	-	-	-
27	-	-	-	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1.613.854,44	120	-	-	-
28	-	-	-	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	8.876.818,95	180	-	-	-

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES




3. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

Para asegurar que los procedimientos constructivos se estén haciendo correctamente, es necesario entender y aprender algunas operaciones básicas que se describen a continuación.

3.1 MARCAR NIVELES

Es una operación que consiste en marcar una altura de referencia, generalmente 1 m respecto al nivel de la vereda. Este procedimiento se realiza sobre muros, columnas o estacas, para lo cual se emplea una manguera transparente llena de agua, que funciona mediante el principio de vasos comunicantes. Según este principio, el agua siempre busca estabilizar su nivel, así podemos trasladar una misma altura a los lugares donde se necesite.

Antes de comenzar a marcar niveles, se debe verificar que en la manguera con agua no hayan quedado burbujas de aire atrapadas. Para lograrlo, se juntan ambos extremos de la manguera y se comprueba que el agua quede a la misma altura (ver figura 39). Posteriormente, se coloca un extremo de la manguera sobre la altura de referencia y el otro extremo en el lugar donde se necesite marcar el nuevo punto. Este punto recién se podrá marcar, cuando en el otro extremo el nivel del agua coincida con la altura de referencia, es decir, cuando el agua ya no se mueva (ver figura 40).

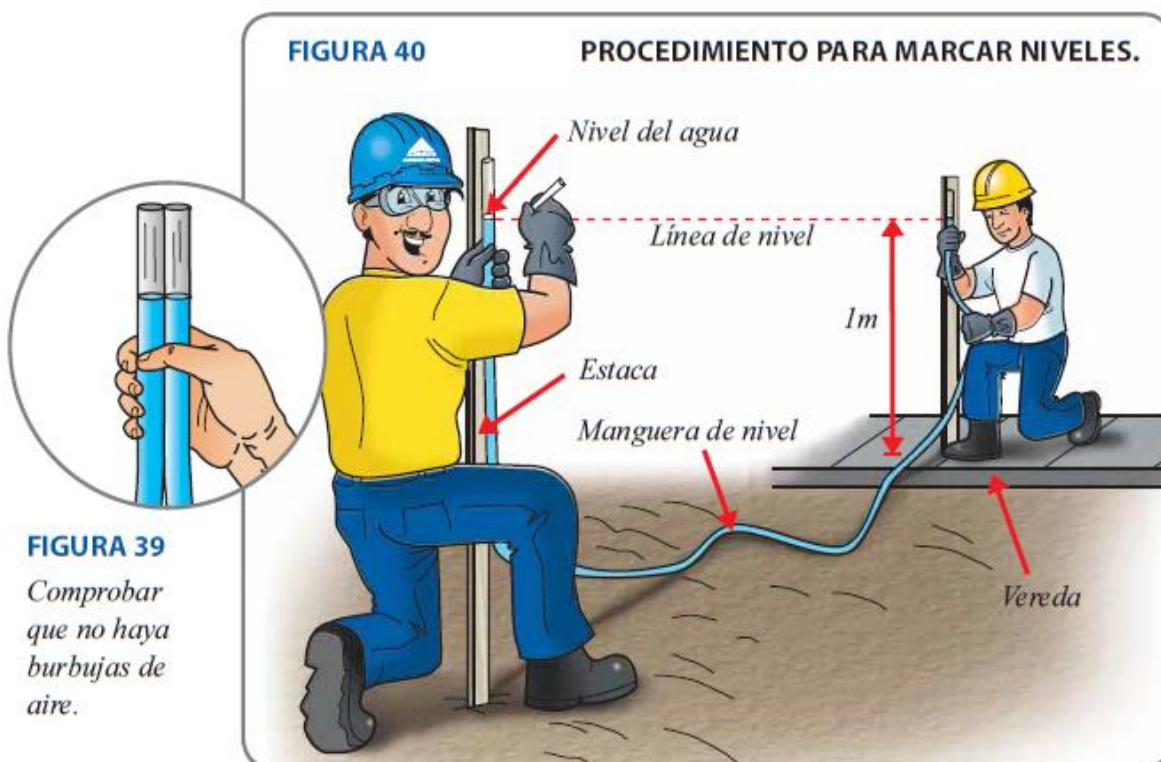


ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES



3.2 NIVELAR



Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén horizontales. Para esto, se usa el nivel de mano, en él se verifica que la burbuja de aire se encuentre exactamente centrada dentro de la marca (ver figura 41).

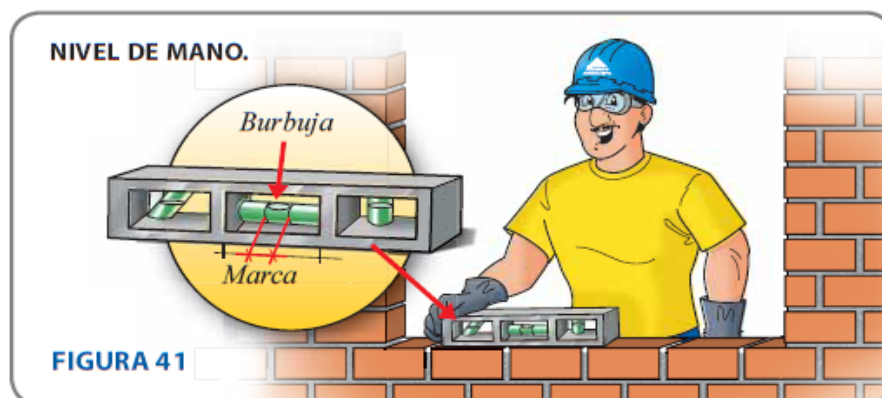

3.3 APLOMAR

Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén en posición vertical. Para esto, se hace uso de una plomada. Por ejemplo, podemos aplomar un muro de ladrillos, la colocación de las tablas del encofrado, una columna terminada, etc.

Para aplomar se puede usar el nivel de mano o la plomada. Para usar esta última, se coloca la parte superior de su corredera en el elemento que se quiere verificar y se deja caer la plomada unos centímetros antes del suelo. Después, se verifica que el borde lateral de la plomada no esté muy separado ni pegado contra el elemento (ver figura 42). Si no se cumple esto, quiere decir que el elemento se encuentra desaplomado. En este caso, si es posible, se deberá mover el elemento hasta aplomarlo (ver figura 43).

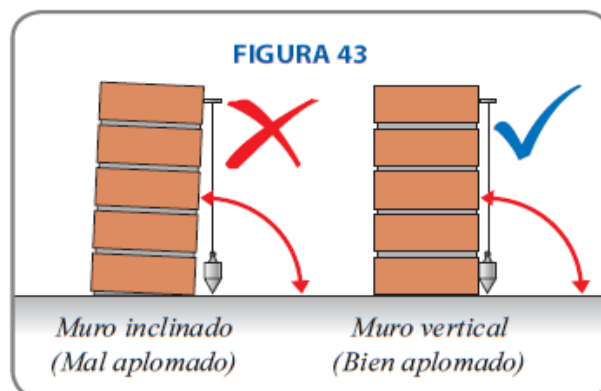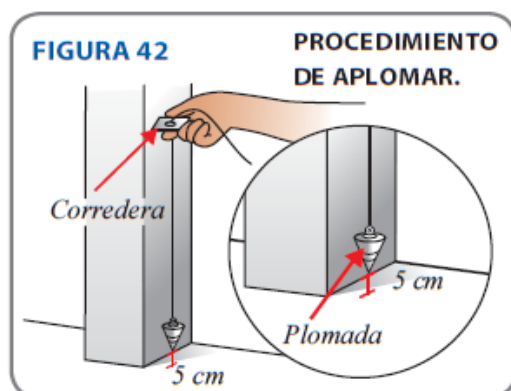

Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS

4. NIVELACIÓN DE TERRENOS EN LADERA


4.1 COLOCACIÓN DE NIVELES

Para realizar la nivelación del lote, requeriremos de una manguera transparente de 1/2" de diámetro y no más de 10 m de longitud.

La manguera se llena con agua, evitando la presencia de burbujas en el interior. Esta operación puede desarrollarse con la ayuda de un balde o de un cilindro.

Para iniciar la nivelación, se colocan estacas en las esquinas y a lo largo de los linderos del terreno. Éstas deben enterrarse a una profundidad suficiente para que tengan una buena estabilidad, verificando además con una plomada, que se mantengan en posición vertical.

Con una de las estacas ubicadas al frente del terreno, se mide 1 m desde el nivel de la vereda y se marca. Luego, estiramos la manguera hasta alcanzar la segunda estaca, y valiéndonos del nivel de agua dentro de la manguera, trasladamos dicho nivel a esta segunda estaca. Para ello es importante esperar a que el nivel de agua se haya estabilizado (ver figura 52).

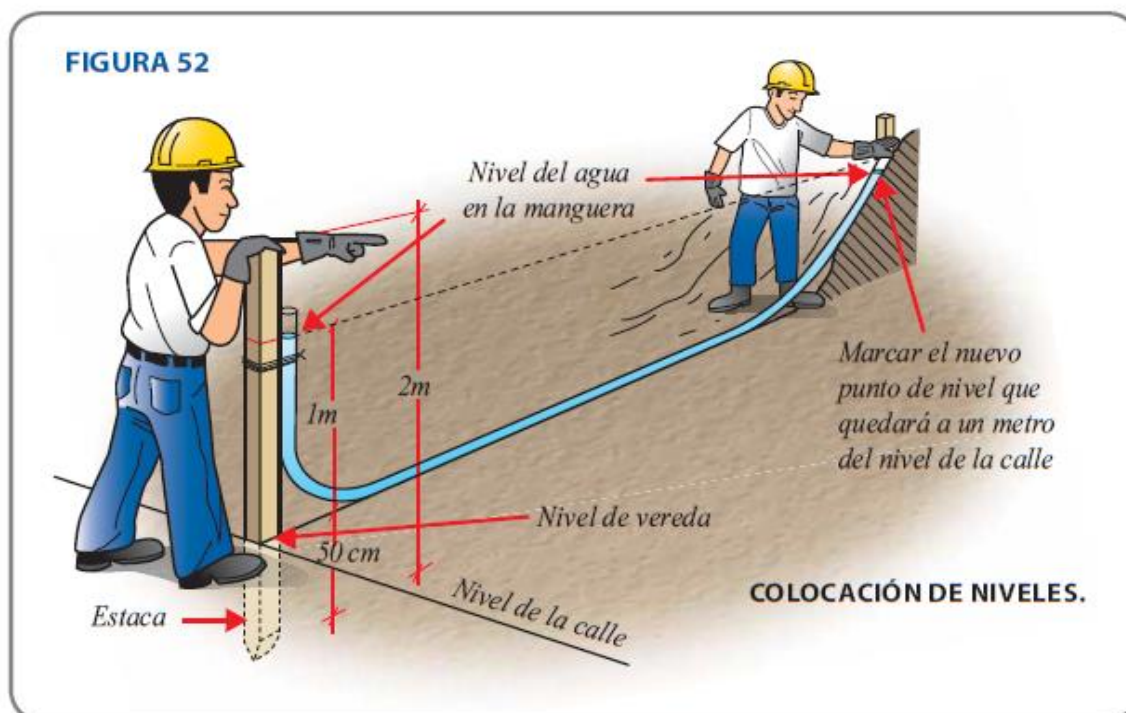

Este proceso lo podemos desarrollar con las otras estacas en tramos de 10 a 20 m y la cantidad de veces que se necesite según la pendiente del terreno.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

LA IMPOSIBILIDAD:

"Si crees que algo es imposible, lo harás imposible".

Bruce Lee



PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRESO PARA TODOS

Trabajamos con responsabilidad y transparencia por una educación de calidad



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO, CONTAMOS CONTIGO!



Oficina General de Ética Pública y Transparencia



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Unidad de Ejecución de Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Unidad de Ejecución de Obras - PRONIED
