



Informe Mensual - Equipo de Ejecución de Obras

Agosto 2015

Lima - Año 4 - Número 8 Agosto, 2015 - Distribución por Email
Edición Mensual

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación



ALBERTO ALBERTO RODRIGUEZ



@

PRONIED



#PRONIEDINICIACION

www.pronied.gob.pe

Rumbo a la nota más alta

OBRA EN EJECUCION : "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – HUANUCO – HUANUCO" - Inversión Estimada : S/.18.893,019.70. - Avance Físico 42.18%



Octava Edición Agosto de 2015
Diseño y Gráficos : Ana Doris Alvarez Rodriguez
Fuente de Datos : Aplicativo SEEC OBRAS
Equipo de Ejecución de Obras - UGEO
Anexo : 25-650



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS



Informe Mensual - Equipo de Ejecución de Obras **Agosto 2015**

Lima - Año 4 - Número 8 - Agosto, 2015 - Distribución por Email
Edición Mensual



f [VER EL INFORME](#) @ [@PRONIED](#) # [#PRONIEDINFORME](#)

www.pronied.gob.pe

CONTENIDO

- 01.- Obras en Ejecución Agosto 2015**
- 02.- Procesos de Convocatoria**
- 03.- Obras Terminadas al mes de Agosto 2015**
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú**
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.**
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión**
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2015 (Agosto).**
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias**
- 09.- Términos y Definiciones.**
- 10.- Descripción Visual de Actividades realizadas en diversas Obras Civiles.**



Octava Edición Agosto del 2015
Diseño y Gráficos: Ana Doris Alvarez Rodriguez
Fuente de Datos: Aplicativo SEEC-OBRA
Equipo de Ejecución de Obras - UGEO
Anexo: 25-150



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	33
2	PROGRAMA REGULAR	2
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	4
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		39



**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito			Inicio	Fin + Amp.	

EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS

1	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	243.477,98	75	04/08/2015	17/10/2015	-
2	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	24/01/2015	17/02/2016	33,79%
3	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	84.621,33	30	19/08/2015	17/09/2015	-
4	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	360	06/05/2014	09/08/2015	83,62%
5	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CH	SANTIAGO DE CH	27.806.000,00	360	17/06/2014	04/08/2015	63,53%
6	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL	34.686.021,42	380	03/02/2015	17/02/2016	38,77%
7	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE F	34.244.713,01	380	16/12/2014	30/12/2015	45,70%
8	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	10/10/2014	04/10/2015	83,56%
9	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	15/10/2014	09/10/2015	32,98%
10	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	15/01/2015	18/01/2016	27,71%
11	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE L	19.498.304,07	300	27/11/2014	22/09/2015	37,91%
12	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	01/11/2014	13/08/2015	79,22%
13	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	04/12/2014	15/01/2016	24,09%
14	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	27/11/2014	22/09/2015	70,24%
15	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	20/12/2014	14/12/2015	57,97%
16	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	14/01/2015	08/01/2016	42,18%
17	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	24/12/2014	19/10/2015	47,77%
18	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SIS	11.344.620,60	300	04/12/2014	29/09/2015	47,03%
19	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	26/11/2014	20/11/2015	64,87%
20	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	13/01/2015	08/11/2015	55,74%
21	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	21/01/2015	15/01/2016	20,05%
22	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACER	JUANJUI	13.718.000,00	330	23/03/2015	15/02/2016	33,61%
23	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	30/12/2014	07/11/2015	23,54%
24	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	22/12/2014	18/08/2015	40,28%
25	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	12/03/2015	05/03/2016	11,04%
26	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	18.528.862,34	360	17/03/2015	10/03/2016	7,56%
27	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	07/04/2015	31/03/2016	16,32%
28	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	180	20/03/2015	17/09/2015	73,70%
29	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	31.045.999,61	360	21/07/2015	14/07/2016	0,66%
30	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	04/01/2013	27/07/2015	94,67%
31	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	22/01/2013	04/03/2015	93,12%
32	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	420	19/01/2013	05/09/2014	91,86%
33	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	300	15/02/2013	19/10/2014	90,01%

PROGRAMA REGULAR

1	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv- 10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296.149,36	75	29/04/2015	12/07/2015	84,40%
2	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	12.876.435,34	300	12/12/2014	13/11/2015	73,73%

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5.896.843,66	180	07/11/2014	10/07/2015	77,42%
2	IE 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIF	3.137.673,94	180	23/12/2014	09/08/2015	50,35%
3	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	5.844.004,16	240	20/01/2015	16/09/2015	58,15%
4	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	MORROPON	SALITRAL	3.188.113,74	180	20/03/2015	15/09/2015	73,63%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorización tramitada por la UGEO.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	POR INICIAR	6
2	POR CONVOCAR y/o EN TRAMITE	35
	TOTAL DE OBRAS EN PROCESO	41



**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



REPORTE DE PROCESOS EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Procesos con Buena Pro y Obras por Iniciar:

	EMBLEMATICAS	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	033271	002-2015-UGEO	13/01/2015	1.306.464,55	Buena Pro otorgada a Consorcio Gabriel (Constructora G.N. Gamboa & CIA Sociedad Anónima Cerrada - Sheysa Contratistas S.A.C. - Construcciones y Negocios EIRL) Monto Adjudicado S/. 1'175,818.10
	PROGRAMA REGULAR	IE CSMA 67 - II ETAPA	LA LIBERTAD	034154	015-2015-UGEO	27/02/2015	845.921,94	Buena Pro otorgada a Consorcio Trujillo (Inversiones Vista Alegre E.I.R.L. - Constructora MAGUPA E.I.R.L.) Monto Adjudicado S/. 761,329.75
	EMBLEMATICAS	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	024788	017-2015-UGEO	16/03/2015	234.631,06	Buena Pro otorgada el 25/08/2015 a Contratistas Generales Marreros E.I.R.L. Monto Adjudicado S/. 211,167.96
	EMBLEMATICAS	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	019824	026-2015-UGEO	20/05/2015	202.746,26	Buena pro otorgada el 12/08/2015 a Consorcio VILLACAR (Villacruz Contratistas S.R.L. - Edcar Ing. Contrat Grs E.I.R.L.) Monto Adjudicado S/. 182,471.64
	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD - MURO DE CONTENCIÓN	ANCASH	037060	029-2015-UGEO	27/05/2015	60.347,23	Buena pro otorgada el 13/08/2015 a ECOISSA Contratistas Generales S.A.C. Monto Adjudicado S/. 54,312.51
	PROGRAMA REGULAR	IE 153	LIMA	033476	008-2015-UGEO	30/01/2015	1.829.935,42	Buena Pro otorgada el 24/08/2015 a BBC Servicios de Ingeniería S.R.L. Monto Adjudicado S/. 1'646,941.88

02.- Procesos por Convocar :

1	EMBLEMATICAS	DOS DE MAYO - CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA	MADRE DE DIOS	041693	042-2015-UGEO	06/08/2015	111.562,98	POR CONVOCAR
2	EMBLEMATICAS	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	033117	025-2015-UGEO	18/05/2015	15.270.604,62	INTEGRACIÓN DE BASES
3	EMBLEMATICAS	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	032382	017-2014-UGEO	12/12/2014	21.498.797,95	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES
4	PROGRAMA REGULAR	IE 115-31 GOTITAS DE AMOR	LIMA	035876	020-2015-UGEO	28/04/2015	916.436,04	EN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
5	EMBLEMATICAS	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	032381	032-2014-UGEO	11/06/2015	26.207.700,60	ABSOLUCION DE CONSULTAS
6	PROGRAMA REGULAR	IE 20188 - IEI 627	LIMA	034153	014-2015-UGEO	27/02/2015	7.503.025,83	INTEGRACIÓN DE BASES
7	PROGRAMA REGULAR	IE 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA	LIMA	033787	043-2015-UGEO	17/08/2015	2.795.957,16	POR CONVOCAR
8	PROGRAMA REGULAR	IE 331 DIVINO NIÑO JESUS	LIMA	040425	038-2015-UGEO	15/07/2015	2.729.039,05	POR CONVOCAR
9	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - MEDIA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	042015	044-2015-UGEO	17/08/2015	238.996,48	POR CONVOCAR
10	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEDIA TENSION	APURIMAC	033790	012-2015-UGEO	19/02/2015	196.148,57	POR CONVOCAR
11	EMBLEMATICAS	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	033478	0009-2015-UGEO	30/01/2015	32.011.807,81	ELEVADO OSCE
12	PROGRAMA REGULAR	IE CASA BLANCA DE JESUS	LIMA	033274	022-2015-UGEO	29/04/2015	3.176.929,20	POR CONVOCAR
13	EMBLEMATICAS	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	031779	027-2015-UGEO	21/05/2015	23.562.157,05	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
14	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	033479	010-2015-UGEO	30/01/2015	34.799.693,40	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES
15	EMBLEMATICAS	IE GENARO HERRERA	LORETO	032383	035-2015-UGEO	03/07/2015	21.916.418,23	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.
16	EMBLEMATICAS	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	033270	001-2015-UGEO	08/01/2015	22.961.307,11	INTEGRACIÓN DE BASES
17	PROGRAMA REGULAR	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	033269	046-2015-UGEO	19/08/2015	12.766.909,41	INTEGRACIÓN DE BASES
18	PROGRAMA REGULAR	IE JOHN F. KENNEDY - SISTEMA MEDIA TENSION	ICA	022996	028-2015-UGEO	22/05/2015	269.710,71	POR CONVOCAR
19	EMBLEMATICAS	IE JOSE ANTONIO ENCINAS MURO	PUNO	041692	041-2015-UGEO	04-0-2015	21.335.530,16	POR CONVOCAR
20	EMBLEMATICAS	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	031119	036-2015-UGEO	03/07/2015	33.291.741,85	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.
21	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	037063	030-2015-UGEO	27/05/2015	8.772.641,64	POR CONVOCAR
22	EMBLEMATICAS	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	033273	004-2015-UGEO	13/01/2015	11.538.403,94	INTEGRACIÓN DE BASES
23	EMBLEMATICAS	IE MARIANO MELGAR	PUNO	034869	019-2015-UGEO	09/04/2015	28.592.157,28	POR CONVOCAR
24	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	035877	021-2015-UGEO	28/04/2015	2.545.572,65	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
25	EMBLEMATICAS	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	027759	018-2014-UGEO	16/03/2015	1.622.598,85	POR CONVOCAR
26	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - MEDIA TENSION	PUNO	040423	034-2015-UGEO	11/06/2015	605.237,01	POR CONVOCAR
27	PROGRAMA REGULAR	IE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA	ICA	040422	033-2015-UGEO	11/06/2015	9.293.431,03	POR CONVOCAR
28	EMBLEMATICAS	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	034155	016-2015-UGEO	11/03/2015	18.585.385,23	ELEVADO OSCE
29	EMBLEMATICAS	IE SAN RAMON	JUNIN	033272	045-2015-UGEO	17/08/2015	35.071.599,44	EN ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES
30	EMBLEMATICAS	IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA PISCINA	ICA	035878	024-2015-UGEO	07/05/2015	74.194,88	POR CONVOCAR
31	EMBLEMATICAS	IE SANTO TOMAS	CUSCO	032524	031-2015-UGEO	28/05/2015	19.643.243,33	ELEVADO OSCE
32	EMBLEMATICAS	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	033475	007-2015-UGEO	30/01/2015	22.583.814,36	ELEVADO OSCE
33	PROGRAMA REGULAR	IEI 081	LIMA	041691	039-2015-UGEO	30/07/2015	1.489.512,94	POR CONVOCAR
34	PROGRAMA REGULAR	IEI 652-04 VILLA EL ROSAL	LIMA	040424	037-2015-UGEO	15/07/2015	2.098.748,38	POR CONVOCAR
35	EMBLEMATICAS	SAN JUAN - SALDO DE OBRA - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	041633	040-2015-UGEO	03/08/2015	2.550.727,78	POR CONVOCAR



PERÚ

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

VICEMINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Agosto 2015


ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	4
2	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	2
3	PROGRAMA REGULAR	2
TOTAL OBRAS TERMINADAS		8

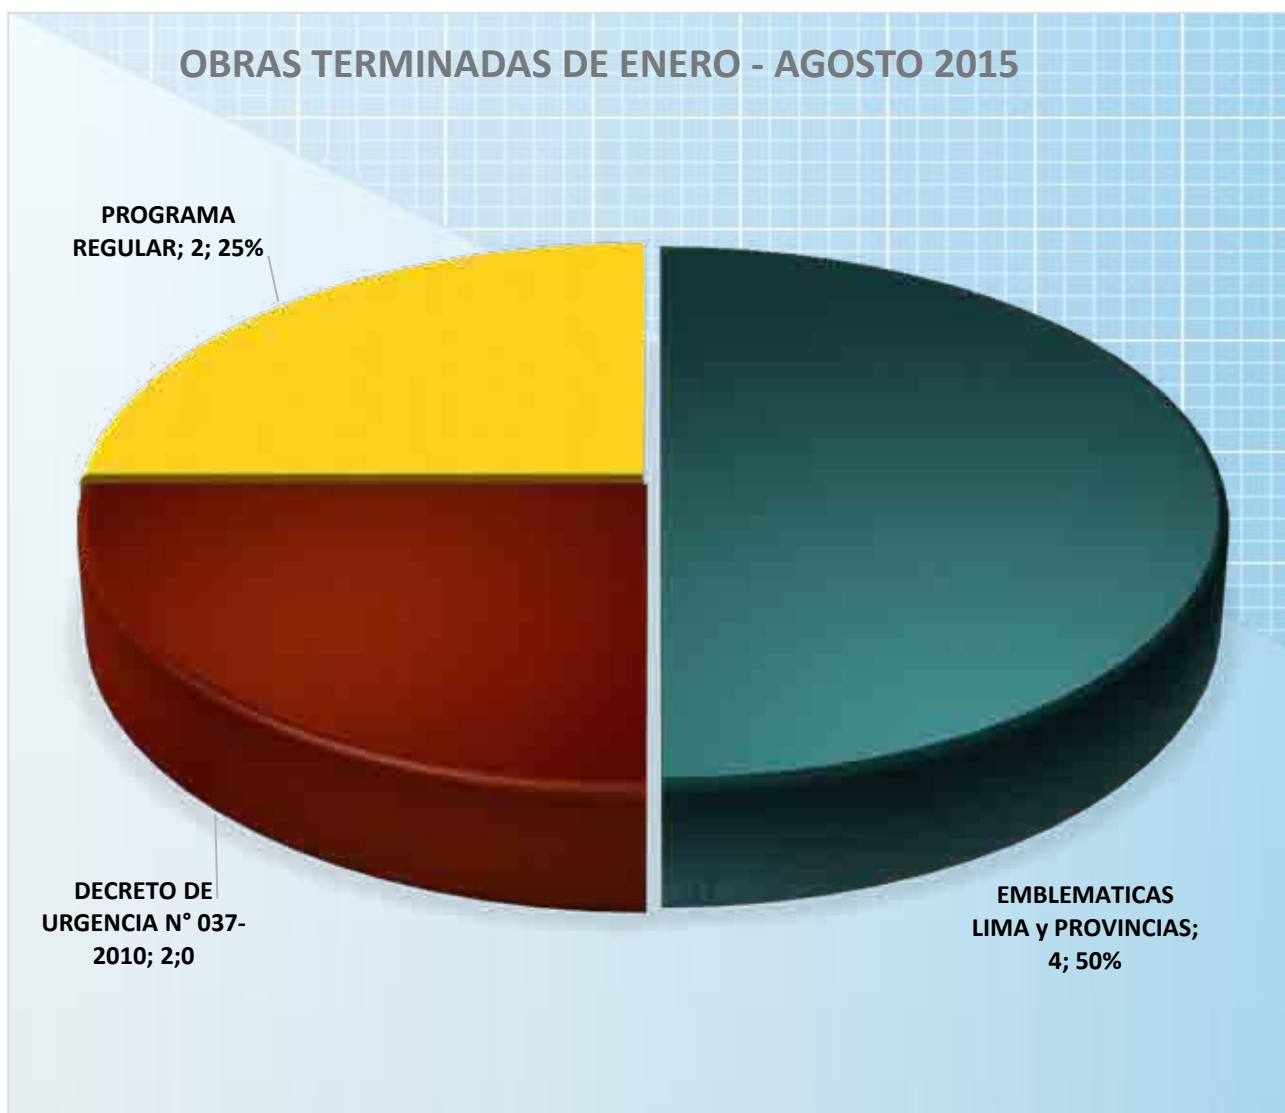

Nota : No estan consideradas las Obras que fueron Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras PRONIED





Ministerio de
Educación

Secretaría de
Educación Superior

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE ENERO - AGOSTO 2015

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1.104.233,95	31/07/2015
2	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5.586.133,51	06/08/2015
3	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	-
4	EMBLEMATICAS	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	-
5	EMBLEMATICAS	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	03/07/2015
6	EMBLEMATICAS	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	13/05/2015
7	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	881.530,86	-
8	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1.786.247,42	30/04/2015

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	(1)
2	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	(2)
3	EMBLEMATICAS	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	(3)
4	EMBLEMATICAS	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	(4)
5	EMBLEMATICAS	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	(5)
6	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2.850.259,95	(6)
7	EMBLEMATICAS	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	(7)
8	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	(8)
9	EMBLEMATICAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	410.758,92	(9)
10	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	2.247.766,20	(10)
11	EMBLEMATICAS	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUJA	JAUJA	8.720.999,29	(11)
-	EMBLEMATICAS	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	(*)

(*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : CON OFICIO N°0046-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DE FECHA 30-12-2014, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

(2) CONTRATO DE OBRA RESUELTO - MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°0023-2015-MINEDU-PRONIED-OGA DEL 12-01-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA.

(3) CONTRATO RESUELTO, CON FECHA 07.05.15 SE HA RESUELTO EL CONTRATO AL NO CONTARSE CON LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, REQUERIDA POR LA OGA ANTE LA COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD GARANTE QUE LA EXISTENTE CORRESPONDE A OTRO BENEFICIARIO. - CARTA NOTARIAL N°0138-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, DEL 07-05-2015, DONDE SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA.

(4) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°053-2015-PRONIED-OGA DEL 16-02-2015, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA. (CON MEMORANDUM N°0604-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA 12-02-2015, SE SOLICITA A LA OGA, DECLARE RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA - EXP. 5431-2015.

(5) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1218-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 23-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, LA ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - EXP. 9722-2015.

(6) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1211-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 20-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR HECHOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - EXP. 10324-2015.

(7) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°0038-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL 21-01-2015 DIRIGIDO AL CONTRATISTA SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION. - EXP. N° 8692

(8) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1335-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 30-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES, COMO COMPLETAR EL PLANTEL DE LA RESIDENCIA Y EL PLAN DE TRABAJO, ADEMÁS DE TENER UN AVANCE MENOR AL 80% - EXP. 11813-2015.

(9) CONTRATO RESUELTO : CON MEMORANDUM N°2895-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 08-07-2015, EL EQUIPO DE EJECUCION DE OBRA SOLICITA SE DECLARE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA - EXP. 26887-2015.

(10) CONTRATO RESUELTO - MEDIANTE MEMORANDUM N°3123-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE EL CONTRATISTA Y SE COMUNICA QUE LA CONSTATAcion FISICA SE REALIZARA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO 2015. - EXP. 24666-2015.

(11) CONTRATO RESUELTO - CON MEMORANDUM N°3305-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 04-08-2015, SE COMUNICA A LA OGA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE INFORMA QUE LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE BIENES SE REALIZARA LOS DIAS 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015. EXP. 29725-2015.

(*) OBRA REINICIADA MEDIANTE RESOLUCION N°02, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ARBITRAL.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Ministerio de
Educación

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Rumbo a la nota más alta

Equipo de Ejecución de Obras



**PERÚ**Ministerio de
Educaciónwww.minedu.gob.pe
vta Gestion EducativaPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"**OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU
AL MES DE AGOSTO 2015**

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	70,24%
2	EMBLEMATICAS	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	57,97%
3	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	-
4	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	73,73%
5	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	93,12%
6	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	77,42%
7	EMBLEMATICAS	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	27,71%
8	EMBLEMATICAS	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	55,74%
9	EMBLEMATICAS	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	83,56%
10	EMBLEMATICAS	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	32,98%
11	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	24,09%
12	EMBLEMATICAS	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	0,66%
13	EMBLEMATICAS	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	91,86%
14	EMBLEMATICAS	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	83,62%
15	EMBLEMATICAS	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	73,70%
16	EMBLEMATICAS	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	94,67%
17	EMBLEMATICAS	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	47,77%
18	EMBLEMATICAS	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	40,28%
19	EMBLEMATICAS	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	33,79%
20	EMBLEMATICAS	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	79,22%
21	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	42,18%
22	EMBLEMATICAS	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	90,01%
23	EMBLEMATICAS	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	64,87%
24	EMBLEMATICAS	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUC	SANTIAGO DE CHUC	63,53%
25	EMBLEMATICAS	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	37,91%
26	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	-
27	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	84,40%
28	EMBLEMATICAS	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	38,77%
29	EMBLEMATICAS	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	45,70%
30	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAF	50,35%
31	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	58,15%
32	EMBLEMATICAS	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	7,56%
33	EMBLEMATICAS	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	23,54%
34	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	MORROPON	SALITRAL	73,63%
35	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	16,32%
36	EMBLEMATICAS	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	47,03%
37	EMBLEMATICAS	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	20,05%
38	EMBLEMATICAS	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERE	JUANJUI	33,61%
39	EMBLEMATICAS	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	11,04%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la UGEO.



PERÚ

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	19 ➡		
			19	50%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	20	50%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			39	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

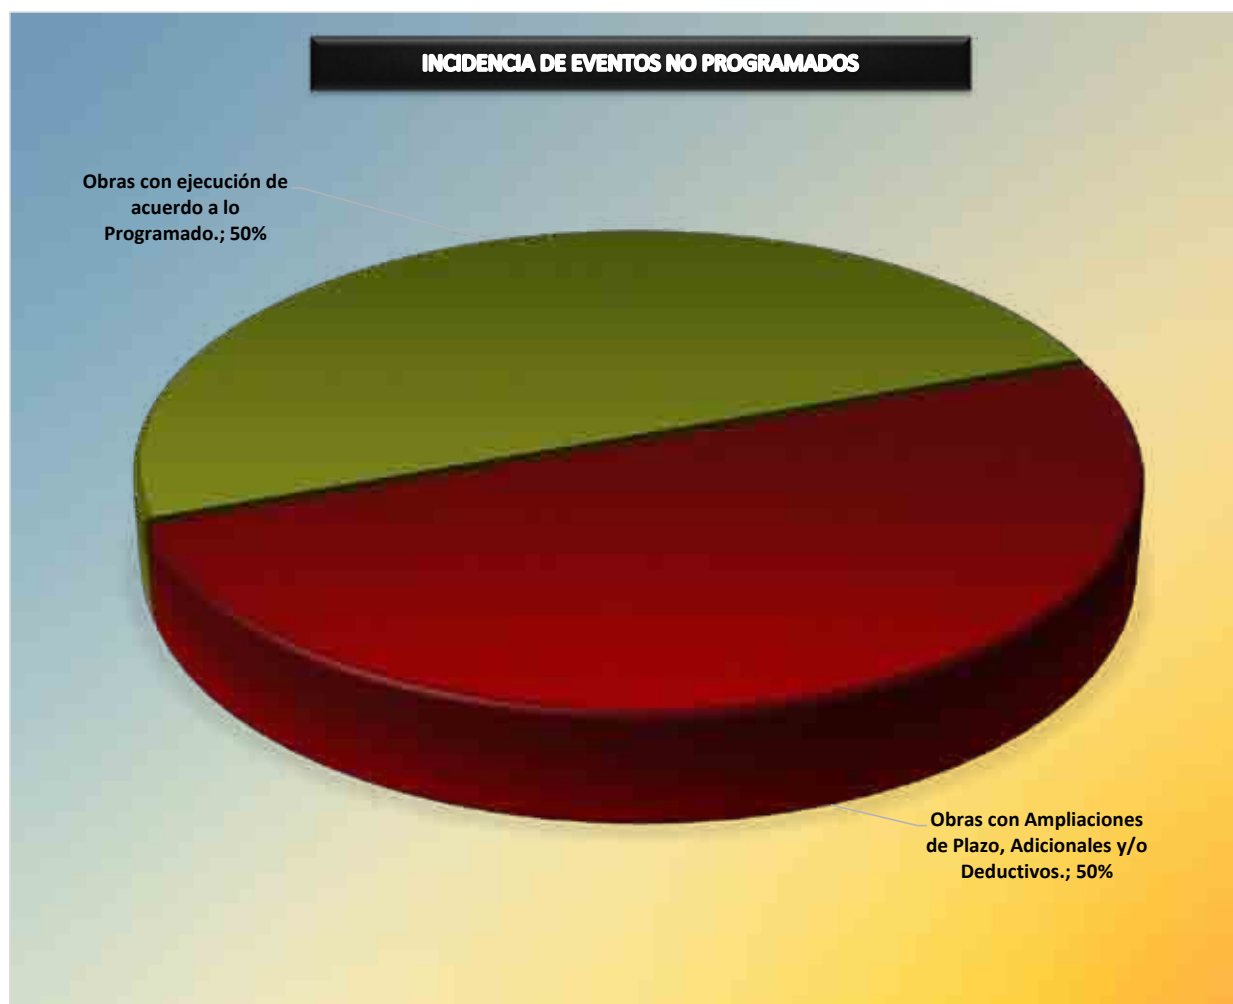

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra , pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construcción, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónVice Ministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Agosto 2015)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - AGO	9	9	18 (*)
		9	9	18

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.



**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónVicerrectorado
de ConstrucciónPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - AGOSTO 2015)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	APURIMAC	3.441.687,51	RD-0022-2015-ED	22/01/2015	3.587.658,05
2	IE SANTA TERESITA	CONSORCIO SANTA TERESITA - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.	CAJAMARCA	25.890.382,85	RD-0128-2015-ED	30/04/2015	28.287.309,14
3	IE 9 DE DICIEMBRE	C&S GUTIERREZ S.R.L.	ICA	3.329.900,07	RD-0140-2015-ED	12/05/2015	3.705.416,98
4	IE SAN JOSE	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.- FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	JUNIN	22.606.616,90	RD-0146-2015-ED	15/05/2015	REFORMULACION
5	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DORADO S.A.C.	MADRE DE DIOS	116.708,99	RD-0191-2015-ED	17/06/2015	119.447,74
6	LOCAL MINISTERIO DE EDUCACION - I ETAPA - A	CONSORCIO SAN BORJA II - CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. - CONSTRUC. INDUSTRIALES PERUANOS S.A.	LIMA	28.770.497,46	RD-0157-2015-ED	25/05/2015	REFORMULACION
7	IE MIGUEL GRAU	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS.	LIMA	7.669.799,25	RD-0176-2015-ED	08/06/2015	REFORMULACION
8	IE 22424	CONSORCIO PALPA - 3G CONSTRUCTORA SAC - VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ICA	2.381.260,63	RD-0178-2015-ED	09/06/2015	2.489.141,20
9	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	CONSORCIO ALFA - A.S.A. ASOCIADOS S.A. - SJT INMOBILIARIA S.A.C.	ICA	1.786.247,42	RD-0241-2015-ED	31/07/2015	1.822.394,24
02.- SUPERVISION							
1	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - OIST S.A.	AREQUIPA	1.760.437,89	RD-0035-2015-ED	03/02/2015	1.643.655,36
2	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H GRANT INGENIEROS S.A.C. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1.349.037,36	RD-0136-2015-ED	07/05/2015	1.340.403,52
3	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H GRANT INGENIEROS S.A.C. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1.349.037,36	RD-0152-2015-ED	18/05/2015	REFORMULACION
4	IE 20191 ALFONSO UGARTE	HECTOR KENEDI ZAVALA DOMINGUEZ	LIMA	72.336,00	RD-0186-2015-ED	12/06/2015	72.336,00
5	IE 22424	CONSORCIO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ	ICA	221.033,22	RD-0169-2015-ED	04/06/2015	239.261,00
6	IE 22424	CONSORCIO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ	ICA	221.033,22	RD-0196-2015-ED	23/06/2015	REFORMULACION
7	INCA GARCILASO DE LA VEGA	PROJECT CONSULTING S.A.	CUSCO	1.232.200,37	RD-0229-2015-ED	20/07/2015	1.121.168,23
8	IE SANTA TERESITA	VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC	CAJAMARCA	1.282.605,72	RD-0221-2015-ED	15/07/2015	1.486.577,13
9	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA	CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE - MENDI	LAMBAYEQUE	507.013,12	RD-0230-2015-ED	20/07/2015	454.662,08

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2015


Resumen :

	PERIODO	OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01.-	PERIODO - 2006	44	48.465.534,33
02.-	PERIODO - 2007	64	52.142.241,97
03.-	PERIODO - 2008	25	40.765.868,98
04.-	PERIODO - 2009	29	61.225.516,19
05.-	PERIODO - 2010	67	243.203.569,79
06.-	PERIODO - 2011	42	589.848.336,93
07.-	PERIODO - 2012	37	391.412.804,36
08.-	PERIODO - 2013	29	289.457.225,51
09.-	PERIODO - 2014	15	240.272.849,48
10.-	PERIODO - 2015 (Agosto)	8	99.071.398,11
Total Obras e Inversión Estimada		360	2.055.865.345,65

(*) No Estan consideradas las Obras Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras - UGEO

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

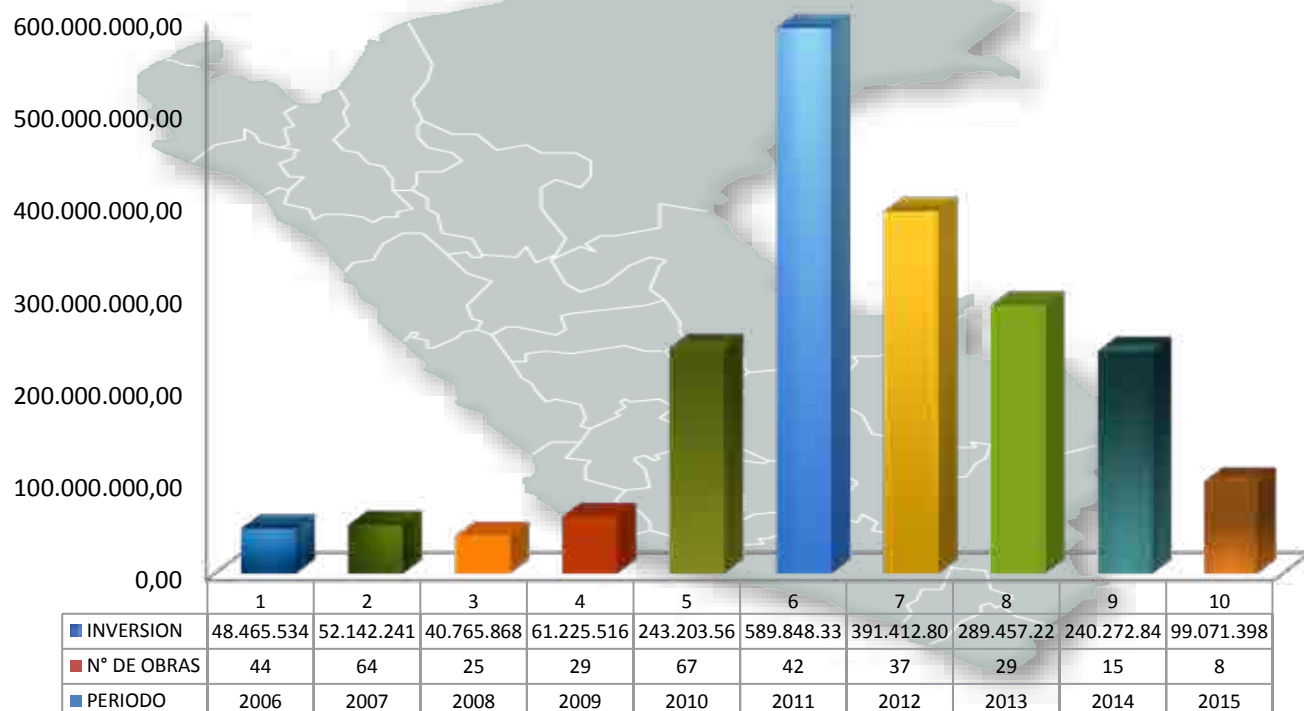

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión, así como importes generados por Obras Adicionales etc.
No incluye importes por equipamiento y/o mobiliario.





PERÚ

Ministerio de Educación

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Agosto 2015



RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	46	3	1	50
2	REGIONES	47	30	26	103
Totales :		93	33	27	153

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS A NIVEL NACIONAL

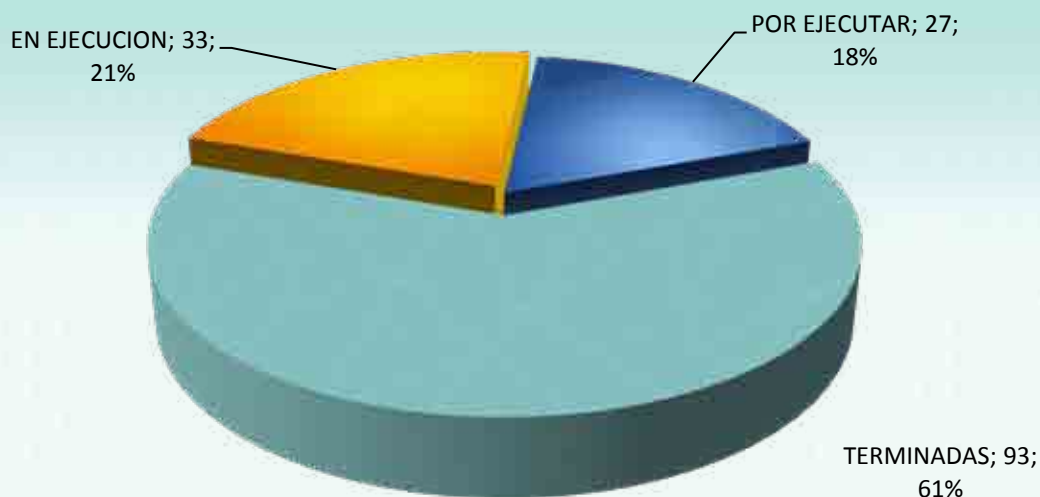

INDICE DE INTERVENCION DE OBRAS EMBLEMATICAS EN LIMA y REGIONES DEL PERU





PERÚ

Ministerio de Educación

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Agosto 2015




RESUMEN:


N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	46	3	1	50
2	REGIONES	47	30	26	103
Totales :		93	33	27	153

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
EN LIMA PROVINCIAS

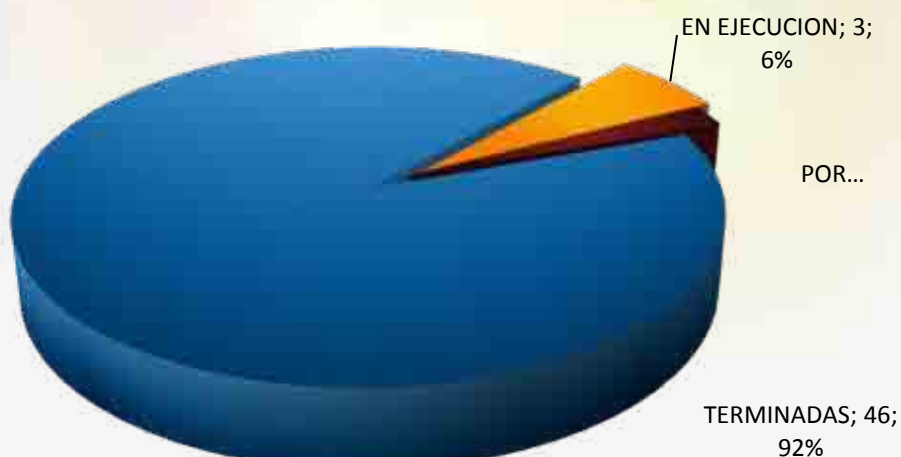

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
PROVINCIAS

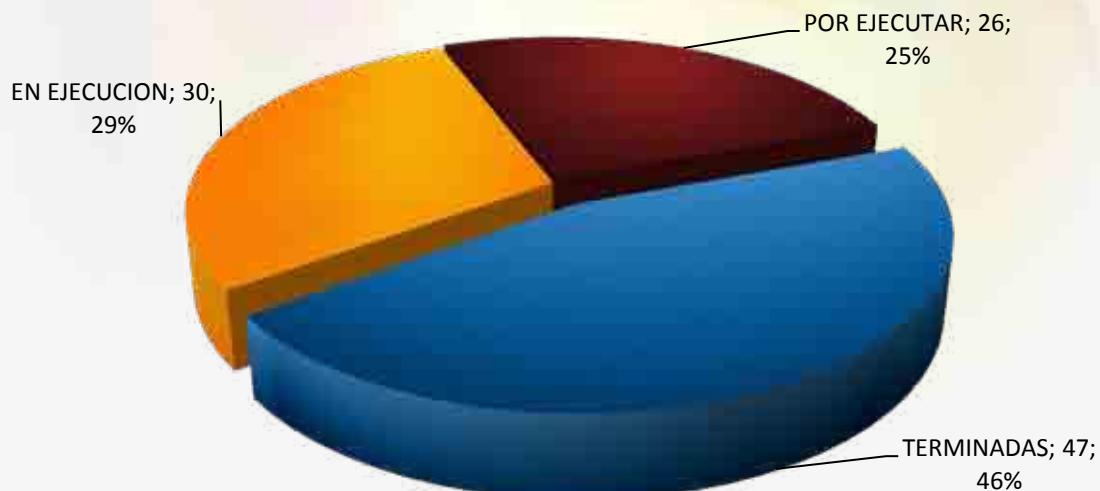




"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS TERMINADAS



Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242.850,10	90	100,00%	100,00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	35	100,00%	100,00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19.247.752,85	240	100,00%	100,00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10.984.825,12	240	100,00%	100,00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7.499.087,49	240	100,00%	100,00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14.698.756,22	270	100,00%	100,00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17.809.857,86	240	100,00%	100,00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST.	24.850.130,00	300	100,00%	100,00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44.922.369,46	288	100,00%	100,00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56.895.969,19	420	100,00%	100,00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	7.546.407,26	240	100,00%	100,00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12.552.231,68	240	100,00%	100,00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22.606.616,90	210	100,00%	100,00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18.733.216,84	300	100,00%	100,00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553.458,16	60	100,00%	100,00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8.498.883,99	180	100,00%	100,00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54.450.760,00	360	100,00%	100,00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7.725.531,18	240	100,00%	100,00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16.352.313,60	300	100,00%	100,00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28.760.197,28	360	100,00%	100,00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27.303.268,20	300	100,00%	100,00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20.567.329,08	300	100,00%	100,00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39.709.126,15	300	100,00%	100,00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10.819.997,45	270	100,00%	100,00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODRI	SAN NICOLAS	21.830.737,21	270	100,00%	100,00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5.192.205,06	180	100,00%	100,00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22.087.820,38	330	100,00%	100,00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5.803.114,30	180	100,00%	100,00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9.966.975,86	240	100,00%	100,00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15.001.252,09	150	100,00%	100,00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15.716.683,73	240	100,00%	100,00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2.762.375,59	120	100,00%	100,00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12.926.017,97	180	100,00%	100,00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109.160,87	45	100,00%	100,00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	270	100,00%	100,00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193.598,06	45	100,00%	100,00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS N	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	360	100,00%	100,00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2.546.695,38	120	100,00%	100,00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77.103,64	30	100,00%	100,00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	420	100,00%	100,00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196.003,67	45	100,00%	100,00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6.950.503,23	180	100,00%	100,00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14.730.418,50	240	100,00%	100,00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10.598.133,02	240	100,00%	100,00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13.274.564,17	270	100,00%	100,00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11.568.701,69	240	100,00%	100,00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10.386.423,92	210	100,00%	100,00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13.699.468,94	240	100,00%	100,00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7.669.799,25	180	100,00%	100,00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.540.886,61	270	100,00%	100,00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6.450.213,48	180	100,00%	100,00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16.102.546,53	270	100,00%	100,00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18.976.461,40	270	100,00%	100,00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13.767.910,99	240	100,00%	100,00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12.337.712,85	180	100,00%	100,00%	27/09/2011




"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS TERMINADAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5.955.773,30	45	100,00%	100,00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2.727.463,60	75	100,00%	100,00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3.775.993,03	90	100,00%	100,00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3.723.072,73	90	100,00%	100,00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8.121.877,69	120	100,00%	100,00%	21/01/2011
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14.489.268,00	300	100,00%	100,00%	20/02/2012
62	PESP	183	2011	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	BARRANCO	696.281,48	174	100,00%	100,00%	13/03/2013
63	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.224.843,00	240	100,00%	100,00%	21/09/2011
64	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29.943.516,23	270	100,00%	100,00%	13/02/2013
65	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14.955.474,15	240	100,00%	100,00%	25/08/2011
66	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920.031,48	30	100,00%	100,00%	28/10/2010
67	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2.677.215,75	150	100,00%	100,00%	03/10/2011
68	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26.519.751,67	300	100,00%	100,00%	01/04/2013
69	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28.750,88	20	100,00%	100,00%	24/11/2011
70	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3.569.179,06	90	100,00%	100,00%	17/05/2011
71	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19.932.413,36	300	100,00%	100,00%	23/04/2014
72	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33.382.049,92	360	100,00%	100,00%	02/04/2014
73	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6.785.340,79	120	100,00%	100,00%	29/12/2011
74	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8.206.571,31	270	100,00%	100,00%	10/10/2012
75	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26.740.032,38	360	100,00%	100,00%	04/09/2013
76	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17.676.984,47	270	100,00%	100,00%	07/01/2013
77	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979.595,01	90	100,00%	100,00%	09/01/2012
78	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5.695.943,21	150	100,00%	100,00%	04/05/2012
79	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6.094.843,57	150	100,00%	100,00%	09/08/2012
80	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4.013.808,33	90	100,00%	100,00%	08/11/2012
81	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1.969.105,31	120	100,00%	100,00%	21/03/2012
82	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1.079.857,24	45	100,00%	100,00%	11/04/2012
83	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4.884.836,81	240	100,00%	100,00%	11/02/2014
84	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3.757.857,00	120	100,00%	100,00%	06/11/2012
85	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHA	20.829.352,78	330	100,00%	100,00%	11/08/2014
86	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	330	100,00%	100,00%	19/12/2014
87	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	360	100,00%	100,00%	30/01/2015
88	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	360	100,00%	100,00%	06/02/2015
89	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	360	100,00%	100,00%	29/05/2015
90	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	360	100,00%	100,00%	03/07/2015
91	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	360	100,00%	100,00%	13/05/2015
92	ADP	50	2014	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	120	100,00%	100,00%	-
93	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	100,00%	100,00%	-



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS



OBRAS EN EJECUCION - INSTITUCIONES EMBLEMATICAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	17	2015	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDI	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	243.477,98	75	-	-	-
2	AMC	191	2014	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRAD	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	33,19%	33,79%	-
3	AMC	260	2015	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	84.621,33	30	-	-	-
4	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCIO	SANTA ANA	22.630.000,00	360	90,55%	83,62%	-
5	LP	35	2013	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE C	SANTIAGO DE CHU	27.806.000,00	360	100,00%	63,53%	-
6	LP	2	2014	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TF	34.686.021,42	380	30,17%	38,77%	-
7	LP	3	2014	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	34.244.713,01	380	49,41%	45,70%	-
8	LP	4	2014	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	93,04%	83,56%	-
9	LP	5	2014	IE TORBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	76,24%	32,98%	-
10	LP	7	2014	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	24,88%	27,71%	-
11	LP	12	2014	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	19.498.304,07	300	77,99%	37,91%	-
12	LP	13	2014	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	100,00%	79,22%	-
13	LP	14	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	21,02%	24,09%	-
14	LP	15	2014	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	67,20%	70,24%	-
15	LP	17	2014	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	69,53%	57,97%	-
16	LP	18	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	43,30%	42,18%	-
17	LP	19	2014	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	58,90%	47,77%	-
18	LP	20	2014	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	77,65%	47,03%	-
19	LP	21	2014	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYC	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	62,65%	64,87%	-
20	LP	27	2014	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	62,23%	55,74%	-
21	LP	28	2014	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	43,85%	20,05%	-
22	LP	30	2014	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACI	JUANJUI	13.718.000,00	330	31,32%	33,61%	-
23	LP	33	2014	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDC	LORETO	ALTO AMAZONA	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	29,32%	23,54%	-
24	LP	37	2014	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	95,15%	40,28%	-
25	LP	39	2014	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	24,77%	11,04%	-
26	LP	43	2014	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	18.528.862,34	360	15,15%	7,56%	-
27	LP	45	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	20,10%	16,32%	-
28	LP	46	2014	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	180	78,48%	73,70%	-
29	LP	48	2014	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	31.045.999,61	360	0,65%	0,66%	-
30	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	100,00%	94,67%	-
31	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	100,00%	93,12%	-
32	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	420	100,00%	91,86%	-
33	PESP	67	2012	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	300	100,00%	90,01%	-

- Observacion : Los % de Avances Fisicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la UGEO.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS EMBLEMATICAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Referencial	PLAZO Ejecución	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	ADS	87	2014	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	234.631,06	75	-	-	POR INICIAR
2	AMC	264	2015	IE 86019 LA LIBERTAD - MURO DE CONTENCIÓN	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	60.347,23	24	-	-	POR INICIAR
3	ADP	8	2015	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1.306.464,55	45	-	-	POR INICIAR
4	AMC	278	2013	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	202.746,26	65	-	-	POR INICIAR
5	-	-	-	DOS DE MAYO - CASETA DE SUB ESTACION ELECTRICA	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	111.562,98	30	-	-	-
6	LP	19	2015	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	15.270.604,62	270	-	-	-
7	LP	9	2015	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	21.498.797,95	360	-	-	-
8	-	-	-	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	26.207.700,60	360	-	-	-
9	LP	14	2015	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	32.011.807,81	360	-	-	-
10	LP	18	2015	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDON	23.562.157,05	360	-	-	-
11	LP	12	2015	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	34.799.693,40	390	-	-	-
12	-	-	-	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	21.916.418,23	360	-	-	-
13	LP	11	2015	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	PUERTO MALDONADO	22.961.307,11	360	-	-	-
14	-	-	-	IE JOSE ANTONIO ENCINAS MURO	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	21.335.530,16	360	-	-	-
15	-	-	-	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	33.291.741,85	360	-	-	-
16	-	-	-	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	8.772.641,64	180	-	-	-
17	LP	10	2015	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	11.538.403,94	240	-	-	-
18	-	-	-	IE MARIANO MELGAR	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	28.592.157,28	360	-	-	-
19	LP	17	2015	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	2.545.572,65	120	-	-	-
20	-	-	-	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1.622.598,85	120	-	-	-
21	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - MEDIA TENSION	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	605.237,01	75	-	-	-
22	LP	21	2015	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	18.585.385,23	330	-	-	-
23	LP	7	2015	IE SAN RAMON	JUNIN	TARMA	TARMA	35.071.599,44	390	-	-	-
24	-	-	-	IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA PISCINA	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	74.194,88	30	-	-	-
25	LP	20	2015	IE SANTO TOMAS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	19.643.243,33	360	-	-	-
26	LP	13	2015	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	22.583.814,36	360	-	-	-
27	-	-	-	SAN JUAN - SALDO DE OBRA - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	2.550.727,78	150	-	-	-

OBRAS EMBLEMATICAS

Panel Fotográfico - Obras en Ejecución

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



I.E. Gómez Arias Davila-Tingo María Huánuco - Obra en Ejecución



I.E. Leoncio Prado - Huánuco - Obra en Ejecución.



Rumbo a la nota más alta




ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES



6.2 NIVELAR

Sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén en posición horizontal. Por ejemplo: podemos nivelar la posición de un ladrillo en el sentido transversal del muro o podemos nivelar una hilada de ladrillos a lo largo de ésta. Para ello, debemos verificar que la burbuja de aire del nivel de mano se encuentre exactamente centrada dentro de la marca.


NIVEL DE MANO

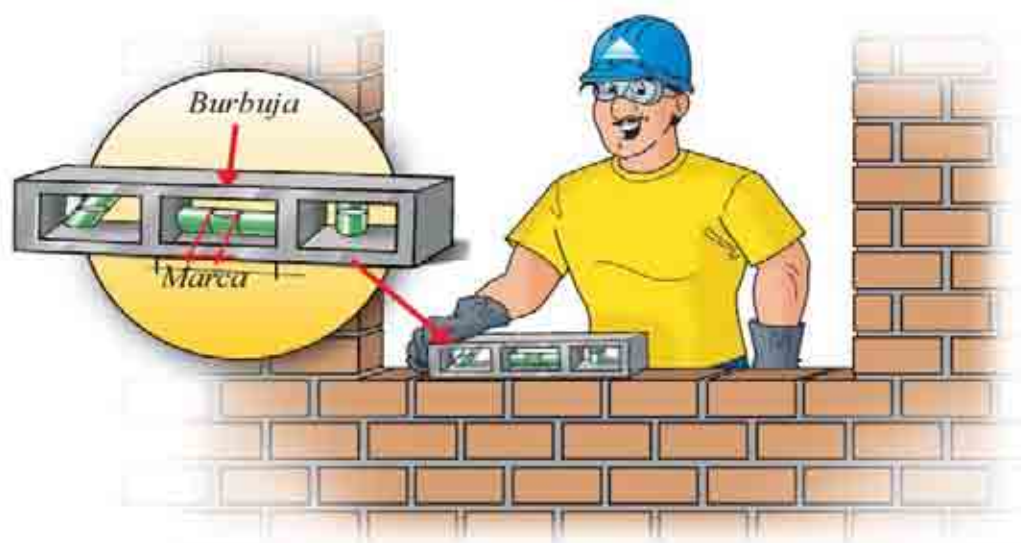

6.3 APLOMAR

Sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de elementos estén en posición vertical. Para esto, usamos una plomada. Por ejemplo, podemos aplomar un muro de ladrillos, la colocación de las tablas del encofrado, una columna terminada, etc.

MURO DE LADRILLOS VISTO DE COSTADO

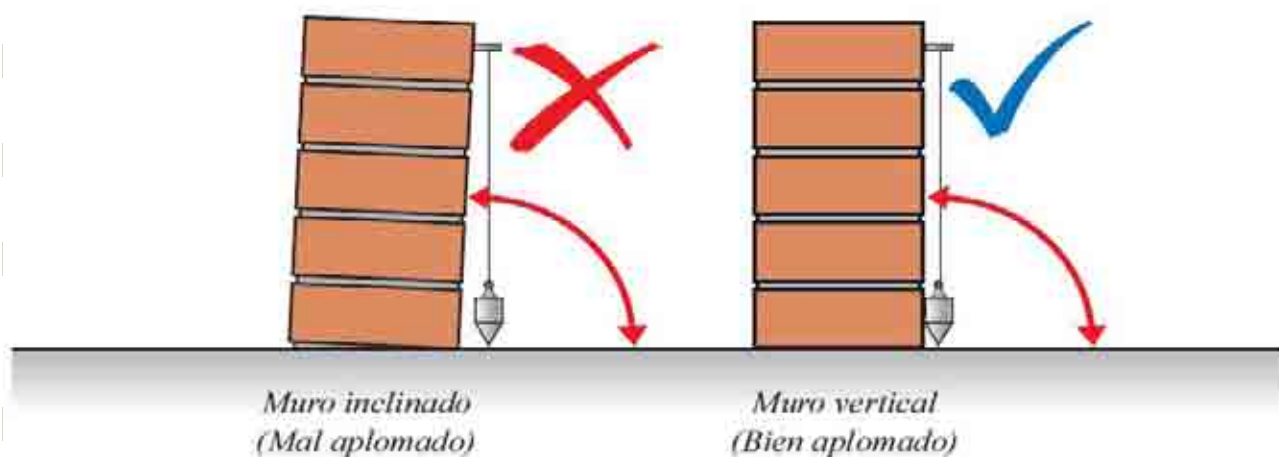

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónMinisterio
de EducaciónPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"




ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES

6.4 ALINEAR

Es una operación que consiste en colocar varios elementos en una misma dirección o en línea, para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo, podemos alinear una hilera de ladrillos, un grupo de paneles de encofrado, etc.

MURO DE LADRILLOS VISTO DESDE ARRIBA



6.5 DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO

Las dosificaciones de mezcla de concreto son las cantidades de cemento y de otros materiales que se necesitan para obtener las resistencias requeridas, de acuerdo al uso que se les va a dar.

A continuación, se presenta un resumen de dosificaciones empleadas para las diferentes partes de una casa.

		Cemento	Arena Gruesa	Piedra Chancada	Hormigón	Arena Fina	Piedra de Zanja	Piedra Cajón
CONCRETO SIMPLE	SOLADO	1 bolsa			4 buggies			
	FALSO PISO	1 bolsa			4 buggies			
CONCRETO CICLOPEO	ZANJA DE CIMENTACIÓN	1 bolsa			3 1/3 buggies		30%	
	SOBRECIMENTOS	1 bolsa			2 1/2 buggies			25%
CONCRETO ARMADO	COLUMNAS, MUROS DE CONTENCIÓN, TECHOS, VIGAS Y SOBRECIMIENTO ARMADO	1 bolsa	1 buggy	1 buggy				
MORTERO	ASENTADO DE LADRILLOS	1 bolsa	1 1/2 buggies					
	TARRAJEOS DE MUROS Y CIELORRASOS	1 bolsa				1 1/2 buggies		

* Buggy de 3 pies cúbicos = 3 bolsas de cemento

Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS

7.2.4 Encofrado de sobrecimientos

Luego de vaciar el concreto del cimiento, se realiza el encofrado del sobrecimiento.

En caso de que el suelo del terreno sea arenoso, generalmente los planos indican colocar un sobrecimiento armado para evitar rajaduras en los muros provocados por asentamientos. El refuerzo del sobrecimiento está conformado por cuatro fierros horizontales y *estribos* que deben quedar a una altura de 7 cm sobre el cimiento. Luego se procederá a encofrar (ver fig. A).




Durante la colocación del encofrado, debemos verificar que las tablas de madera se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas.

Por su cara externa, las tablas estarán unidas a través de *barrotes* separados cada 60cm. Esto asegurará la consistencia del encofrado (ver fig. B).

TEN EN CUENTA

Se debe verificar y/o sellar las uniones de las tablas, a fin de evitar la fuga del agua de la mezcla una vez colocada.

Fig. A

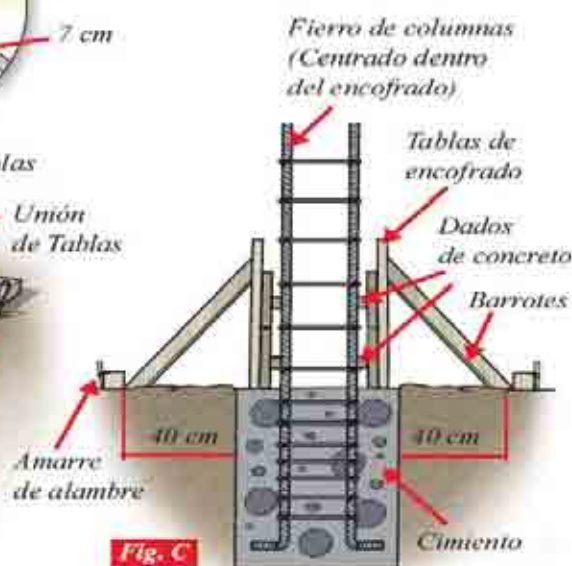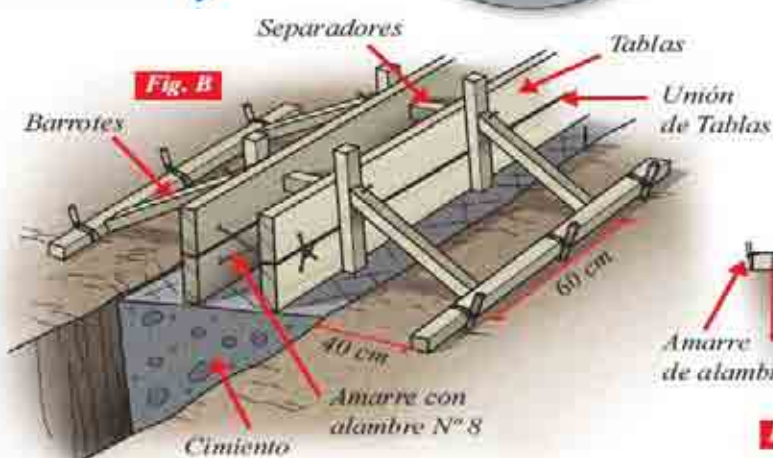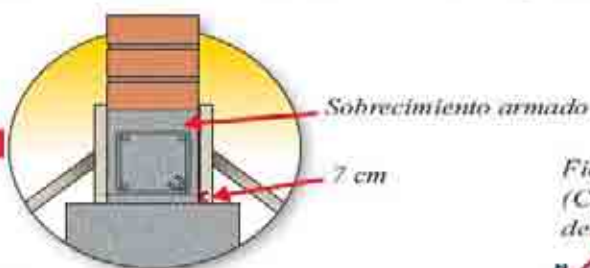

Por su cara interna, las tablas no deben presentar restos de concreto endurecido. Lo recomendable es que estén pintadas con petróleo, lo cual facilitará el posterior desencofrado.

Al momento de colocar las tablas, los fierros de las columnas (y del sobrecimiento, si lo hay) deben quedar exactamente al medio de la distancia entre ambas caras del encofrado, garantizando un adecuado recubrimiento de las barras de acero al momento de vaciar el concreto (ver fig. C). En otras palabras, los fierros de las columnas no deben estar pegados al encofrado.

Para conservar el ancho apropiado del encofrado, se utilizarán separadores de madera o de tubos de PVC, en la parte superior e inferior del encofrado (ver fig. B).

Luego, ambas caras del encofrado se fijan con alambre N°8, amarrando los *barrotes* de un lado a otro. La verticalidad se puede controlar con ayuda de una plomada.

Finalmente, ambas caras se apuntalarán contra el piso, con unos *barrotes* inclinados, para darle estabilidad al encofrado durante el vaciado de concreto.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Administración
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

*"Si Pensara cada paso que doy, no
llegaría nunca, donde quiero llegar".*



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS

**Trabajamos con responsabilidad y transparencia
por una educación de calidad**



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO,
CONTAMOS CONTIGO!



Rumbo a la nota más alta

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
