



Informe Mensual - Equipo de Ejecución de Obras

Noviembre 2015

Lima - Año 4 - Número 11 Noviembre, 2015 - Distribución por Email
Edición Mensual



f / BORIS ALVAREZ RODRIGUEZ @ PERSE01964 # INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

www.pronied.gob.pe

Rumbo a la nota más alta

OBRA EN EJECUCION : REHABILITACION Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE PACASMAYO Y DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC



Onceava Edición, Noviembre 2015
Diseño y Creación : Ans. Boris Alvarez Rodriguez
Fuente de Datos : Aplicativo SEEK-OBRAS
Equipo de Ejecucion de Obras - UGEO
Anexo : 25458



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS



Informe Mensual - Equipo de Ejecución de Obras

Noviembre 2015

Lima - Año 4 - Número 11 Noviembre, 2015 - Distribución por Email
Edición Mensual

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación



/BORIS ALVAREZ RODRIGUEZ



@

PERSE01964



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

www.pronied.gob.pe

CONTENIDO

- 01.- Obras en Ejecución Noviembre 2015**
- 02.- Procesos de Convocatoria**
- 03.- Obras Terminadas al mes de Noviembre 2015**
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú**
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.**
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión**
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2015 (Noviembre).**
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias**
- 09.- Términos y Definiciones.**
- 10.- Descripción Visual de Actividades realizadas en diversas Obras Civiles.**



Onceava Edición, Noviembre 2015
Diseño y Creación : Ans. Boris Alvarez Rodriguez
Fuente de Datos : Aplicativo SEEK-OBRA
Equipo de Ejecucion de Obras - UGEO
Anexo : 25458



PERÚ

Ministerio
de Educación



PERÚ PROGRESO
PARA TODOS



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	35
2	PROGRAMA REGULAR	6
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	2
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		43

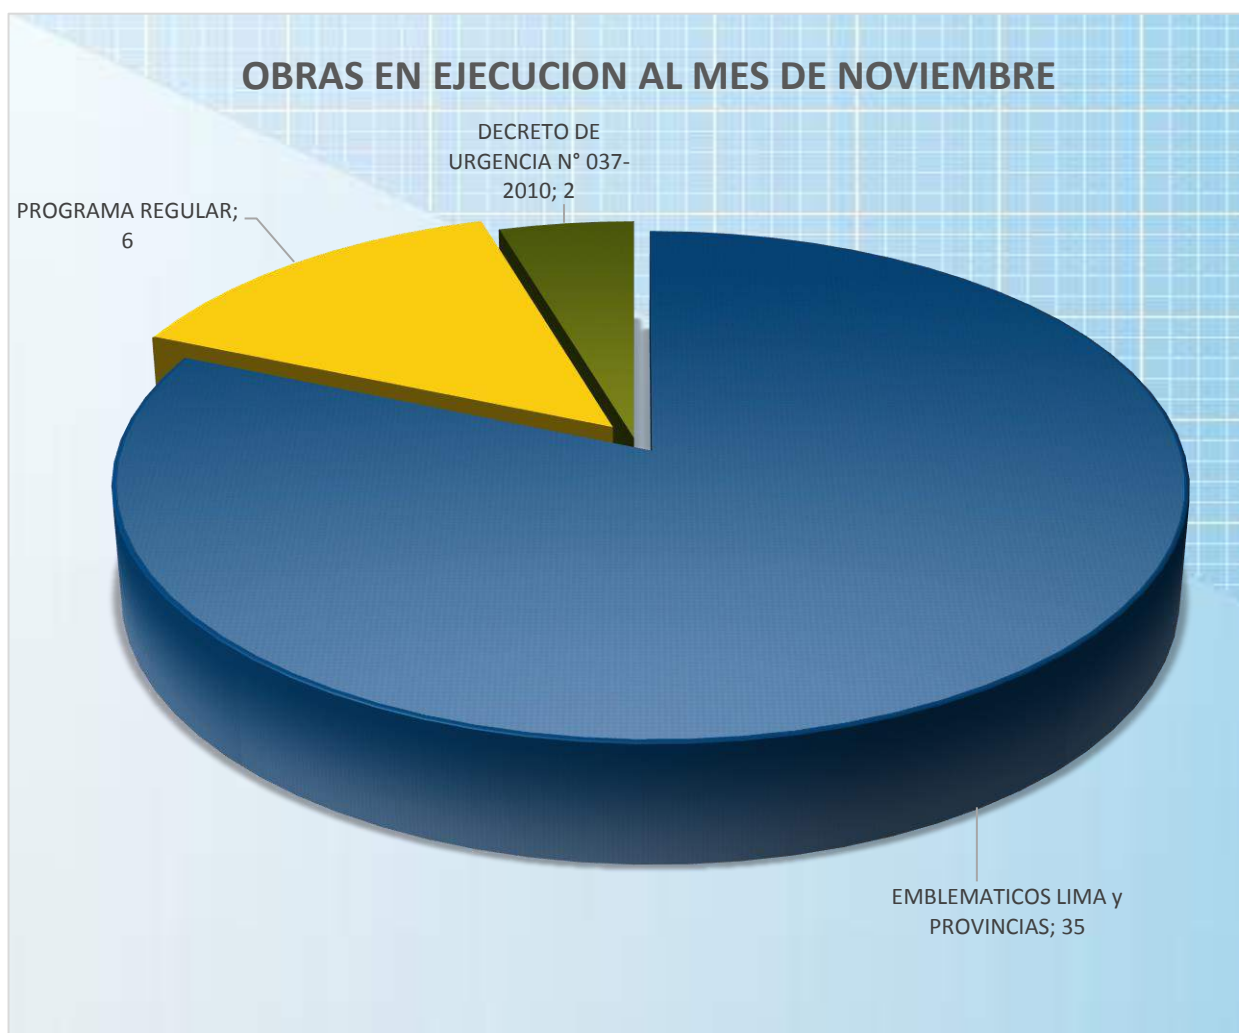

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**





Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION REPORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

(Los % de Avance Físico corresponden a la Valorización de obra del mes de Octubre)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito			Inicio	Fin + Amp.	

EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS

1	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1.175.818,10	62	10/09/2015	10/11/2015	22,95%
2	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	243.477,98	75	04/08/2015	17/10/2015	12,63%
3	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	24/01/2015	17/02/2016	65,07%
4	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL PORTIL	CALLERIA	211.167,96	75	21/11/2015	03/02/2016	-
5	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	805	18/09/2013	01/12/2015	77,31%
6	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	577	06/05/2014	03/12/2015	93,25%
7	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL	34.686.021,42	380	03/02/2015	17/02/2016	52,25%
8	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE F	34.244.713,01	380	16/12/2014	30/12/2015	74,24%
9	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	399	10/10/2014	12/11/2015	98,80%
10	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	464	15/10/2014	21/01/2016	51,46%
11	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	369	15/01/2015	18/01/2016	39,62%
12	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LI	19.498.304,07	389	27/11/2014	20/12/2015	56,34%
13	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	286	01/11/2014	13/08/2015	93,15%
14	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	408	04/12/2014	15/01/2016	37,81%
15	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	20/12/2014	14/12/2015	75,90%
16	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	14/01/2015	08/01/2016	60,92%
17	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCANELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	330	24/12/2014	18/11/2015	57,66%
18	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SIS	11.344.620,60	362	04/12/2014	30/11/2015	64,69%
19	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	26/11/2014	20/11/2015	83,88%
20	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	13/01/2015	08/11/2015	70,98%
21	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	21/01/2015	15/01/2016	37,35%
22	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACER	JUANJUI	13.718.000,00	330	23/03/2015	15/02/2016	66,94%
23	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	13.870.000,00	322	30/12/2014	16/11/2015	53,03%
24	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	338	22/12/2014	24/11/2015	45,41%
25	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	12/03/2015	05/03/2016	37,54%
26	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	18.528.862,34	360	17/03/2015	10/03/2016	16,27%
27	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	07/04/2015	31/03/2016	42,63%
28	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	31.045.999,61	360	21/07/2015	14/07/2016	8,68%
29	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	28.810.627,03	360	19/11/2015	12/11/2016	-
30	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	2.291.015,39	120	07/11/2015	05/03/2016	-
31	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDI	21.205.941,35	360	20/10/2015	13/10/2016	3,24%
32	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	13.743.544,16	270	04/11/2015	30/07/2016	-
33	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	16.726.846,71	330	28/11/2015	22/10/2016	-
34	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	7.895.377,48	180	26/11/2015	23/05/2016	-
35	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	772	22/01/2013	04/03/2015	94,43%

PROGRAMA REGULAR

1	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296.149,36	75	29/04/2015	12/07/2015	84,40%
2	IE CSMA 67 - II ETAPA	LA LIBERTAD	PACASMAYO	GUADALUPE	761.329,75	150	08/09/2015	04/02/2016	30,46%
3	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAS	CARHUAS	12.876.435,34	337	12/12/2014	13/11/2015	93,87%
4	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	11.490.218,47	300	27/11/2015	21/09/2016	-
5	IE 153	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	1.646.941,88	150	30/10/2015	27/03/2016	0,16%
6	IE 20188 - IEI 627	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE	6.752.723,25	210	05/11/2015	01/06/2016	-

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIR	3.137.673,94	343	23/12/2014	30/11/2015	51,54%
2	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	5.844.004,16	305	20/01/2015	20/11/2015	88,71%

(-) Las obras no registran avance físico por ser recién iniciadas.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	CON BUENA PRO y POR INICIAR EJECUCION	10
2	POR CONVOCAR y/o EN TRAMITE	4
TOTAL DE OBRAS EN PROCESO		14



**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE PROCESOS **EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR**

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Proceso con Buena Pro - Obras por Iniciar Ejecución :

1	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD - MURO DE CONTENCIÓN	ANCASH	037060	029-2015-UGEO	27/05/2015	60.347,23	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 11/09/2015 A CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOTO SAC - MONTO ADJUDICADO S/. 54,312.51
2	EMBLEMATICAS	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	033273	004-2015-UGEO	13/01/2015	11.538.403,94	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 15/09/2015 A CONSORCIO MATH CONSTRUYA (MATH CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SAC - TR CONSTRUYA SLU SUCURSAL EN EL PERÚ - MONTO ADJUDICADO S/. 10'384,563.55
3	PROGRAMA REGULAR	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	033269	046-2015-UGEO	19/08/2015	12.766.909,41	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 21/09/2015 A CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL (TERRAK SAC - TABLEROS Y PUENTES SA SUCURSAL PERÚ) - MONTO ADJUDICADO S/. 11'490,218.47.
4	EMBLEMATICAS	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	032381	032-2014-UGEO	11/06/2015	26.207.700,60	POR INICIAR : BUENA PRO :EI 27/10/2015 a Consorcio Ruesma - Bagua Grande (Construcciones Ruesma SA - Construcciones Ruesma Perú SAC) Monto Adjudicado S/. 21'741,286.54
5	EMBLEMATICAS	IE SANTO TOMAS	CUSCO	032524	031-2015-UGEO	28/05/2015	19.643.243,33	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 16/10/2015 A CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL - MONTO ADJUDICADO S/. 17'678,919.00
6	EMBLEMATICAS	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	031119	036-2015-UGEO	03/07/2015	33.291.741,85	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 26/10/2015 A CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL (CONSTRUCTORA URANIO - AGREGADOS Y EQUIPOS SAC - J.P.C. INGENIEROS SAC - CONTRATISTAS ATLAS EIRL) - MONTO ADJUDICADO S/. 25'392,006.50
7	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	033479	048-2015-UGEO	02/09/2015	34.212.121,79	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 12/10/2015 A CONSORCIO TERRASUR (TERRAK SAC - TABLEROS Y PUENTES SA) - MONTO ADJUDICADO S/. 29'570,000.00
8	EMBLEMATICAS	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	033475	007-2015-UGEO	30/01/2015	22.583.814,36	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 07/10/2015 A CONSORCIO EDUCATIVO AMAZONICO (MANFER S.R. LTDA - A&M CONTRATISTAS S.R. LTDA) - MONTO ADJUDICADO S/. 18'800,000.00
9	EMBLEMATICAS	IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA PISCINA	ICA	035878	054-2015-UGEO	05/10/2015	74.910,94	BUENA PRO OTORGADA EL 27/11/2015 A CH INGENIEROS SAC MONTO ADJUDICADO S/. 71,914.50
10	EMBLEMATICAS	IE GENARO HERRERA	LORETO	032383	035-2015-UGEO	03/07/2015	21.916.418,23	BUENA PRO OTORGADA EL 26/10/2015 A CONSORCIO AMAZONAS (CONRPORACIÓN DOBLE A SAC - BBC SERVICIOS DE INGENIERÍA SAC - GUACAMA EDIFICACIONES SAC) - MONTO ADJUDICADO S/. 17'997,465.48

02.- Procesos por Convocar :


1	EMBLEMATICAS	IE SAN RAMON	JUNIN	033272	045-2015-UGEO	17/08/2015	35.071.599,44	PROCESO DECLARADO NULO POR EL OSCE
2	EMBLEMATICAS	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	032382	017-2014-UGEO	12/12/2014	21.498.797,95	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
3	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA - SALDO DE OBRA	TACNA	044792	057-2015-UGEO	07/10/2015	24.227.287,45	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
4	EMBLEMATICAS	IE DANIEL HERNANDEZ - MEDIA TENSION 10 KV	HUANCAVELICA	042891	047-2015-UGEO	25/08/2015	272.883,94	INTEGRACION DE BASES.
14								

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Noviembre 2015

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	10
2	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	3
3	PROGRAMA REGULAR	2
TOTAL OBRAS TERMINADAS		15

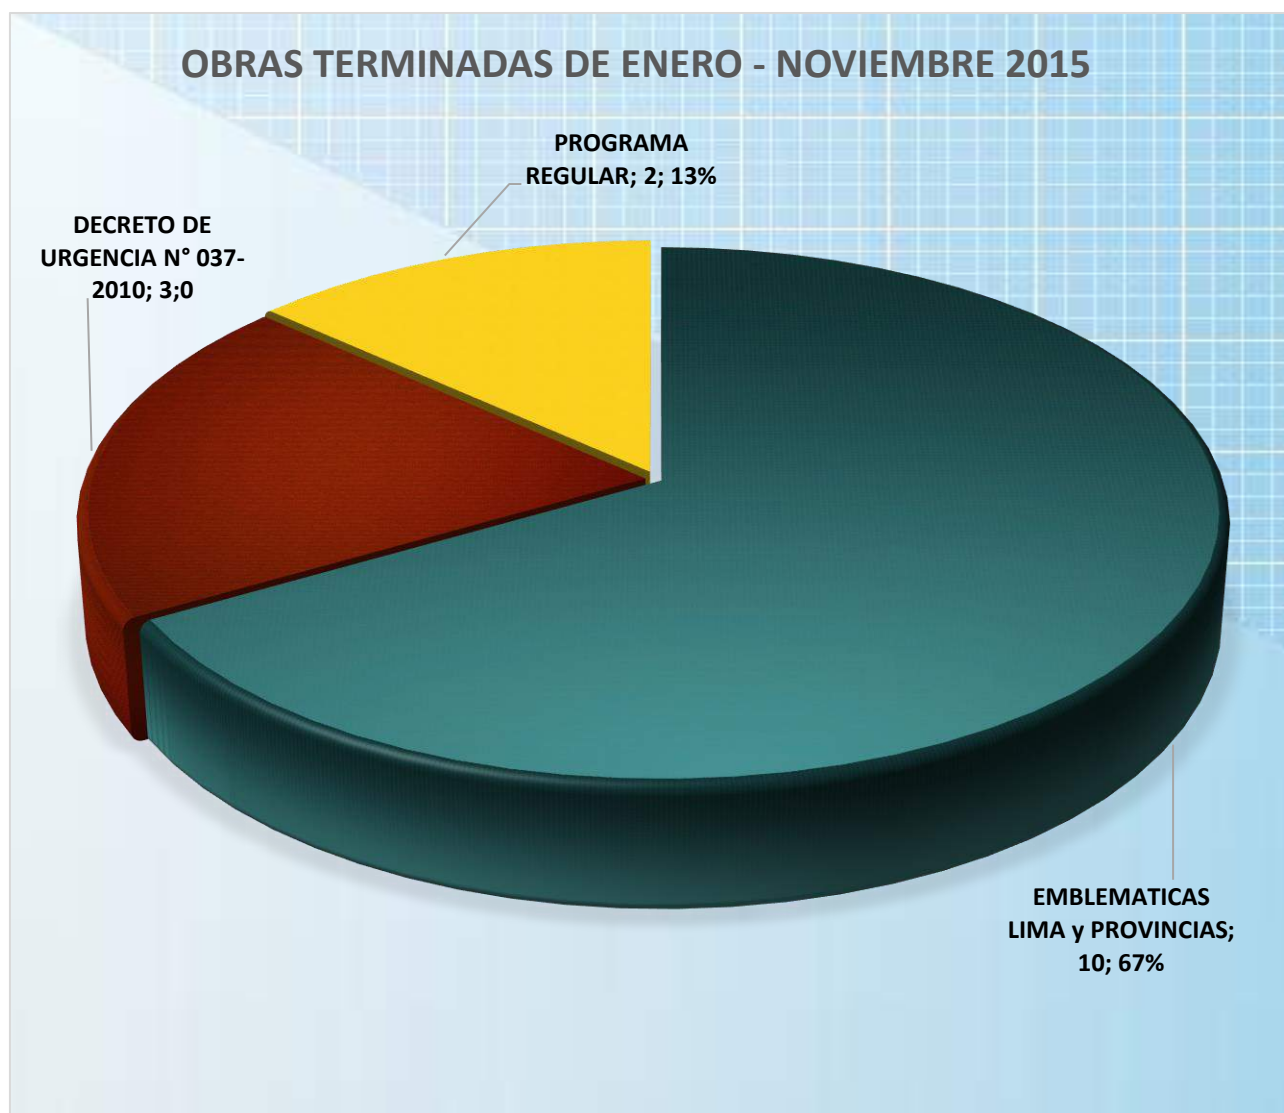

Nota : No estan consideradas las Obras que fueron Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1.104.233,95	31/07/2015
2	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5.586.133,51	06/08/2015
3	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	MORROPON	SALITRAL	3.188.113,74	(*)
4	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	08/09/2015
5	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	84.621,33	02/09/2015
6	EMBLEMATICAS	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	05/09/2015
7	EMBLEMATICAS	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	(*)
8	EMBLEMATICAS	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	(*)
9	EMBLEMATICAS	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	03/07/2015
10	EMBLEMATICAS	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	13/05/2015
11	EMBLEMATICAS	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	(*)
12	EMBLEMATICAS	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	182.471,64	(*)
13	EMBLEMATICAS	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	(*)
14	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	881.530,86	(*)
15	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1.786.247,42	30/04/2015

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	(1)
2	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	(2)
3	EMBLEMATICAS	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	(3)
4	EMBLEMATICAS	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	(4)
5	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2.850.259,95	(5)
6	EMBLEMATICAS	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	(6)
7	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	(7)
8	EMBLEMATICAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	410.758,92	(8)
9	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	2.247.766,20	(9)
10	EMBLEMATICAS	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	8.720.999,29	(10)
11	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5.896.843,66	(11)
12	EMBLEMATICAS	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	27.806.000,00	(12)
13	EMBLEMATICAS	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	(13)

(*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : CON OFICIO N°0046-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DE FECHA 30-12-2014, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

(02) CONTRATO DE OBRA RESUELTO - MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°0023-2015-MINEDU-PRONIED-OGA DEL 12-01-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA.

(03) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°053-2015-PRONIED-OGA DEL 16-02-2015, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA. (CON MEMORANDUM N°0604-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA 12-02-2015, SE SOLICITA A LA OGA, DECLARE RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA - EXP. 5431-2015.

(04) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1218-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 23-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, LA ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - EXP. 9722-2015.

(05) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1211-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 20-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR HECHOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - EXP. 10324-2015.

(06) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°0038-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL 21-01-2015 DIRIGIDO AL CONTRATISTA SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION . - EXP. N° 8692

(07) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1335-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 30-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES, COMO COMPLETAR EL PLANTEL DE LA RESIDENCIA Y EL PLAN DE TRABAJO, ADEMAS DE TENER UN AVANCE MENOR AL 80% - EXP. 11813-2015.

(08) CONTRATO RESUELTO : CON MEMORANDUM N°2895-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 08-07-2015, EL EQUIPO DE EJECUCION DE OBRA SOLICITA SE DECLARE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA - EXP. 26887-2015.

(09) CONTRATO RESUELTO - MEDIANTE MEMORANDUM N°3123-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE EL CONTRATISTA Y SE COMUNICA QUE LA CONSTATAcion FISICA SE REALIZARA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO 2015. - EXP. 24666-2015.

(10) CONTRATO RESUELTO - CON MEMORANDUM N°3305-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 04-08-2015, SE COMUNICA A LA OGA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE INFORMA QUE LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE BIENES SE REALIZARA LOS DIAS 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015. EXP. 29725-2015.

(11) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°0458-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL 10-09-2015 DIRIGIDO AL CONTRATISTA SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR PENALIDAD MAXIMA POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA . - EXP. N° 30815

(12) CONTRATO RESUELTO POR EL CONTRATISTA - LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO SE REALIZO EL 11 DE NOVIEMBRE 2015, EXP. 45725-2015.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Rumbo a la nota más alta

Se vienen ejecutando a la fecha

43

Obras de Infraestructura Educativa

Equipo de Ejecución de Obras



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE NOVIEMBRE 2015



Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	75,90%
2	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	93,87%
3	EMBLEMATICAS	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	-
4	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	94,43%
5	EMBLEMATICAS	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	39,62%
6	EMBLEMATICAS	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	70,98%
7	EMBLEMATICAS	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDON	3,24%
8	EMBLEMATICAS	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTE	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	22,95%
9	EMBLEMATICAS	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	98,80%
10	EMBLEMATICAS	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	51,46%
11	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	37,81%
12	EMBLEMATICAS	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	8,68%
13	EMBLEMATICAS	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	93,25%
14	EMBLEMATICAS	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	57,66%
15	EMBLEMATICAS	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	45,41%
16	EMBLEMATICAS	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	65,07%
17	EMBLEMATICAS	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VA	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	93,15%
18	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	60,92%
19	EMBLEMATICAS	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	83,88%
20	PROGRAMA REGULAR	IE CSMA 67 - II ETAPA	LA LIBERTAD	PACASMAYO	GUADALUPE	30,46%
21	EMBLEMATICAS	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLO	56,34%
22	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA T	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	12,63%
23	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	-
24	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	84,40%
25	EMBLEMATICAS	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	52,25%
26	EMBLEMATICAS	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	74,24%
27	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAF	51,54%
28	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	88,71%
29	EMBLEMATICAS	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	16,27%
30	PROGRAMA REGULAR	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	-
31	PROGRAMA REGULAR	IE 153	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	0,16%
32	PROGRAMA REGULAR	IE 20188 - IEI 627	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CA	-
33	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	-
34	EMBLEMATICAS	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	53,03%
35	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	42,63%
36	EMBLEMATICAS	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	-
37	EMBLEMATICAS	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	77,31%
38	EMBLEMATICAS	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	-
39	EMBLEMATICAS	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	64,69%
40	EMBLEMATICAS	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	37,35%
41	EMBLEMATICAS	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERE	JUANJUI	66,94%
42	EMBLEMATICAS	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	-
43	EMBLEMATICAS	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	37,54%

- Observación : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la UGEO.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	24		
		➡	24	60%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	19	40%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			43	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

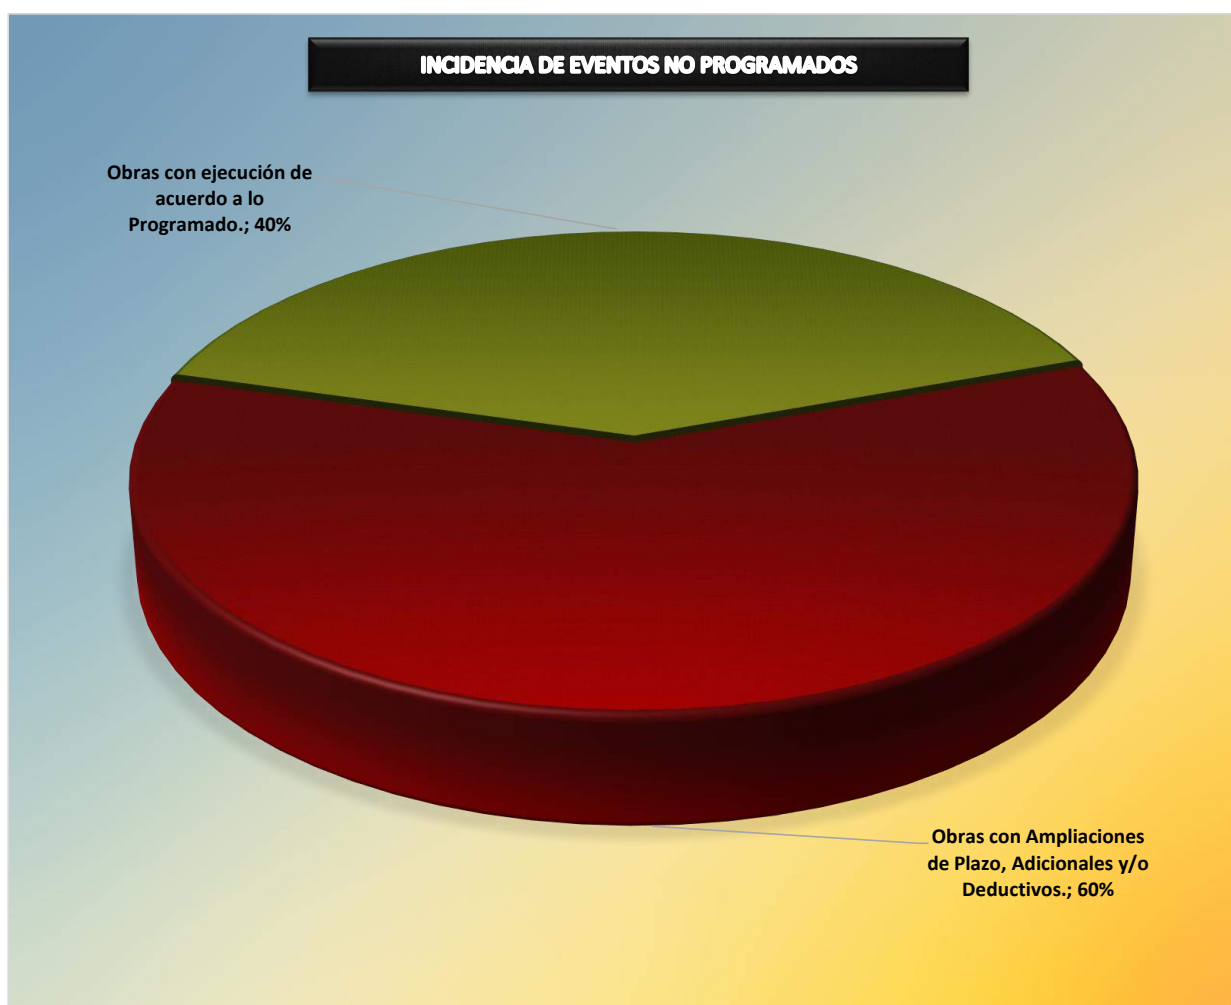

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra, pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolución de consultas, trámites de licencia de construcción, omisiones en el expediente técnico, y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Noviembre 2015)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - NOV	12	17	29 (*)
		12	17	29

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.

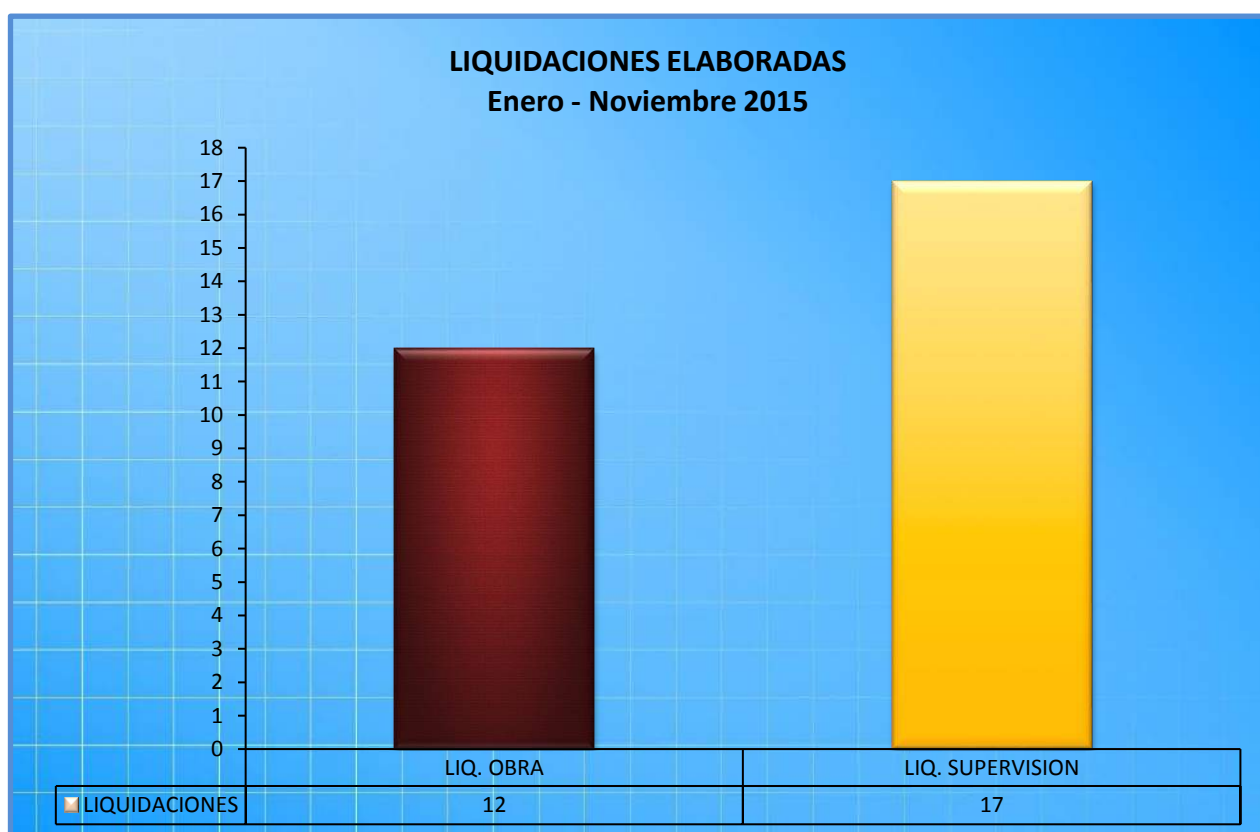

Equipo de Ejecución de Obras PRONIED



Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - NOVIEMBRE 2015)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	APURIMAC	3.441.687,51	RD-0022-2015-ED	22/01/2015	3.587.658,05
2	IE SANTA TERESITA	CONSORCIO SANTA TERESITA - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.	CAJAMARCA	25.890.382,85	RD-0128-2015-ED	30/04/2015	28.287.309,14
3	IE 9 DE DICIEMBRE	C&S GUTIERREZ S.R.L.	ICA	3.329.900,07	RD-0140-2015-ED	12/05/2015	3.705.416,98
4	IE SAN JOSE	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.- FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	JUNIN	22.606.616,90	RD-0146-2015-ED	15/05/2015	REFORMULACION
5	LOCAL MINISTERIO DE EDUCACION - I ETAPA - A	CONSORCIO SAN BORJA II - CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. - CONSTRUC. INDUSTRIALES PERUANOS S.A.	LIMA	28.770.497,46	RD-0157-2015-ED	25/05/2015	REFORMULACION
6	IE MIGUEL GRAU	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS.	LIMA	7.669.799,25	RD-0176-2015-ED	08/06/2015	REFORMULACION
7	IE 22424	CONSORCIO PALPA - 3G CONSTRUCTORA SAC - VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ICA	2.381.260,63	RD-0178-2015-ED	09/06/2015	2.489.141,20
8	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DORADO S.A.C.	MADRE DE DIOS	116.708,99	RD-0191-2015-ED	17/06/2015	119.447,74
9	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	CONSORCIO ALFA - A.S.A. ASOCIADOS S.A. - SJT INMOBILIARIA S.A.C.	ICA	1.786.247,42	RD-0241-2015-ED	31/07/2015	1.822.394,24
10	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	ICA	397.704,05	RD-0282-2015-ED	04/09/2015	413.932,37
11	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	CONSORCIO SANCHEZ CARRION - HOUSE BUSSINES EIRL - CORPORACION CONSTRUCTORA TERCER MILENIO SAC.	LA LIBERTAD	32.532.033,80	RD-0296-2015-ED	10/07/2015	32.369.311,78
12	IE PEDRO A. LABARTHE	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	LIMA	16.102.546,53	RD-0378-2015-ED	04/11/2015	9.692.578,25
02.- SUPERVISION							
1	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - OIST S.A.	AREQUIPA	1.760.437,89	RD-0035-2015-ED	03/02/2015	1.643.655,36
2	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H GRANT INGENIEROS S.A.C. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1.349.037,36	RD-0136-2015-ED	07/05/2015	1.340.403,52
3	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H GRANT INGENIEROS S.A.C. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1.349.037,36	RD-0152-2015-ED	18/05/2015	REFORMULACION
4	IE 22424	CONSORCIO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ	ICA	221.033,22	RD-0169-2015-ED	04/06/2015	239.261,00
5	IE 20191 ALFONSO UGARTE	HECTOR KENEDI ZAVALETA DOMINGUEZ	LIMA	72.336,00	RD-0186-2015-ED	12/06/2015	72.336,00
6	IE 22424	CONSORCIO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ	ICA	221.033,22	RD-0196-2015-ED	23/06/2015	REFORMULACION
7	IE SANTA TERESITA	VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC	CAJAMARCA	1.282.605,72	RD-0221-2015-ED	15/07/2015	1.486.577,13
8	INCA GARCILASO DE LA VEGA	PROJECT CONSULTING S.A.	CUSCO	1.232.200,37	RD-0229-2015-ED	20/07/2015	1.121.168,23
9	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE - MENDI	LAMBAYEQUE	507.013,12	RD-0230-2015-ED	20/07/2015	454.662,08
10	IE JUAN MANUEL ITURREGUI	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.	LAMBAYEQUE	1.015.478,98	RD-0278-2015-ED	02/09/2015	947.936,92
11	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - AGOBIRICH INGENIEROS SAC - INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS SA	PUNO	1.356.700,57	RD-0284-2015-ED	07/09/2015	1.573.417,32
12	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA - OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	TACNA	1.828.085,42	RD-0319-2015-ED	28/09/2015	1.430.965,87
13	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	CONSORCIO REPUBLICA ARGENTINA - DICTEL PERU SAC - GYPO INGENIERIA Y URBANISMO SUCURSAL DEL PERU	ANCASH	1.320.481,36	RD-0320-2015-ED	28/09/2015	789.952,51
14	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	CONSORCIO SUPERVISOR ACUARIO - ESTELA PALOMINO RUIZ - REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ	LA LIBERTAD	433.262,02	RD-0326-2015-ED	01/10/2015	378.526,81
15	IE MERCEDES INDACOCHEA	CONSORCIO LIMA - BLOQUE CONSULTORIAS & PROYECTOS SAC - VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. - JSU INGENIEROS SAC	LIMA	1.185.000,00	RD-0363-2015-ED	28/10/2015	1.071.861,51
16	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	CONSTRUCTORA ANIR E.I.R.L.	LIMA	100.207,12	RD-0348-2015-ED	15/10/2015	110.164,87
17	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	PABLO ISIDORO FELIX LOZA	ICA	144.114,47	RD-0400-2015-ED	17/11/2015	124.861,71

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2015


Resumen :

	PERIODO	OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01.-	PERIODO - 2006	44	48.465.534,33
02.-	PERIODO - 2007	64	52.142.241,97
03.-	PERIODO - 2008	25	40.765.868,98
04.-	PERIODO - 2009	29	61.225.516,19
05.-	PERIODO - 2010	67	243.203.569,79
06.-	PERIODO - 2011	42	589.848.336,93
07.-	PERIODO - 2012	37	391.412.804,36
08.-	PERIODO - 2013	29	289.457.225,51
09.-	PERIODO - 2014	15	240.272.849,48
10.-	PERIODO - 2015 (Noviembre)	15	198.880.490,85
Total Obras e Inversión Estimada		367	2.155.674.438,39

(*) No Estan consideradas las Obras Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras - UGEO

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

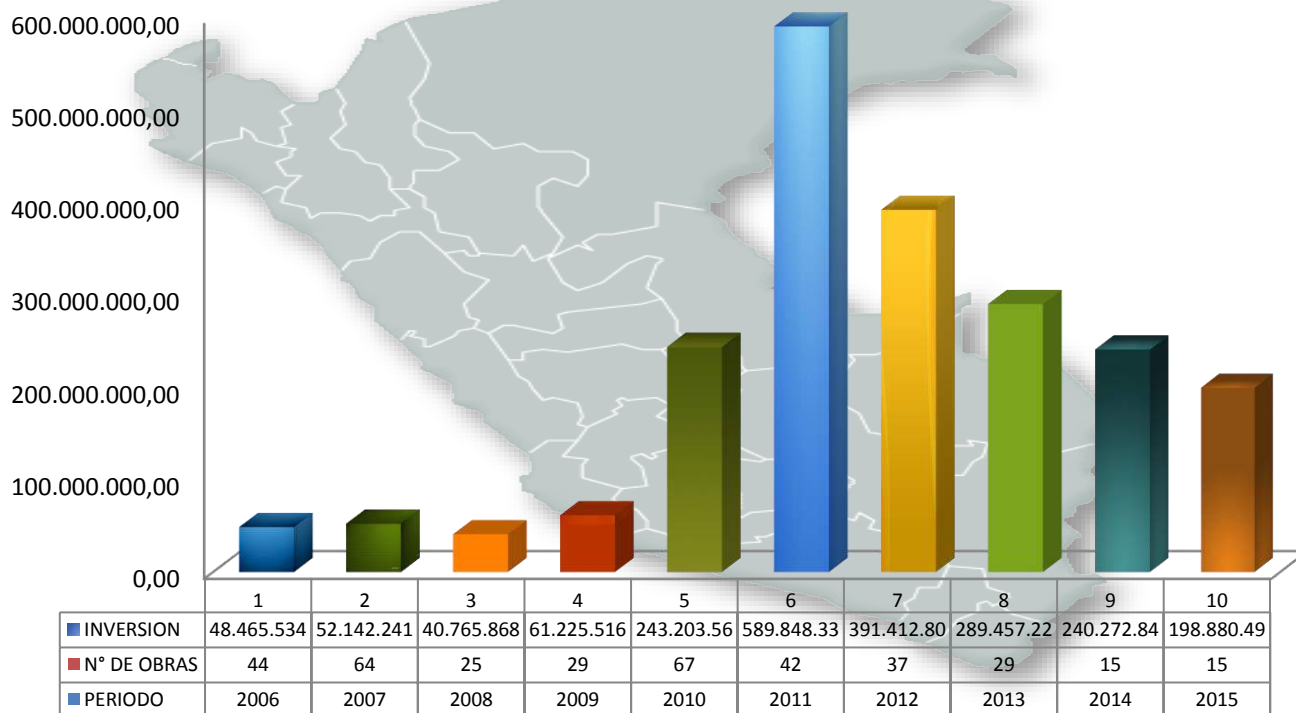

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión, así como importes generados por Obras Adicionales etc.
No incluye importes por equipamiento y/o mobiliario.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS




Lima y Regiones al Mes de Noviembre 2015

RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	46	4	0	50
2	REGIONES	53	31	14	98
Totales :		99	35	14	148

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS A NIVEL NACIONAL

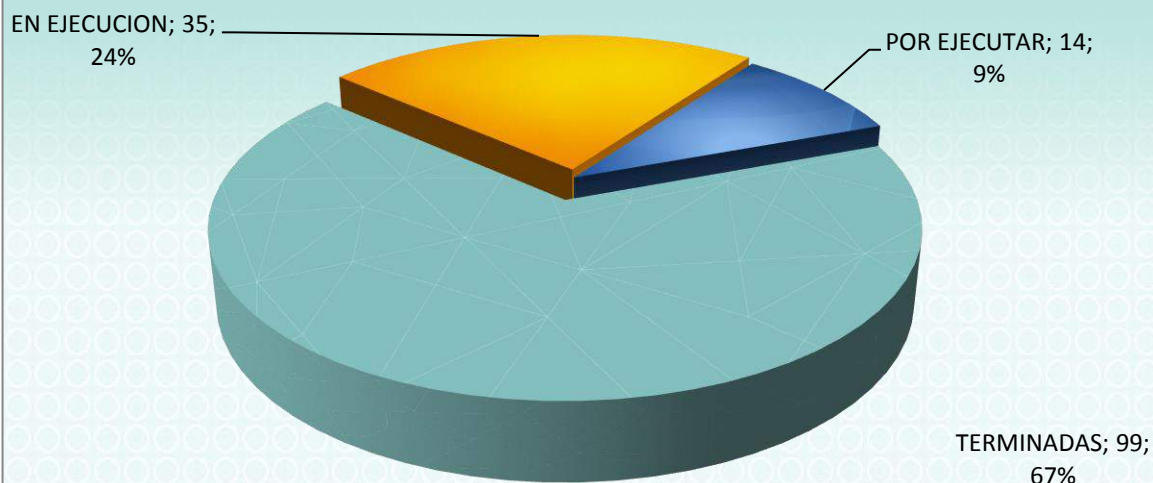

INDICE DE INTERVENCION DE OBRAS EMBLEMATICAS EN LIMA y REGIONES DEL PERU



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Noviembre 2015




RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	46	4	0	50
2	REGIONES	53	31	14	98
Totales :		99	35	14	148

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
EN LIMA PROVINCIAS**

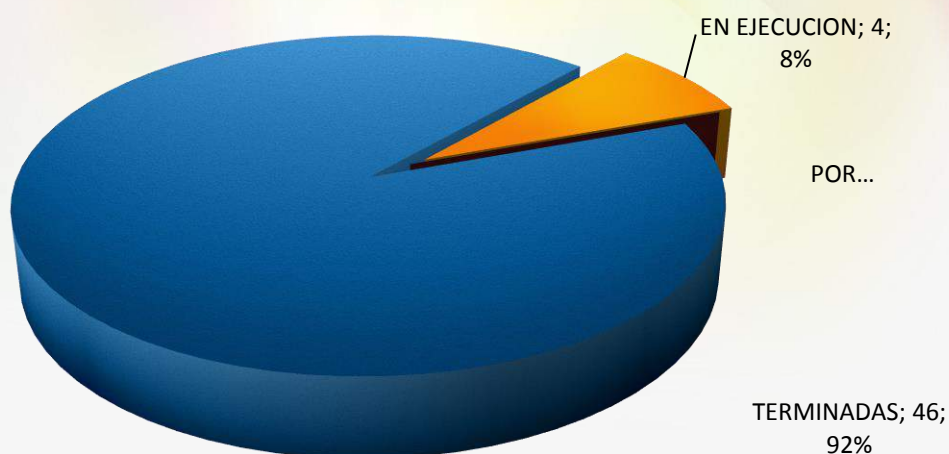

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
PROVINCIAS**

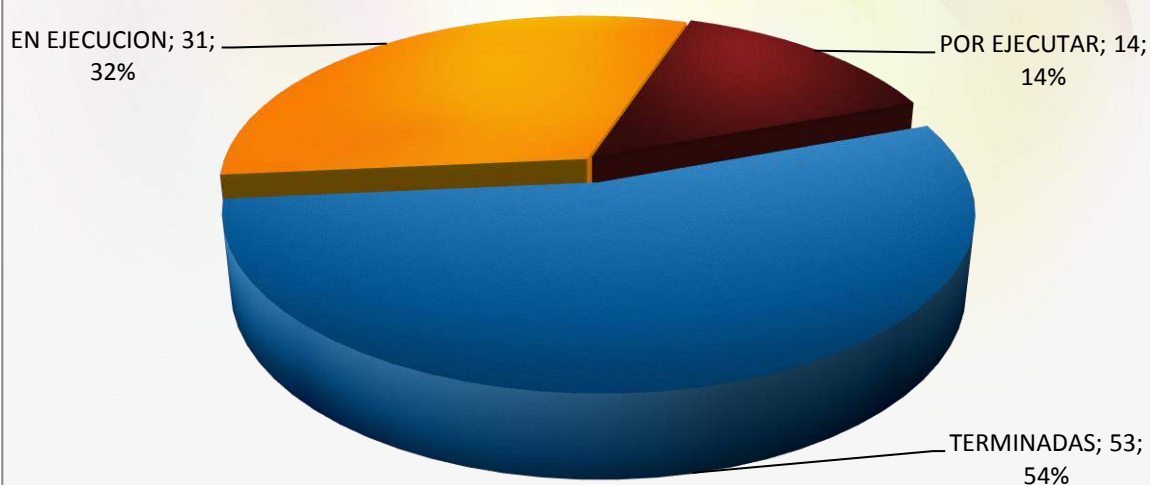

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS TERMINADAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242.850,10	90	100,00%	100,00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	35	100,00%	100,00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19.247.752,85	240	100,00%	100,00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10.984.825,12	240	100,00%	100,00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7.499.087,49	240	100,00%	100,00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14.698.756,22	270	100,00%	100,00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17.809.857,86	240	100,00%	100,00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST.	24.850.130,00	300	100,00%	100,00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44.922.369,46	288	100,00%	100,00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56.895.969,19	420	100,00%	100,00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	7.546.407,26	240	100,00%	100,00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12.552.231,68	240	100,00%	100,00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22.606.616,90	210	100,00%	100,00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18.733.216,84	300	100,00%	100,00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553.458,16	60	100,00%	100,00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8.498.883,99	180	100,00%	100,00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54.450.760,00	360	100,00%	100,00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7.725.531,18	240	100,00%	100,00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16.352.313,60	300	100,00%	100,00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28.760.197,28	360	100,00%	100,00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27.303.268,20	300	100,00%	100,00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20.567.329,08	300	100,00%	100,00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39.709.126,15	300	100,00%	100,00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10.819.997,45	270	100,00%	100,00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODRI	SAN NICOLAS	21.830.737,21	270	100,00%	100,00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5.192.205,06	180	100,00%	100,00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22.087.820,38	330	100,00%	100,00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5.803.114,30	180	100,00%	100,00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9.966.975,86	240	100,00%	100,00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15.001.252,09	150	100,00%	100,00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15.716.683,73	240	100,00%	100,00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2.762.375,59	120	100,00%	100,00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12.926.017,97	180	100,00%	100,00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109.160,87	45	100,00%	100,00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	270	100,00%	100,00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193.598,06	45	100,00%	100,00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS N	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	360	100,00%	100,00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2.546.695,38	120	100,00%	100,00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77.103,64	30	100,00%	100,00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	420	100,00%	100,00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196.003,67	45	100,00%	100,00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6.950.503,23	180	100,00%	100,00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14.730.418,50	240	100,00%	100,00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10.598.133,02	240	100,00%	100,00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13.274.564,17	270	100,00%	100,00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11.568.701,69	240	100,00%	100,00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10.386.423,92	210	100,00%	100,00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13.699.468,94	240	100,00%	100,00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7.669.799,25	180	100,00%	100,00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.540.886,61	270	100,00%	100,00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6.450.213,48	180	100,00%	100,00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16.102.546,53	270	100,00%	100,00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18.976.461,40	270	100,00%	100,00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13.767.910,99	240	100,00%	100,00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12.337.712,85	180	100,00%	100,00%	27/09/2011

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5.955.773,30	45	100,00%	100,00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2.727.463,60	75	100,00%	100,00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3.775.993,03	90	100,00%	100,00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3.723.072,73	90	100,00%	100,00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8.121.877,69	120	100,00%	100,00%	21/01/2011
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14.489.268,00	300	100,00%	100,00%	20/02/2012
62	PESP	183	2011	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	BARRANCO	696.281,48	174	100,00%	100,00%	13/03/2013
63	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.224.843,00	240	100,00%	100,00%	21/09/2011
64	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29.943.516,23	270	100,00%	100,00%	13/02/2013
65	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14.955.474,15	240	100,00%	100,00%	25/08/2011
66	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920.031,48	30	100,00%	100,00%	28/10/2010
67	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2.677.215,75	150	100,00%	100,00%	03/10/2011
68	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26.519.751,67	300	100,00%	100,00%	01/04/2013
69	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28.750,88	20	100,00%	100,00%	24/11/2011
70	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3.569.179,06	90	100,00%	100,00%	17/05/2011
71	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19.932.413,36	300	100,00%	100,00%	23/04/2014
72	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33.382.049,92	360	100,00%	100,00%	02/04/2014
73	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6.785.340,79	120	100,00%	100,00%	29/12/2011
74	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8.206.571,31	270	100,00%	100,00%	10/10/2012
75	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26.740.032,38	360	100,00%	100,00%	04/09/2013
76	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17.676.984,47	270	100,00%	100,00%	07/01/2013
77	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979.595,01	90	100,00%	100,00%	09/01/2012
78	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5.695.943,21	150	100,00%	100,00%	04/05/2012
79	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6.094.843,57	150	100,00%	100,00%	09/08/2012
80	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4.013.808,33	90	100,00%	100,00%	08/11/2012
81	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1.969.105,31	120	100,00%	100,00%	21/03/2012
82	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1.079.857,24	45	100,00%	100,00%	11/04/2012
83	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4.884.836,81	240	100,00%	100,00%	11/02/2014
84	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3.757.857,00	120	100,00%	100,00%	06/11/2012
85	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHA	20.829.352,78	330	100,00%	100,00%	11/08/2014
86	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	330	100,00%	100,00%	19/12/2014
87	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	360	100,00%	100,00%	30/01/2015
88	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	360	100,00%	100,00%	06/02/2015
89	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	360	100,00%	100,00%	29/05/2015
90	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	360	100,00%	100,00%	03/07/2015
91	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	360	100,00%	100,00%	13/05/2015
92	ADP	50	2014	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	120	100,00%	100,00%	08/09/2015
93	AMC	260	2015	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	84.621,33	30	100,00%	100,00%	02/09/2015
94	LP	46	2014	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	180	100,00%	100,00%	-
95	LP	15	2014	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	100,00%	100,00%	-
96	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	100,00%	100,00%	-
97	ADS	21	2015	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	182.471,64	65	100,00%	100,00%	-
98	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	595	100,00%	100,00%	-
99	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	100,00%	100,00%	05/09/2015



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS EN EJECUCION - INSTITUCIONES EMBLEMATICAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADP	8	2015	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1.175.818,10	62	100,00%	22,95%	-
2	ADS	17	2015	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	243.477,98	75	100,00%	12,63%	-
3	AMC	191	2014	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRAD	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	68,61%	65,07%	-
4	AMC	274	2015	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	211.167,96	75	-	-	-
5	LP	1	2013	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	805	100,00%	77,31%	-
6	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCIO	SANTA ANA	22.630.000,00	577	91,77%	93,25%	-
7	LP	2	2014	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	34.686.021,42	380	58,14%	52,25%	-
8	LP	3	2014	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	34.244.713,01	380	80,95%	74,24%	-
9	LP	4	2014	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	399	100,00%	98,80%	-
10	LP	5	2014	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	464	100,00%	51,46%	-
11	LP	7	2014	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	369	53,92%	39,62%	-
12	LP	12	2014	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	19.498.304,07	389	100,00%	56,34%	-
13	LP	13	2014	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	286	100,00%	93,15%	-
14	LP	14	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	408	55,63%	37,81%	-
15	LP	17	2014	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	88,74%	75,90%	-
16	LP	18	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	85,26%	60,92%	-
17	LP	19	2014	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCANELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	330	95,00%	57,66%	-
18	LP	20	2014	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	362	100,00%	64,69%	-
19	LP	21	2014	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYC	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	93,11%	83,88%	-
20	LP	27	2014	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	97,87%	70,98%	-
21	LP	28	2014	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	80,01%	37,35%	-
22	LP	30	2014	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CAC	JUANJUI	13.718.000,00	330	83,49%	66,94%	-
23	LP	33	2014	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZON	YURIMAGUAS	13.870.000,00	322	90,09%	53,03%	-
24	LP	37	2014	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	338	100,00%	45,41%	-
25	LP	39	2014	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	63,93%	37,54%	-
26	LP	43	2014	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	18.528.862,34	360	47,61%	16,27%	-
27	LP	45	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	52,89%	42,63%	-
28	LP	48	2014	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	31.045.999,61	360	13,73%	8,68%	-
29	LP	14	2015	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	28.810.627,03	360	-	-	-
30	LP	17	2015	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	2.291.015,39	120	-	-	-
31	LP	18	2015	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLEND	21.205.941,35	360	0,47%	3,24%	-
32	LP	19	2015	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	13.743.544,16	270	-	-	-
33	LP	21	2015	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	16.726.846,71	330	-	-	-
34	LP	30	2015	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	7.895.377,48	180	-	-	-
35	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	772	100,00%	94,43%	-

- Observacion : Los % de Avances Fisicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la UGEO.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS
OBRAS EMBLEMATICAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Referencial	PLAZO Ejecución	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	LP	13	2015	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	22.583.814,36	360	-	-	POR INICIAR
2	AMC	264	2015	IE 86019 LA LIBERTAD - MURO DE CONTENCION	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	54.312,51	24	-	-	POR INICIAR
3	LP	10	2015	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	10.384.563,55	240	-	-	POR INICIAR
4	LP	11	2015	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	PUERTO MALDONADO	20.349.000,00	360	-	-	POR INICIAR
5	LP	20	2015	IE SANTO TOMAS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	19.643.243,33	360	-	-	POR INICIAR
6	LP	28	2015	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	26.207.700,60	360	-	-	POR INICIAR
7	LP	24	2015	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	33.291.741,85	360	-	-	POR INICIAR
8	LP	12	2015	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	34.212.121,79	390	-	-	POR INICIAR
9	LP	9	2015	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	21.498.797,95	360	-	-	EN PROCESO
10	LP	7	2015	IE SAN RAMON	JUNIN	TARMA	TARMA	35.071.599,44	390	-	-	EN PROCESO
11	LP	26	2015	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	21.916.418,23	360	-	-	EN PROCESO
12	AMC	321	2015	IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA PISCINA	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	74.910,94	30	-	-	EN PROCESO
13	LP	37	2015	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA - SALDO DE OBRA	TACNA	TACNA	TACNA	24.227.287,45	300	-	-	EN PROCESO
14	ADS	51	2015	IE DANIEL HERNANDEZ - MEDIA TENSION 10 KV	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	272.883,94	75	-	-	EN PROCESO

OBRAS EMBLEMATICAS

Panel Fotográfico - Obras en Ejecución

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ ANDRÉS RÁZURI"
San Pedro de Lloc – Pacasmayo – La Libertad



REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Cajamarca - Cutervo - Cutervo




Rumbo a la nota más alta



ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES



7.6.3 Encofrado de columnas

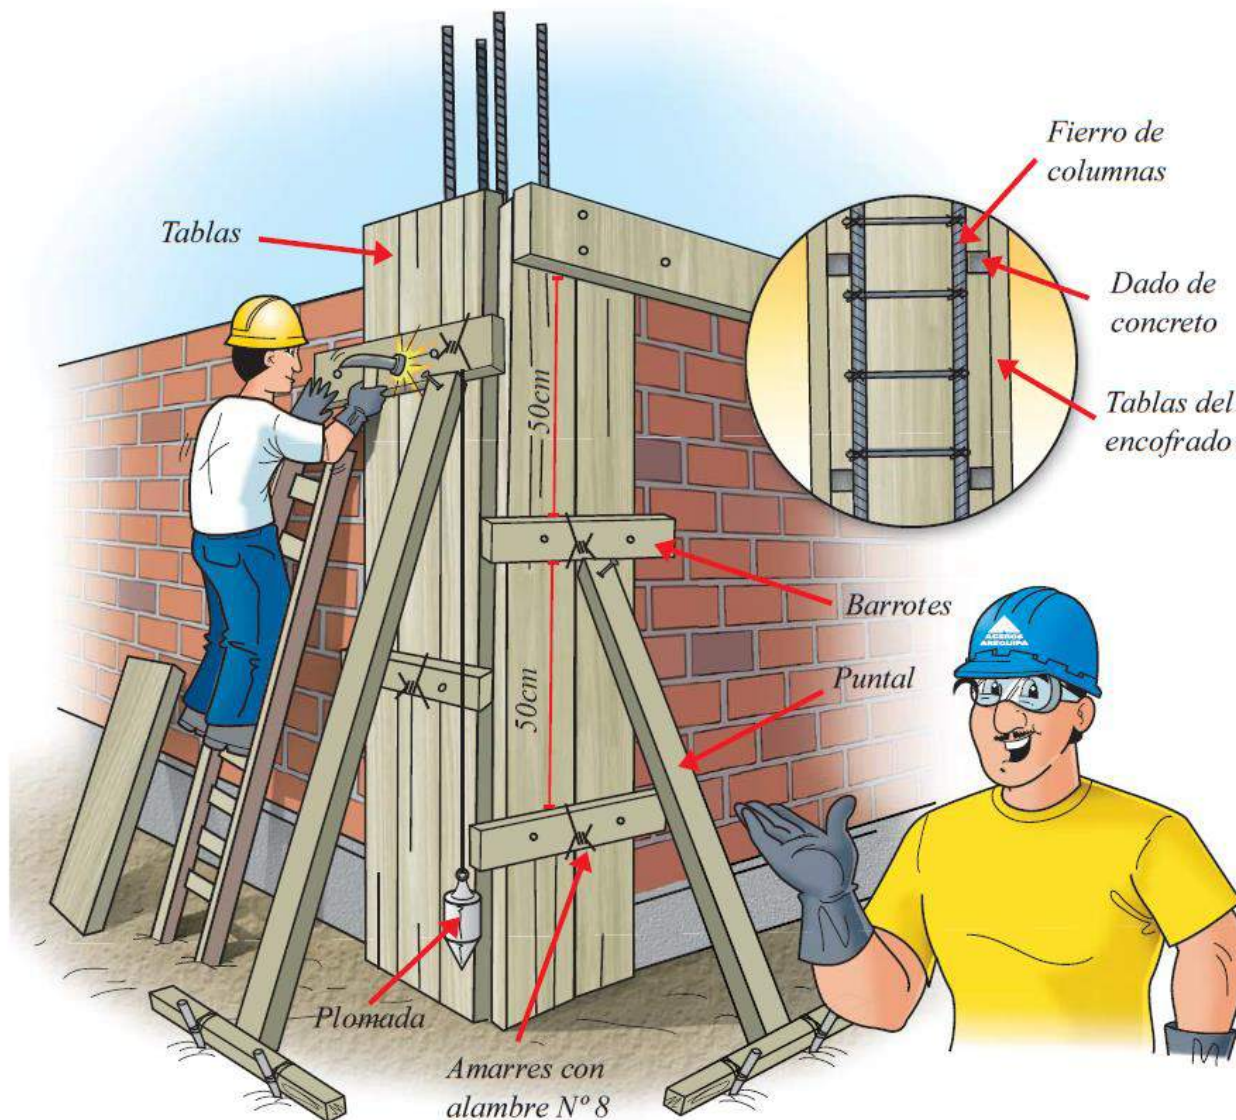

Una vez levantado el muro de ladrillos, se procederá al encofrado de las columnas que servirán de molde para el vaciado de concreto.

Los encofradores empezarán por habilitar la madera, es decir, cortarán y juntarán una pieza con otra; se deberá verificar que se encuentre en buen estado, limpia de desperdicios y no arqueada.

A los fierros de las columnas se les deben adherir unos *dados de concreto* de 2 cm de espesor, que actúan como separadores, evitando que se peguen al encofrado, de manera que tengan suficiente concreto de recubrimiento y que en un futuro no se oxiden.

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES




Las tablas de madera que sirven para encofrar la columna, deben estar unidas por *barrotes* ubicados a no más de 50 cm uno del otro. Por su parte, la superficie que estará en contacto con el concreto debe mojarse con petróleo, a fin de que el concreto endurecido no se pegue a la madera, facilitando el desencofrado.

Una vez colocado el encofrado, se deben ajustar las caras opuestas con alambre N°8, cuidando de que no queden espacios entre el muro y el encofrado por donde pueda escurrirse el concreto durante el vaciado.

Luego el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos *puntales*. Para terminar, es importante verificar que el encofrado haya quedado totalmente vertical, utilizando una plomada.

En caso de que se esté encofrando una columna que colinda con el muro de una propiedad vecina, debemos colocar una plancha de tecnopor para conservar la separación entre las dos propiedades. Esta separación permitirá que, durante un sismo, nuestra vivienda se mueva de forma independiente sin chocar con la vivienda vecina.

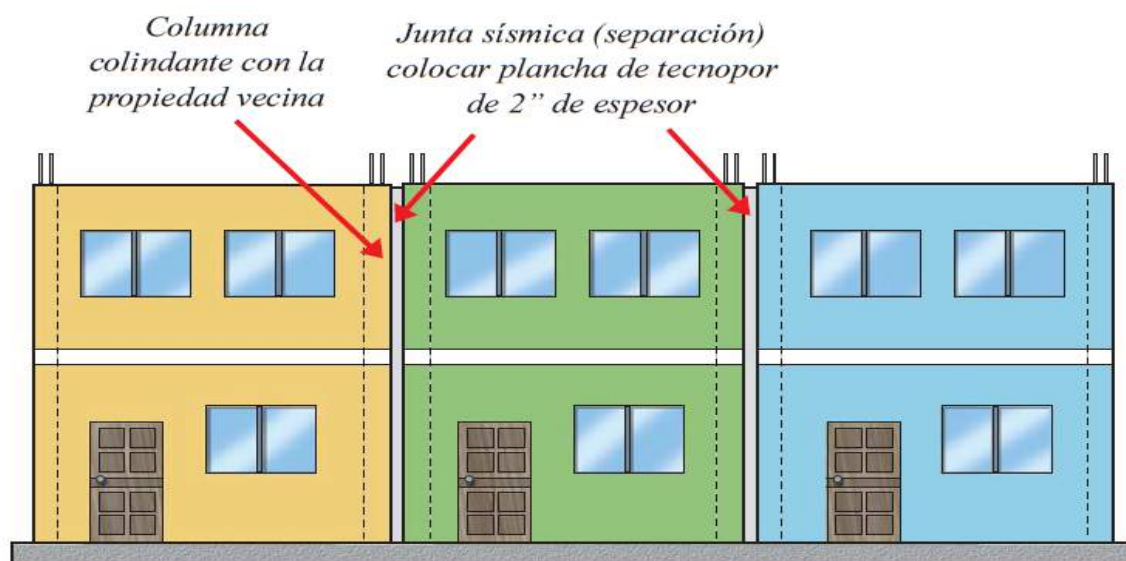

Se recomienda revisar la zona de trabajo durante el proceso de encofrado, pues es frecuente encontrar en el piso maderas con clavos que pueden ocasionar accidentes.

Una vez cumplidos estos pasos, el encofrado quedará listo para el vaciado del concreto. Al día siguiente del vaciado se podrá desencofrar.

Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS

7.6.4 Vaciado del concreto en columnas



Para la preparación de la mezcla, debemos consultar la *resistencia a la compresión* que se especifica en los planos. Por lo general, para una casa de dos o tres pisos es de 175 kg/cm^2 .

La proporción recomendable para obtener esta resistencia es 1 volumen de cemento por 3 volúmenes de arena gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Esto se logra usando 1 bolsa de cemento, 1 buggy de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla que permita un buen trabajo.

Esta cantidad de agua varía dependiendo del estado de humedad en que se encuentren la arena y la piedra, si están totalmente secas el agua para una bolsa de cemento podrá ser de 40 litros, mientras que si están totalmente mojadas bastará con unos 20 litros.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

*"Un deseo no cambia nada, una
decisión cambia todo".*



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS

Trabajamos con responsabilidad y transparencia
por una educación de calidad



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO,
CONTAMOS CONTIGO!



Oficina General de Ética Pública y Transparencia

Rumbo a la nota más alta

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
