



Informe Mensual - Equipo de Ejecución de Obras

Diciembre 2015

Lima - Año 4 - Número 12 Diciembre, 2015 - Distribución por Email
Edición Mensual

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación



/ BORIS ALVAREZ RODRIGUEZ



@

PERSE01964



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

www.pronied.gob.pe

Rumbo a la nota más alta



Doceava Edición, Diciembre 2015
Diseño y Creación : Ans. Boris Alvarez Rodriguez
Fuente de Datos : Aplicativo SEEK-OBRA
Equipo de Ejecucion de Obras - UGEO
Anexo : 25458



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS



Informe Mensual - Equipo de Ejecución de Obras

Diciembre 2015

Lima - Año 4 - Número 12 Diciembre, 2015 - Distribución por Email
Edición Mensual



f / BORIS ALVAREZ RODRIGUEZ @ PERSE01964 # INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

www.pronied.gob.pe

CONTENIDO

- 01.- Obras en Ejecución Diciembre 2015
- 02.- Procesos de Convocatoria
- 03.- Obras Terminadas al mes de Diciembre 2015
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2015 (Diciembre).
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias
- 09.- Términos y Definiciones.
- 10.- Descripción Visual de Actividades realizadas en diversas Obras Civiles.



Doceava Edición, Diciembre 2015
Diseño y Creación : Ans. Boris Alvarez Rodriguez
Fuente de Datos : Aplicativo SEEK-OBRA
Equipo de Ejecucion de Obras - UGEO
Anexo : 25458



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	39
2	PROGRAMA REGULAR	6
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	1
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		46

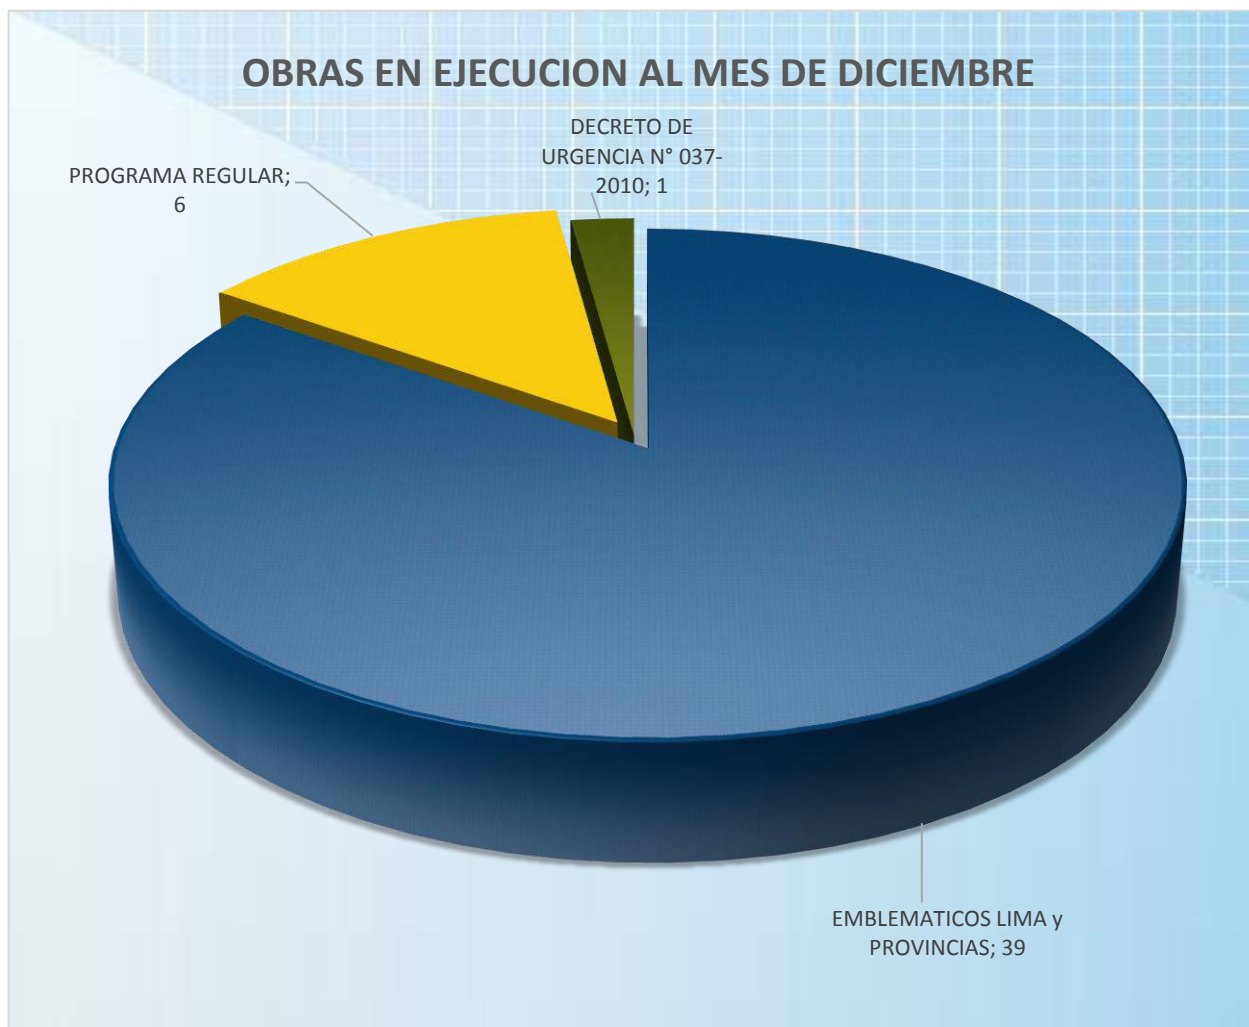

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION REPORTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

(Los % de Avance Físico corresponden a la Valorización del 1-15 obra del mes de Diciembre)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito			Inicio	Fin + Amp.	
EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS									
1	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1.175.818,10	45	10/09/2015	14/11/2015	41,72%
2	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA TENSION 10kv	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	243.477,98	75	04/08/2015	17/10/2015	12,63%
3	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	24/01/2015	17/02/2016	95,52%
4	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	211.167,96	75	21/11/2015	03/02/2016	34,48%
5	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	420	18/09/2013	17/02/2016	84,10%
6	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	34.686.021,42	380	03/02/2015	17/02/2016	56,34%
7	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	34.244.713,01	380	16/12/2014	30/12/2015	80,02%
8	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	10/10/2014	31/12/2015	98,90%
9	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	15/10/2014	21/01/2016	57,57%
10	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	15/01/2015	18/01/2016	48,64%
11	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	19.498.304,07	300	27/11/2014	20/12/2015	73,67%
12	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	04/12/2014	15/01/2016	44,46%
13	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	20/12/2014	02/02/2016	87,00%
14	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	14/01/2015	08/01/2016	72,08%
15	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCANELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	24/12/2014	30/11/2015	57,66%
16	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	04/12/2014	30/11/2015	67,35%
17	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	26/11/2014	14/02/2016	92,25%
18	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	13/01/2015	30/12/2015	75,98%
19	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	21/01/2015	15/01/2016	44,71%
20	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI	13.718.000,00	330	23/03/2015	15/02/2016	77,88%
21	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	30/12/2014	16/11/2015	61,31%
22	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	22/12/2014	28/12/2015	46,36%
23	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	12/03/2015	05/03/2016	50,96%
24	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	18.528.862,34	360	17/03/2015	10/03/2016	21,00%
25	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	07/04/2015	31/03/2016	59,00%
26	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	31.045.999,61	360	21/07/2015	14/07/2016	9,50%
27	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	10.384.563,55	240	23/12/2015	18/08/2016	-
28	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	PUERTO MALDONADO	20.349.000,00	360	10/12/2015	03/12/2016	0,19%
29	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	29.570.000,00	390	16/12/2015	08/01/2017	-
30	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	18.800.000,00	360	01/12/2015	24/11/2016	1,10%
31	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	28.810.627,03	360	19/11/2015	12/11/2016	1,28%
32	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	2.291.015,39	120	07/11/2015	05/03/2016	8,18%
33	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDINO	21.205.941,35	360	24/10/2015	17/10/2016	7,74%
34	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	13.743.544,16	270	04/11/2015	30/07/2016	4,06%
35	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	16.726.846,71	330	28/11/2015	22/10/2016	-
36	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	25.392.006,50	360	09/12/2015	02/12/2016	1,19%
37	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	17.997.465,48	360	22/12/2015	15/12/2016	-
38	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	7.895.377,48	180	26/11/2015	23/05/2016	2,32%
39	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	22/01/2013	04/03/2015	94,43%

PROGRAMA REGULAR

1	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296.149,36	75	29/04/2015	12/07/2015	87,85%
2	IE CSMA 67 - II ETAPA	LA LIBERTAD	PACASMAYO	GUADALUPE	761.329,75	150	08/09/2015	04/02/2016	58,56%
3	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAS	CARHUAS	12.876.435,34	300	12/12/2014	27/01/2016	98,69%
4	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	11.490.218,47	300	27/11/2015	21/09/2016	3,08%
5	IE 153	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	1.646.941,88	150	30/10/2015	27/03/2016	19,65%
6	IE 20188 - IEI 627	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	6.752.723,25	210	05/11/2015	01/06/2016	6,12%

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIR	3.137.673,94	180	23/12/2014	18/02/2016	54,66%
---	-------------------------------------	------	------	-----------------	--------------	-----	------------	------------	--------



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional


Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	CON BUENA PRO y POR INICIAR EJECUCION	5
2	POR CONVOCAR y/o EN TRAMITE	9
TOTAL DE OBRAS EN PROCESO		14

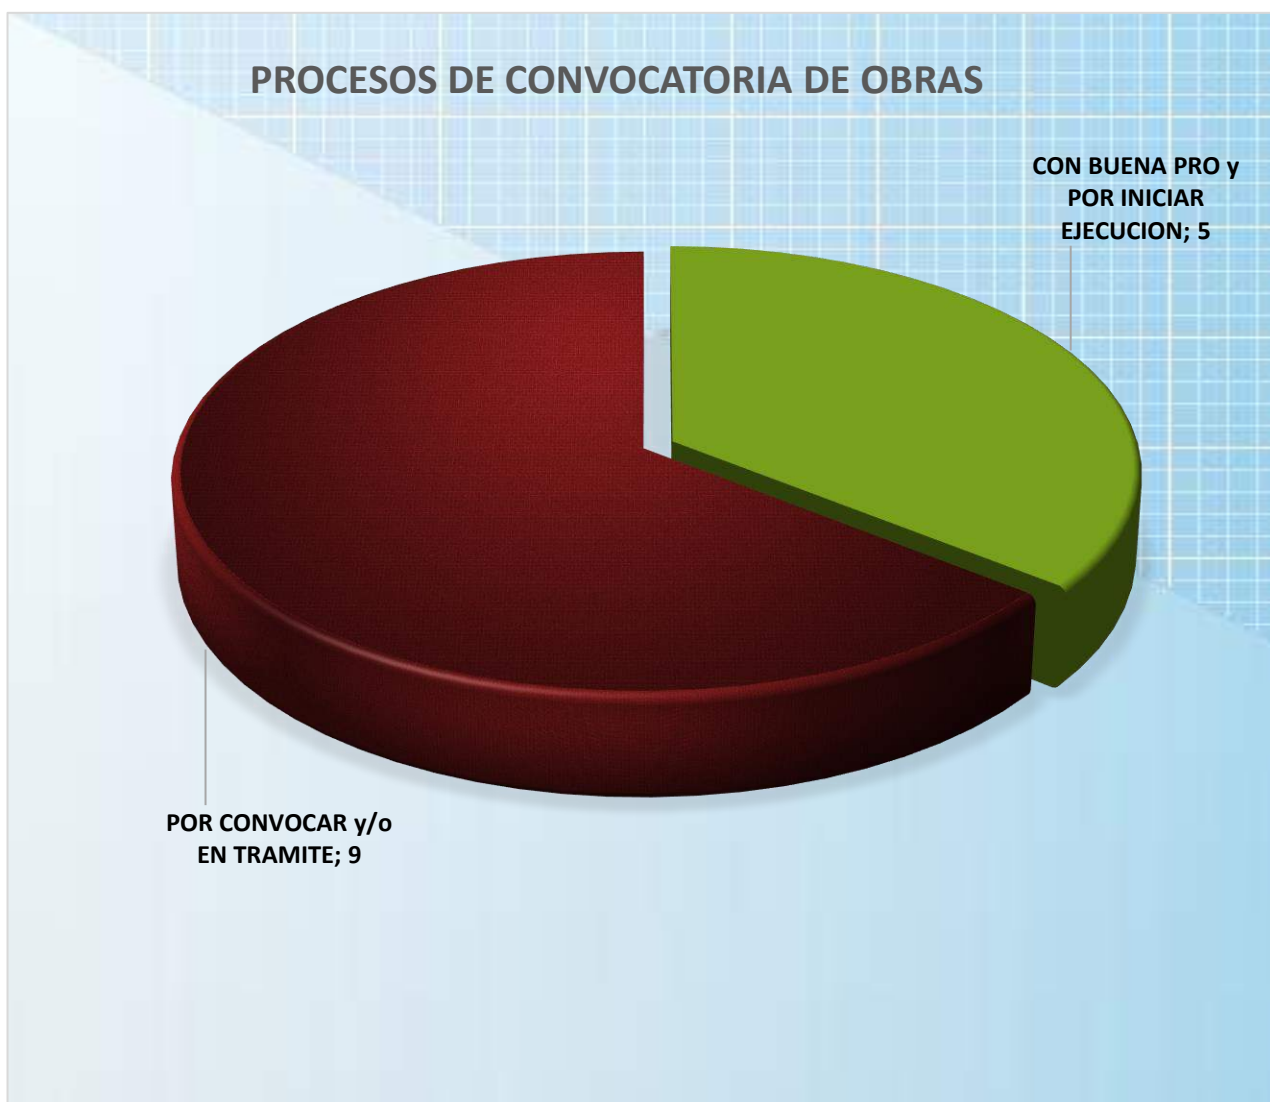

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE PROCESOS EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Proceso con Buena Pro - Obras por Iniciar Ejecución :

1	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD - MURO DE CONTENCIÓN	ANCASH	037060	029-2015-UGEO	27/05/2015	60.347,23	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 11/09/2015 A CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOTO SAC - MONTO ADJUDICADO S/. 54,312.51
2	EMBLEMATICAS	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	032381	032-2014-UGEO	11/06/2015	26.207.700,60	POR INICIAR : BUENA PRO :EI 27/10/2015 a Consorcio Ruesma - Bagua Grande (Construcciones Ruesma SA - Construcciones Ruesma Perú SAC) Monto Adjudicado S/. 21'741,286.54
3	EMBLEMATICAS	IE SANTO TOMAS	CUSCO	032524	031-2015-UGEO	28/05/2015	19.643.243,33	POR INICIAR : BUENA PRO OTORGADA EL 16/10/2015 A CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL - MONTO ADJUDICADO S/. 17'678,919.00
4	EMBLEMATICAS	IE DANIEL HERNANDEZ - MEDIA TENSION 10 KV	HUANCAVELICA	042891	047-2015-UGEO	25/08/2015	272.883,94	BUENA PRO OTORGADA EL 14/12/2015 a Lepus Group Sociedad Anónima : Monto Adjudicado 245,595.55
5	EMBLEMATICAS	IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA PISCINA	ICA	035878	054-2015-UGEO	05/10/2015	74.910,94	BUENA PRO OTORGADA EL 27/11/2015 A CH INGENIEROS SAC MONTO ADJUDICADO S/. 71,914.50

02.- Procesos por Convocar :

1	EMBLEMATICAS	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	032382	017-2014-UGEO	12/12/2014	21.498.797,95	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
2	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA - SALDO DE OBRA	TACNA	044792	057-2015-UGEO	07/10/2015	24.227.287,45	ABSOLUCION DE OBSERVACIONES
3	EMBLEMATICAS	IE AURELIO CARDENAS PACHAS - SALDO DE OBRA	HUANUCO	044791	055-2015-UGEO	05/10/2015	3.939.529,54	ABSOLUCION DE CONSULTAS
4	EMBLEMATICAS	SAN JUAN DE LA LIBERTAD - MEDIA TENSION 10-22.9KV	AMAZONAS	045972	059-2015-UGEO	16/10/2015	341.830,24	ABSOLUCION DE CONSULTAS
5	PROGRAMA REGULAR	IE 331 DIVINO NIÑO JESUS	LIMA	040425	062-2015-UGEO	04/11/2015	2.880.105,60	ABSOLUCION DE CONSULTAS
6	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEDIA TENSION	APURIMAC	033790	051-2015-UGEO	30/09/2015	215.317,62	ABSOLUCION DE CONSULTAS
7	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ - MEDIA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	042015	044-2015-UGEO	17/08/2015	238.996,48	ABSOLUCION DE CONSULTAS
8	PROGRAMA REGULAR	IE 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA	LIMA	033787	043-2015-UGEO	17/08/2015	2.795.957,16	ABSOLUCION DE CONSULTAS
9	EMBLEMATICAS	LEONCIO PRADO - INSTALACION 02 ASCENSORES	HUANUCO	050118	058-2015-UGEO	16/10/2015	427.455,89	ABSOLUCION DE CONSULTAS


14

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Diciembre 2015

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	12
2	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	4
3	PROGRAMA REGULAR	2
TOTAL OBRAS TERMINADAS		18

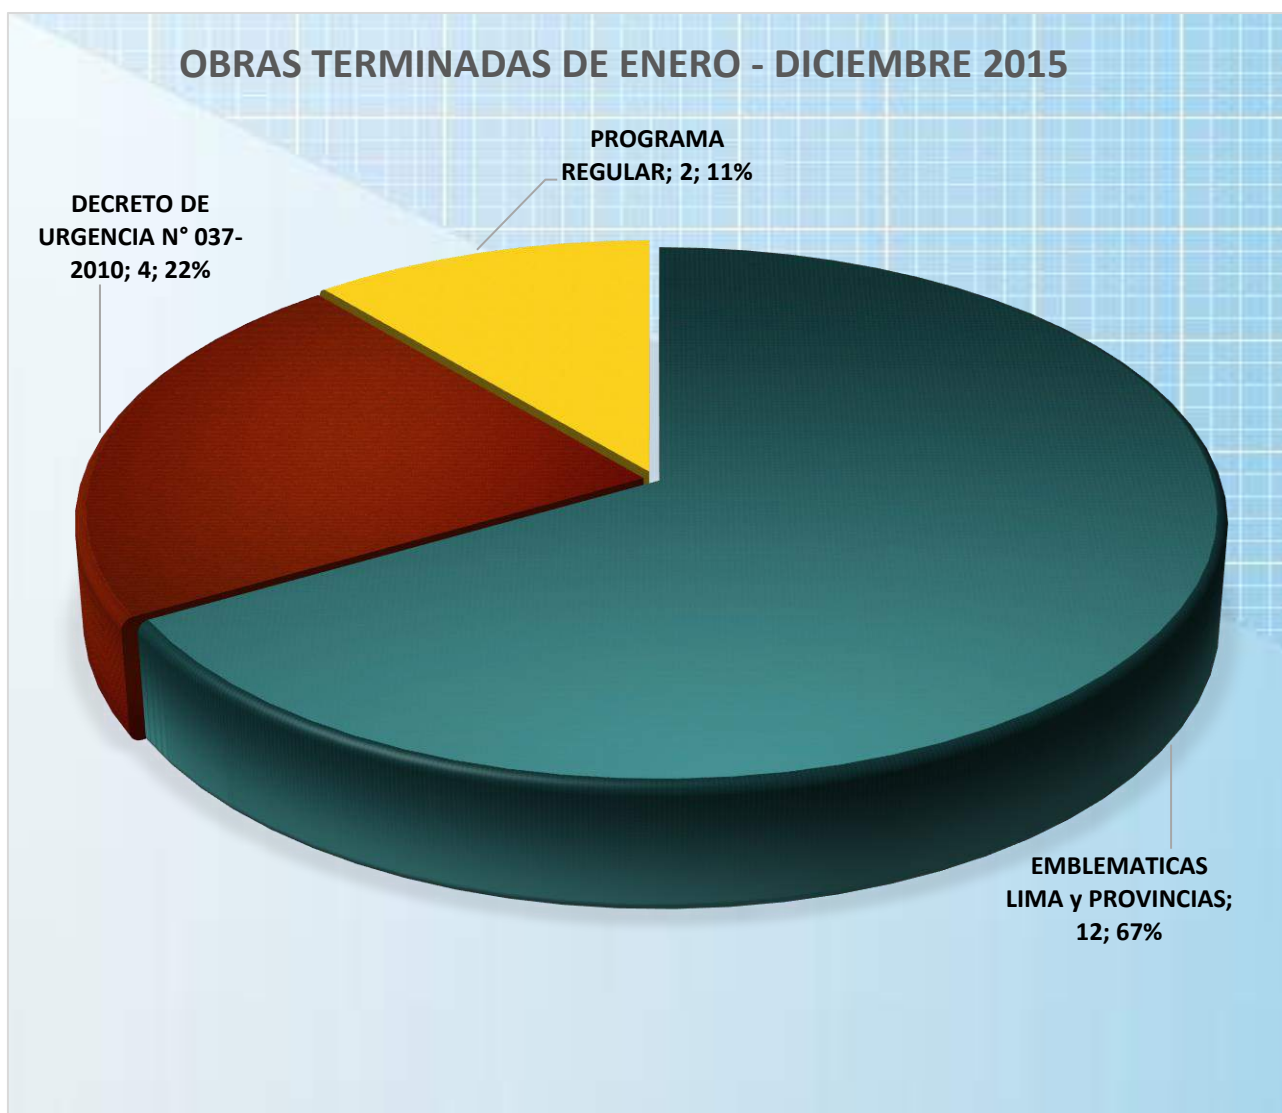

Nota : No estan consideradas las Obras que fueron Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	1.104.233,95	31/07/2015
2	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5.586.133,51	06/08/2015
3	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	5.844.004,16	(*)
4	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	MORROPON	SALITRAL	3.188.113,74	18/11/2015
5	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	08/09/2015
6	EMBLEMATICAS	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	182.471,64	(*)
7	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	84.621,33	02/09/2015
8	EMBLEMATICAS	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	05/09/2015
9	EMBLEMATICAS	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	(*)
10	EMBLEMATICAS	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	(*)
11	EMBLEMATICAS	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	11/12/2015
12	EMBLEMATICAS	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	20/11/2015
13	EMBLEMATICAS	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	03/07/2015
14	EMBLEMATICAS	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	13/05/2015
15	EMBLEMATICAS	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	(*)
16	EMBLEMATICAS	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	(*)
17	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	881.530,86	(*)
18	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1.786.247,42	30/04/2015

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	(1)
2	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	(2)
3	EMBLEMATICAS	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	(3)
4	EMBLEMATICAS	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	(4)
5	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2.850.259,95	(5)
6	EMBLEMATICAS	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	(6)
7	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	(7)
8	EMBLEMATICAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	410.758,92	(8)
9	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	2.247.766,20	(9)
10	EMBLEMATICAS	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	8.720.999,29	(10)
11	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5.896.843,66	(11)
12	EMBLEMATICAS	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	27.806.000,00	(12)
13	EMBLEMATICAS	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	(13)

(*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		

(1) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : CON OFICIO N°0046-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DE FECHA 30-12-2014, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

(02) CONTRATO DE OBRA RESUELTO - MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°0023-2015-MINEDU-PRONIED-OGA DEL 12-01-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA.

(03) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°053-2015-PRONIED-OGA DEL 16-02-2015, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA. (CON MEMORANDUM N°0604-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA 12-02-2015, SE SOLICITA A LA OGA, DECLARE RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA - EXP. 5431-2015.

(04) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1218-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 23-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, LA ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - EXP. 9722-2015.

(05) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1211-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 20-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR HECHOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES - EXP. 10324-2015.

(06) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°0038-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL 21-01-2015 DIRIGIDO AL CONTRATISTA SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION . - EXP. N° 8692

(07) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°1335-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 30-03-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES, COMO COMPLETAR EL PLANTEL DE LA RESIDENCIA Y EL PLAN DE TRABAJO, ADEMAS DE TENER UN AVANCE MENOR AL 80% - EXP. 11813-2015.

(08) CONTRATO RESUELTO : CON MEMORANDUM N°2895-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 08-07-2015, EL EQUIPO DE EJECUCION DE OBRA SOLICITA SE DECLARE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA - EXP. 26887-2015.

(09) CONTRATO RESUELTO - MEDIANTE MEMORANDUM N°3123-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE EL CONTRATISTA Y SE COMUNICA QUE LA CONSTATAcion FISICA SE REALIZARA LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO 2015. - EXP. 24666-2015.

(10) CONTRATO RESUELTO - CON MEMORANDUM N°3305-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 04-08-2015, SE COMUNICA A LA OGA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE INFORMA QUE LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE BIENES SE REALIZARA LOS DIAS 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015. EXP. 29725-2015.

(11) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°0458-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL 10-09-2015 DIRIGIDO AL CONTRATISTA SE COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA POR PENALIDAD MAXIMA POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA . - EXP. N° 30815

(12) CONTRATO RESUELTO POR EL CONTRATISTA - LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO SE REALIZO EL 11 DE NOVIEMBRE 2015, EXP. 45725-2015.

(13) CONTRATO DE OBRA RESUELTO, RESOLUCION N°15 DEL 13/10/2015, SE LEVANTA MEDIDA CAUTELAR OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION N°02.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Rumbo a la nota más alta

Se vienen ejecutando a la fecha

46

Obras de Infraestructura Educativa

Equipo de Ejecución de Obras



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE DICIEMBRE 2015



Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	87,00%
2	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	98,69%
3	EMBLEMATICAS	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	-
4	EMBLEMATICAS	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	94,43%
5	EMBLEMATICAS	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	48,64%
6	EMBLEMATICAS	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	75,98%
7	EMBLEMATICAS	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDON	7,74%
8	EMBLEMATICAS	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTE	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	41,72%
9	EMBLEMATICAS	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	98,90%
10	EMBLEMATICAS	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	57,57%
11	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	44,46%
12	EMBLEMATICAS	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	9,50%
13	EMBLEMATICAS	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	-
14	EMBLEMATICAS	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	57,66%
15	EMBLEMATICAS	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	46,36%
16	EMBLEMATICAS	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	95,52%
17	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	72,08%
18	EMBLEMATICAS	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	92,25%
19	EMBLEMATICAS	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	-
20	PROGRAMA REGULAR	IE CSMA 67 - II ETAPA	LA LIBERTAD	PACASMAYO	GUADALUPE	58,56%
21	EMBLEMATICAS	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLO	73,67%
22	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDIA T	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	12,63%
23	EMBLEMATICAS	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALDO	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	2,32%
24	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	87,85%
25	EMBLEMATICAS	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	56,34%
26	EMBLEMATICAS	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE POR	80,02%
27	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAF	54,66%
28	EMBLEMATICAS	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	21,00%
29	PROGRAMA REGULAR	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	3,08%
30	PROGRAMA REGULAR	IE 153	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	19,65%
31	PROGRAMA REGULAR	IE 20188 - IEI 627	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CA	6,12%
32	EMBLEMATICAS	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	8,18%
33	EMBLEMATICAS	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	61,31%
34	EMBLEMATICAS	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	-
35	EMBLEMATICAS	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	PUERTO MALDONADO	0,19%
36	EMBLEMATICAS	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	59,00%
37	EMBLEMATICAS	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	1,28%
38	EMBLEMATICAS	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	84,10%
39	EMBLEMATICAS	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	4,06%
40	EMBLEMATICAS	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	67,35%
41	EMBLEMATICAS	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	44,71%
42	EMBLEMATICAS	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERE	JUANJUI	77,88%
43	EMBLEMATICAS	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	1,10%
44	EMBLEMATICAS	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	1,19%
45	EMBLEMATICAS	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	34,48%
46	EMBLEMATICAS	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	50,96%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la UGEO.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	23		
		➡	23	50%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	23	50%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			46	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

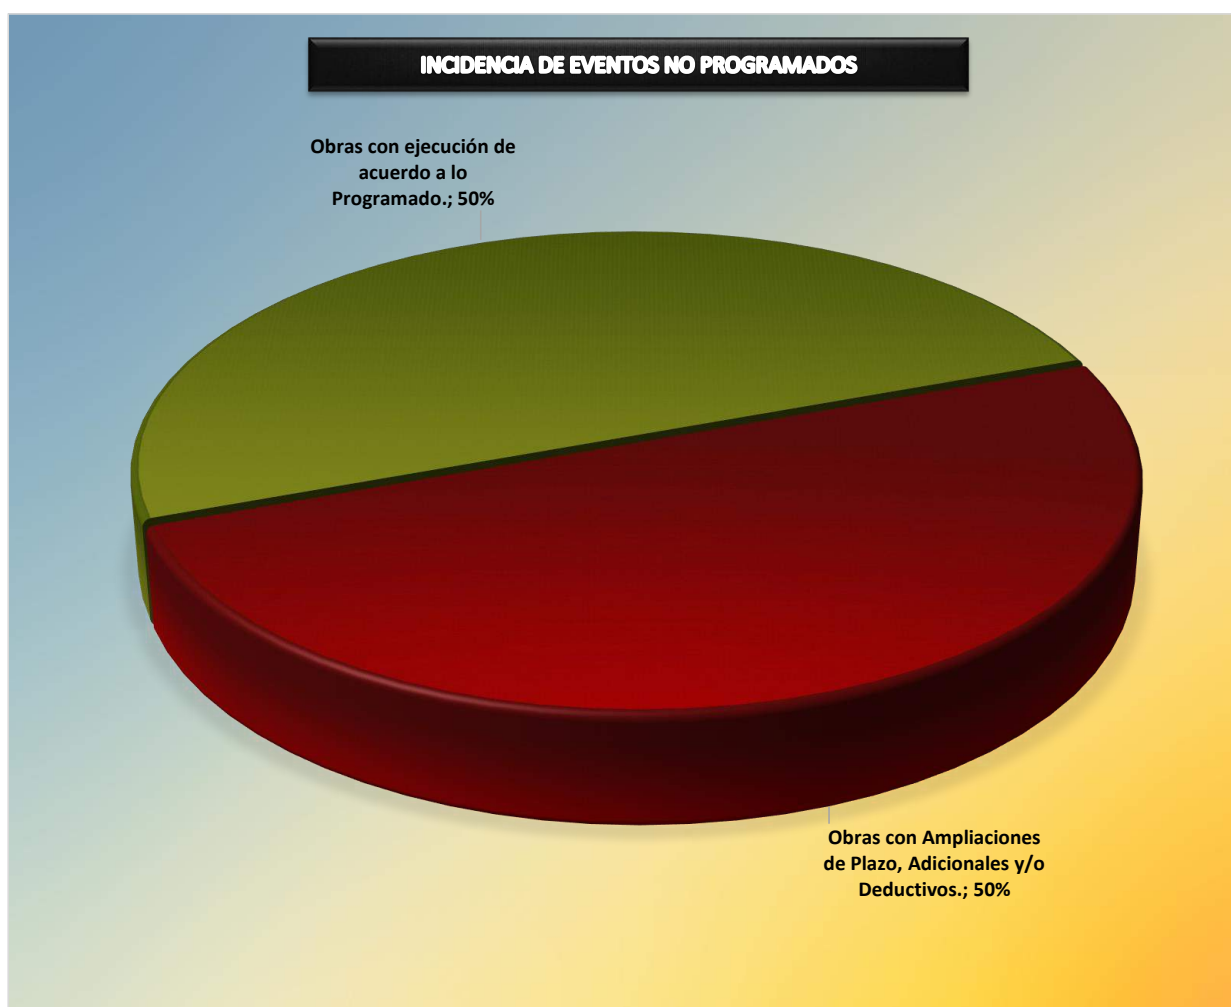

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra , pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construccion, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Diciembre 2015)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - DIC	12	21	33 (*)
		12	21	33

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.

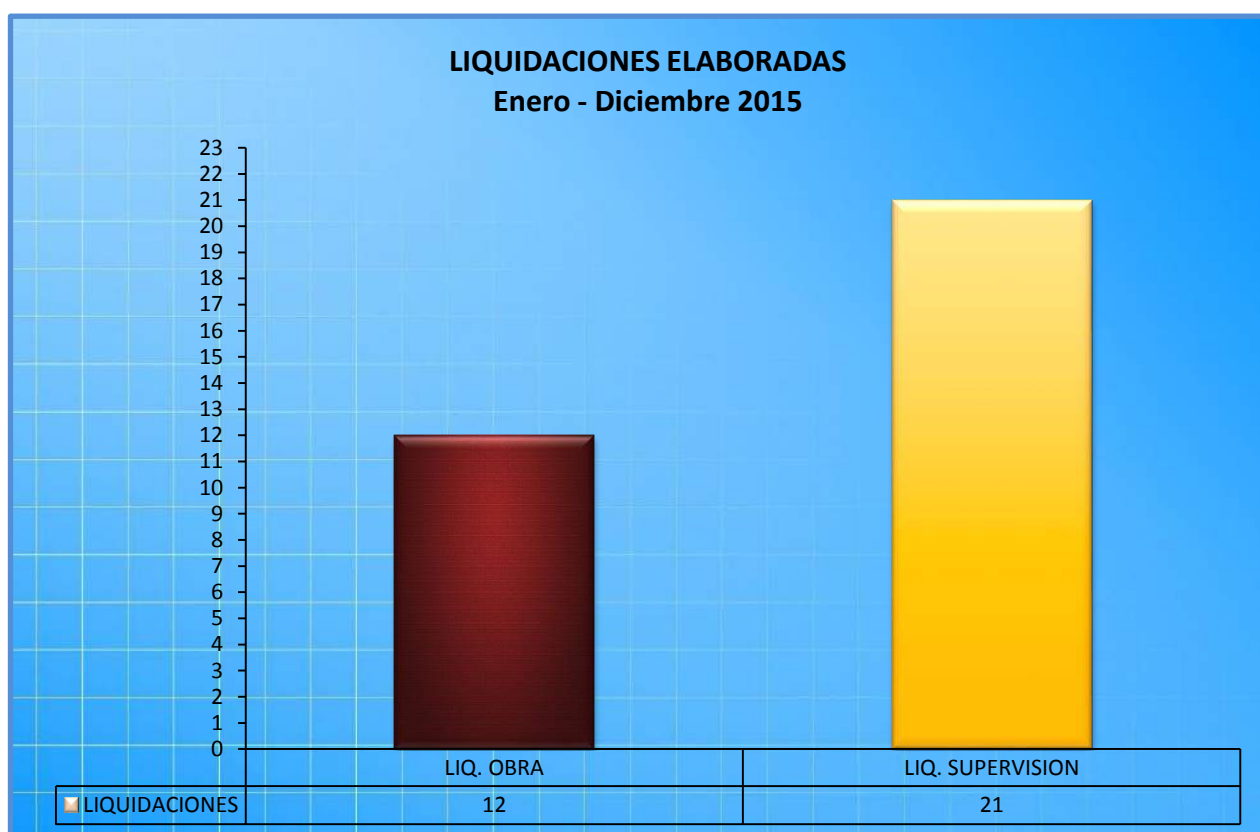

Equipo de Ejecución de Obras PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION **LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - DICIEMBRE 2015)**

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	
01.- OBRA							
1	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	APURIMAC	3.441.687,51	RD-0022-2015-ED	22/01/2015	3.587.658,05
2	IE SANTA TERESITA	CONSORCIO SANTA TERESITA - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C. - GARCIA VARGAS INGENIEROS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.	CAJAMARCA	25.890.382,85	RD-0128-2015-ED	30/04/2015	28.287.309,14
3	IE 9 DE DICIEMBRE	C&S GUTIERREZ S.R.L.	ICA	3.329.900,07	RD-0140-2015-ED	12/05/2015	3.705.416,98
4	IE SAN JOSE	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.- FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	JUNIN	22.606.616,90	RD-0146-2015-ED	15/05/2015	REFORMULACION
5	LOCAL MINISTERIO DE EDUCACION - I ETAPA - A	CONSORCIO SAN BONAIF - CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. - CONSTRUC. INDUSTRIALES PERUANOS S.A.	LIMA	28.770.497,46	RD-0157-2015-ED	25/05/2015	REFORMULACION
6	IE MIGUEL GRAU	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS.	LIMA	7.669.799,25	RD-0176-2015-ED	08/06/2015	REFORMULACION
7	IE 22424	CONSORCIO PALPA - 3G CONSTRUCTORA SAC - VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ICA	2.381.260,63	RD-0178-2015-ED	09/06/2015	2.489.141,20
8	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DORADO S.A.C.	MADRE DE DIOS	116.708,99	RD-0191-2015-ED	17/06/2015	119.447,74
9	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	CONSORCIO ALFA - A.S.A. ASOCIADOS S.A. - SJT INMOBILIARIA S.A.C.	ICA	1.786.247,42	RD-0241-2015-ED	31/07/2015	1.822.394,24
10	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	MAXOM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	ICA	397.704,05	RD-0282-2015-ED	04/09/2015	413.932,37
11	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	CONSORCIO SANCHEZ CARRION - HOUSE BUSSINES EIRL - CORPORACION CONSTRUCTORA TERCER MILENIO SAC.	LA LIBERTAD	32.532.033,80	RD-0296-2015-ED	10/07/2015	32.369.311,78
12	IE PEDRO A. LABARTHE	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	LIMA	16.102.546,53	RD-0378-2015-ED	04/11/2015	9.692.578,25
02.- SUPERVISION							
1	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - OIST S.A.	AREQUIPA	1.760.437,89	RD-0035-2015-ED	03/02/2015	1.643.655,36
2	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H GRANT INGENIEROS S.A.C. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1.349.037,36	RD-0136-2015-ED	07/05/2015	1.340.403,52
3	IE KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO - H GRANT INGENIEROS S.A.C. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SUCURSAL DEL PERU	LAMBAYEQUE	1.349.037,36	RD-0152-2015-ED	18/05/2015	REFORMULACION
4	IE 22424	CONSORCIO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ	ICA	221.033,22	RD-0169-2015-ED	04/06/2015	239.261,00
5	IE 20191 ALFONSO UGARTE	HECTOR KENEDI ZAVALA DOMINGUEZ	LIMA	72.336,00	RD-0186-2015-ED	12/06/2015	72.336,00
6	IE 22424	CONSORCIO BRAVAJAL - ESTELA PALOMINO RUIZ	ICA	221.033,22	RD-0196-2015-ED	23/06/2015	REFORMULACION
7	IE SANTA TERESITA	VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC	CAJAMARCA	1.282.605,72	RD-0221-2015-ED	15/07/2015	1.486.577,13
8	INCA GARCILASO DE LA VEGA	PROJECT CONSULTING S.A.	CUSCO	1.232.200,37	RD-0229-2015-ED	20/07/2015	1.121.168,23
9	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE - MEND	LAMBAYEQUE	507.013,12	RD-0230-2015-ED	20/07/2015	454.662,08
10	IE JUAN MANUEL ITURREGUI	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.	LAMBAYEQUE	1.015.478,98	RD-0278-2015-ED	02/09/2015	947.936,92
11	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - AGOBIRICH INGENIEROS SAC - INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS SA	PUNO	1.356.700,57	RD-0284-2015-ED	07/09/2015	1.573.417,32
12	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	CONSORCIO SUPERVISOR TACNA - OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU	TACNA	1.828.085,42	RD-0319-2015-ED	28/09/2015	1.430.965,87
13	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	CONSORCIO REPUBLICA ARGENTINA - DICTEL PERU SAC - GYPO INGENIERIA Y URBANISMO SUCURSAL DEL PERU	ANCASH	1.320.481,36	RD-0320-2015-ED	28/09/2015	789.952,51
14	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	CONSORCIO SUPERVISOR ACUARIO - ESTELA PALOMINO RUIZ - REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ	LA LIBERTAD	433.262,02	RD-0326-2015-ED	01/10/2015	378.526,81
15	IE MERCEDES INDACOCHEA	CONSORCIO LIMA - BLOQUE CONSULTORIAS & PROYECTOS SAC - VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. - JSU INGENIEROS SAC	LIMA	1.185.000,00	RD-0363-2015-ED	28/10/2015	1.071.861,51
16	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	CONSTRUCTORA ANIR E.I.R.L.	LIMA	100.207,12	RD-0348-2015-ED	15/10/2015	110.164,87
17	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	PABLO ISIDORO FELIX LOZA	ICA	144.114,47	RD-0400-2015-ED	17/11/2015	124.861,71
18	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	CONSORCIO COHB - HERMAN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA - CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC	LIMA	1.126.000,00	RD-0423-2015-ED	27/11/2015	1.181.717,02
19	ESC. SUP. AUT. DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	NIL ALBERTO BANCALLAN VERONA	CUSCO	41.233,07	RD-0453-2015-ED	11/12/2015	41.233,07
20	CN GLORIOSO SAN CARLOS	RODOLFO JIMENEZ PALOMINO	PUNO	800.000,00	RD-0487-2015-ED	29/12/2015	878.360,83
21	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - A	PUNO	1.356.700,57	RD-0479-2015-ED	23/12/2015	REFORMULACION

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2015


Resumen :

PERIODO		OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01.-	PERIODO - 2006	44	48.465.534,33
02.-	PERIODO - 2007	64	52.142.241,97
03.-	PERIODO - 2008	25	40.765.868,98
04.-	PERIODO - 2009	29	61.225.516,19
05.-	PERIODO - 2010	67	243.203.569,79
06.-	PERIODO - 2011	42	589.848.336,93
07.-	PERIODO - 2012	37	391.412.804,36
08.-	PERIODO - 2013	29	289.457.225,51
09.-	PERIODO - 2014	15	240.272.849,48
10.-	PERIODO - 2015 (Diciembre)	18	235.223.530,06
Total Obras e Inversión Estimada		370	2.192.017.477,60

(*) No Están consideradas las Obras Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras - UGEO

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

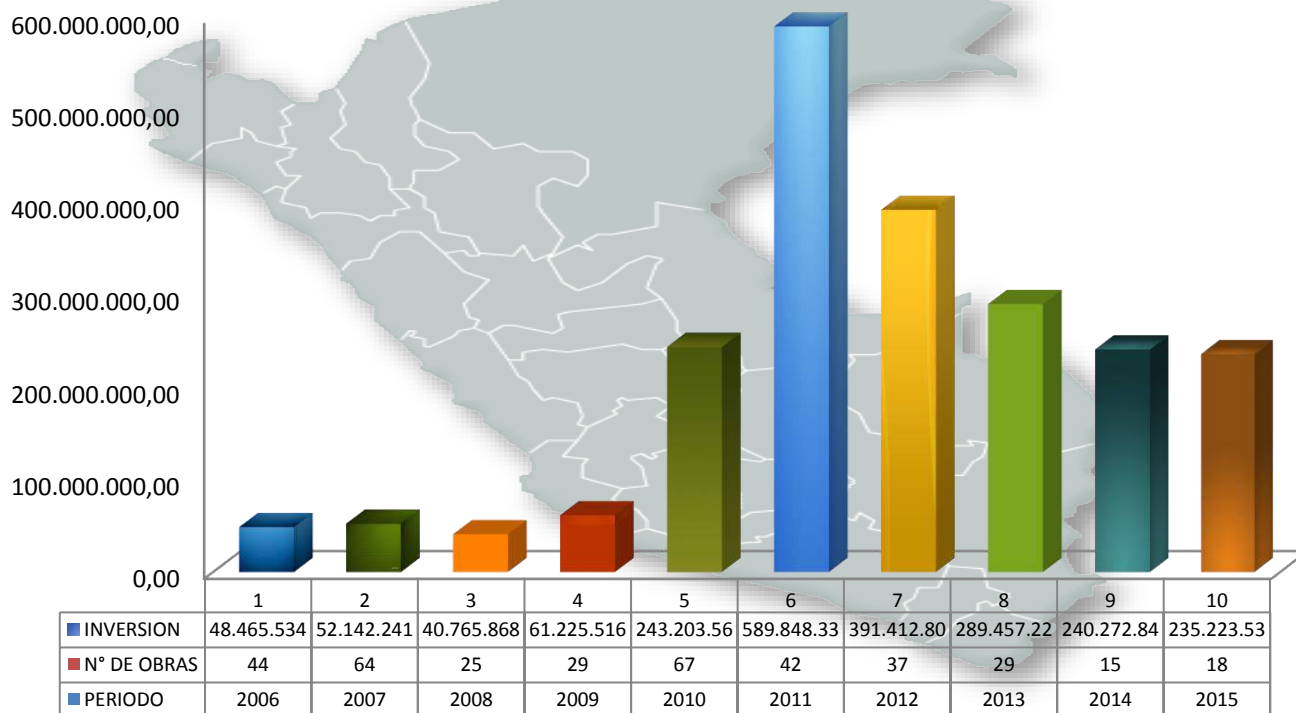

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión, así como importes generados por Obras Adicionales etc.
No incluye importes por equipamiento y/o mobiliario.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Diciembre 2015



RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	46	4	0	50
2	REGIONES	55	35	10	100
Totales :		101	39	10	150

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS A NIVEL NACIONAL

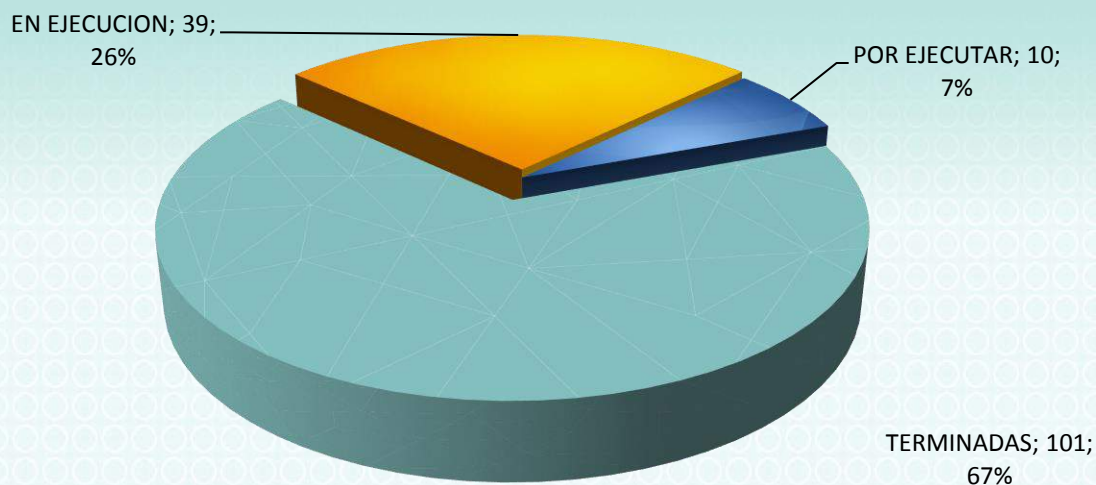

INDICE DE INTERVENCION DE OBRAS EMBLEMATICAS EN LIMA y REGIONES DEL PERU



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Diciembre 2015




RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	46	4	0	50
2	REGIONES	55	35	10	100
Totales :		101	39	10	150

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
EN LIMA PROVINCIAS**

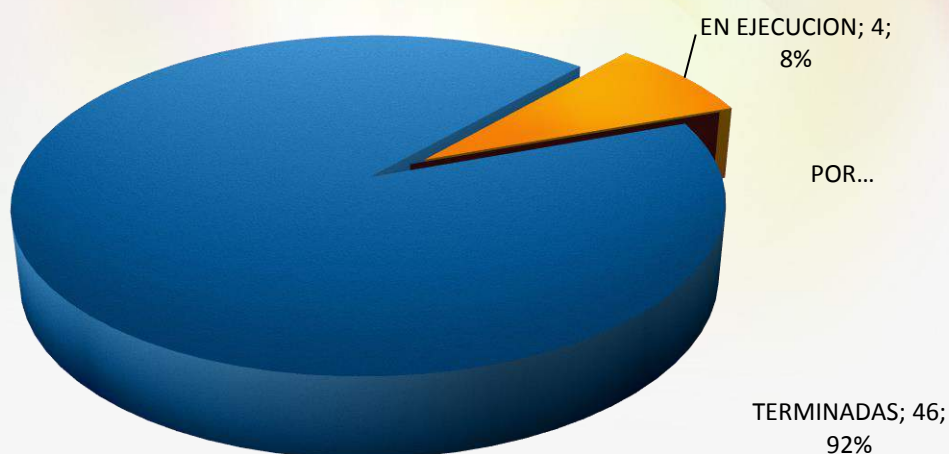

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
PROVINCIAS**

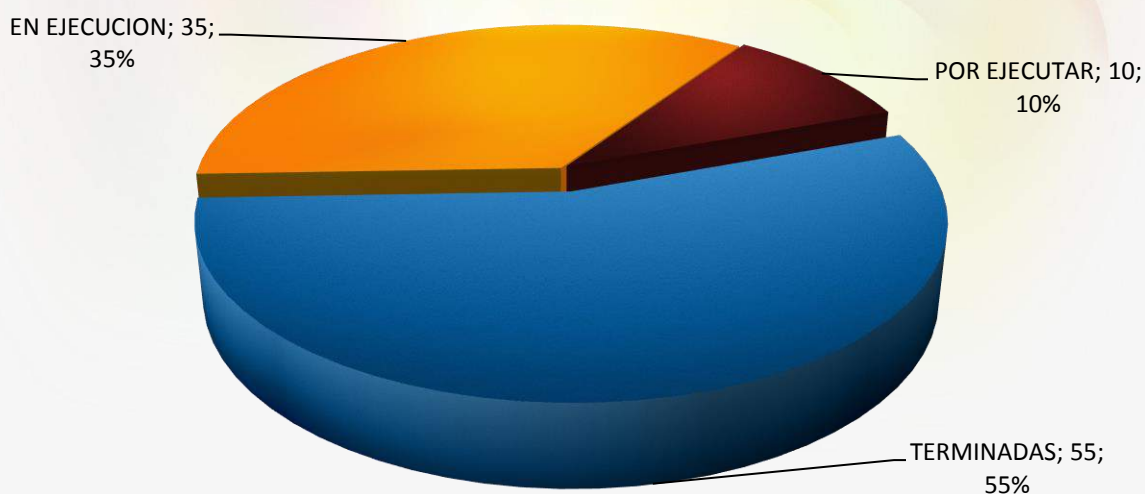

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS TERMINADAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242.850,10	90	100,00%	100,00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	35	100,00%	100,00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19.247.752,85	240	100,00%	100,00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10.984.825,12	240	100,00%	100,00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7.499.087,49	240	100,00%	100,00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14.698.756,22	270	100,00%	100,00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17.809.857,86	240	100,00%	100,00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST.	24.850.130,00	300	100,00%	100,00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44.922.369,46	288	100,00%	100,00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56.895.969,19	420	100,00%	100,00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	7.546.407,26	240	100,00%	100,00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12.552.231,68	240	100,00%	100,00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22.606.616,90	210	100,00%	100,00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18.733.216,84	300	100,00%	100,00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553.458,16	60	100,00%	100,00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8.498.883,99	180	100,00%	100,00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54.450.760,00	360	100,00%	100,00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7.725.531,18	240	100,00%	100,00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16.352.313,60	300	100,00%	100,00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28.760.197,28	360	100,00%	100,00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27.303.268,20	300	100,00%	100,00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20.567.329,08	300	100,00%	100,00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39.709.126,15	300	100,00%	100,00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10.819.997,45	270	100,00%	100,00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODRI	SAN NICOLAS	21.830.737,21	270	100,00%	100,00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5.192.205,06	180	100,00%	100,00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22.087.820,38	330	100,00%	100,00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5.803.114,30	180	100,00%	100,00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9.966.975,86	240	100,00%	100,00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15.001.252,09	150	100,00%	100,00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15.716.683,73	240	100,00%	100,00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2.762.375,59	120	100,00%	100,00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12.926.017,97	180	100,00%	100,00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109.160,87	45	100,00%	100,00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	270	100,00%	100,00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193.598,06	45	100,00%	100,00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS N	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	360	100,00%	100,00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2.546.695,38	120	100,00%	100,00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77.103,64	30	100,00%	100,00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	420	100,00%	100,00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196.003,67	45	100,00%	100,00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6.950.503,23	180	100,00%	100,00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14.730.418,50	240	100,00%	100,00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10.598.133,02	240	100,00%	100,00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13.274.564,17	270	100,00%	100,00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11.568.701,69	240	100,00%	100,00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10.386.423,92	210	100,00%	100,00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13.699.468,94	240	100,00%	100,00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7.669.799,25	180	100,00%	100,00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.540.886,61	270	100,00%	100,00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6.450.213,48	180	100,00%	100,00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16.102.546,53	270	100,00%	100,00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18.976.461,40	270	100,00%	100,00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13.767.910,99	240	100,00%	100,00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12.337.712,85	180	100,00%	100,00%	27/09/2011

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5.955.773,30	45	100,00%	100,00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2.727.463,60	75	100,00%	100,00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3.775.993,03	90	100,00%	100,00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3.723.072,73	90	100,00%	100,00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8.121.877,69	120	100,00%	100,00%	21/01/2011
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14.489.268,00	300	100,00%	100,00%	20/02/2012
62	PESP	183	2011	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	BARRANCO	696.281,48	174	100,00%	100,00%	13/03/2013
63	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.224.843,00	240	100,00%	100,00%	21/09/2011
64	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29.943.516,23	270	100,00%	100,00%	13/02/2013
65	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14.955.474,15	240	100,00%	100,00%	25/08/2011
66	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920.031,48	30	100,00%	100,00%	28/10/2010
67	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2.677.215,75	150	100,00%	100,00%	03/10/2011
68	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26.519.751,67	300	100,00%	100,00%	01/04/2013
69	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28.750,88	20	100,00%	100,00%	24/11/2011
70	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3.569.179,06	90	100,00%	100,00%	17/05/2011
71	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19.932.413,36	300	100,00%	100,00%	23/04/2014
72	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33.382.049,92	360	100,00%	100,00%	02/04/2014
73	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6.785.340,79	120	100,00%	100,00%	29/12/2011
74	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8.206.571,31	270	100,00%	100,00%	10/10/2012
75	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26.740.032,38	360	100,00%	100,00%	04/09/2013
76	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17.676.984,47	270	100,00%	100,00%	07/01/2013
77	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979.595,01	90	100,00%	100,00%	09/01/2012
78	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5.695.943,21	150	100,00%	100,00%	04/05/2012
79	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6.094.843,57	150	100,00%	100,00%	09/08/2012
80	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4.013.808,33	90	100,00%	100,00%	08/11/2012
81	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1.969.105,31	120	100,00%	100,00%	21/03/2012
82	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1.079.857,24	45	100,00%	100,00%	11/04/2012
83	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4.884.836,81	240	100,00%	100,00%	11/02/2014
84	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3.757.857,00	120	100,00%	100,00%	06/11/2012
85	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHA	20.829.352,78	330	100,00%	100,00%	11/08/2014
86	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	330	100,00%	100,00%	19/12/2014
87	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	360	100,00%	100,00%	30/01/2015
88	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	360	100,00%	100,00%	06/02/2015
89	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	360	100,00%	100,00%	29/05/2015
90	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	360	100,00%	100,00%	03/07/2015
91	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	360	100,00%	100,00%	13/05/2015
92	ADP	50	2014	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	120	100,00%	100,00%	08/09/2015
93	AMC	260	2015	IE 86019 LA LIBERTAD - RED DE ALCANTARILLADO	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	84.621,33	30	100,00%	100,00%	02/09/2015
94	LP	46	2014	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	180	100,00%	100,00%	20/11/2015
95	LP	15	2014	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	100,00%	100,00%	11/12/2015
96	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	100,00%	100,00%	-
97	ADS	21	2015	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	182.471,64	65	100,00%	100,00%	-
98	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	595	100,00%	100,00%	-
99	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	100,00%	100,00%	05/09/2015
100	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	577	100,00%	100,00%	-
101	LP	13	2014	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	286	100,00%	100,00%	-



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS EN EJECUCION - INSTITUCIONES EMBLEMATICAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADP	8	2015	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SIN	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1.175.818,10	45	100,00%	41,72%	-
2	ADS	17	2015	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - MEDI	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	243.477,98	75	100,00%	12,63%	-
3	AMC	191	2014	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRAD	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	80,09%	95,52%	-
4	AMC	274	2015	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	211.167,96	75	37,00%	34,48%	-
5	LP	1	2013	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	420	96,00%	84,10%	-
6	LP	2	2014	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	34.686.021,42	380	73,39%	56,34%	-
7	LP	3	2014	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	34.244.713,01	380	94,82%	80,02%	-
8	LP	4	2014	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	100,00%	98,90%	-
9	LP	5	2014	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	98,56%	57,57%	-
10	LP	7	2014	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	83,50%	48,64%	-
11	LP	12	2014	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	19.498.304,07	300	100,00%	73,67%	-
12	LP	14	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	75,32%	44,46%	-
13	LP	17	2014	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	99,71%	87,00%	-
14	LP	18	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	96,76%	72,08%	-
15	LP	19	2014	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	95,00%	57,66%	-
16	LP	20	2014	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	100,00%	67,35%	-
17	LP	21	2014	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYC	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	100,00%	92,25%	-
18	LP	27	2014	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	99,00%	75,98%	-
19	LP	28	2014	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	93,40%	44,71%	-
20	LP	30	2014	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CACI	JUANJUI	13.718.000,00	330	97,18%	77,88%	-
21	LP	33	2014	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO	LORETO	ALTO AMAZONA	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	100,00%	61,31%	-
22	LP	37	2014	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	100,00%	46,36%	-
23	LP	39	2014	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	85,76%	50,96%	-
24	LP	43	2014	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	18.528.862,34	360	65,62%	21,00%	-
25	LP	45	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	69,93%	59,00%	-
26	LP	48	2014	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	31.045.999,61	360	32,94%	9,50%	-
27	LP	10	2015	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	10.384.563,55	240	-	-	-
28	LP	11	2015	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	PUERTO MALDONA	20.349.000,00	360	0,07%	0,19%	-
29	LP	12	2015	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	29.570.000,00	390	-	-	-
30	LP	13	2015	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	18.800.000,00	360	0,65%	1,10%	-
31	LP	14	2015	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	28.810.627,03	360	2,90%	1,28%	-
32	LP	17	2015	IE MERCEDES INDACOCHEA - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	BARRANCO	2.291.015,39	120	15,69%	8,18%	-
33	LP	18	2015	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDON	21.205.941,35	360	3,91%	7,74%	-
34	LP	19	2015	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	13.743.544,16	270	3,99%	4,06%	-
35	LP	21	2015	IE REPUBLICA DE ARGENTINA - SALDO DE OBRA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	16.726.846,71	330	-	-	-
36	LP	24	2015	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	25.392.006,50	360	0,44%	1,19%	-
37	LP	26	2015	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	17.997.465,48	360	-	-	-
38	LP	30	2015	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y SALD	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	7.895.377,48	180	4,68%	2,32%	-
39	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	100,00%	94,43%	-

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la UGEO.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS
OBRAS EMBLEMATICAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Referencial	PLAZO Ejecución	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	AMC	264	2015	IE 86019 LA LIBERTAD - MURO DE CONTENCIÓN	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	54.312,51	24	-	-	POR INICIAR
2	LP	9	2015	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	21.498.797,95	360	-	-	EN PROCESO
3	LP	20	2015	IE SANTO TOMAS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	17.678.919,00	360	-	-	POR INICIAR
4	LP	28	2015	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	21.741.286,54	360	-	-	POR INICIAR
5	AMC	321	2015	IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA PISCINA	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	71.914,50	30	-	-	POR INICIAR
6	ADS	51	2015	IE DANIEL HERNANDEZ - MEDIA TENSION 10 KV	HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	272.883,94	75	-	-	EN PROCESO
7	LP	39	2015	IE AURELIO CARDENAS PACHAS - SALDO DE OBRA	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	3.939.529,54	120	-	-	EN PROCESO
8	LP	37	2015	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA - SALDO DE OBRA	TACNA	TACNA	TACNA	24.227.287,45	300	-	-	EN PROCESO
9	ADS	60	2015	SAN JUAN DE LA LIBERTAD - MEDIA TENSION 10-22.9KV	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	341.830,24	75	-	-	EN PROCESO
10	ADS	61	2015	LEONCIO PRADO - INSTALACION 02 ASCENSORES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	427.455,89	150	-	-	EN PROCESO

OBRAS EMBLEMATICAS

Panel Fotográfico - Obras en Ejecución

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Saldo de Obra de Adecuación, Mejoramiento, Sustitución y Obra Complementaria de la Infraestructura de la I.E. Emblematica Monseñor Atanasio Jáuregui, ubicada en Yurimaguas - Alto Amazonas - Loreto



Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, ubicada en la Región Huanuco, Provincia de Leoncio Prado, Distrito de Rupa Rupa.



Rumbo a la nota más alta



ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES




7.6 MUROS Y COLUMNAS

7.6.1 Emplantillado del Muro

El primer paso para levantar los muros de ladrillo es hacer el *emplantillado*, que consiste en la colocación de la primera fila de ladrillos.

Cuando trabajamos en el primer piso, el *emplantillado* se hace sobre el sobrecimiento y cuando estamos en el segundo piso, se realiza sobre la losa de techo.


El *emplantillado* debe quedar nivelado. Por lo que puede corregir al sobrecimiento o a la losa de techo si estos no lo están. También debe garantizar el buen trazo y las dimensiones correctas de los ambientes de la vivienda. De esta forma, servirá de guía para levantar el muro.

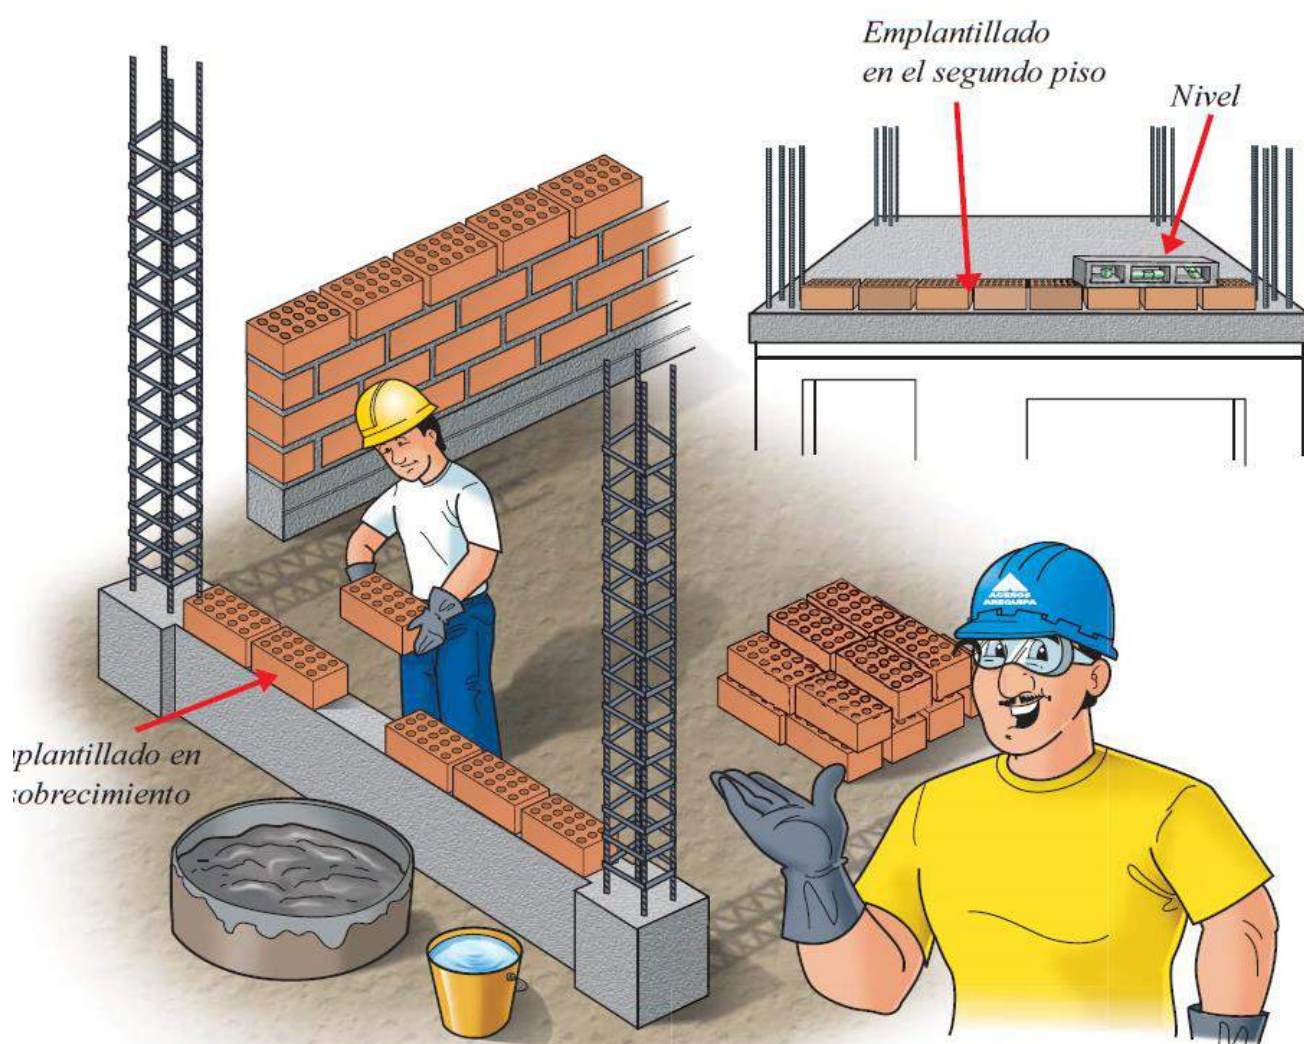

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES




7.6.2 Levantamiento del muro

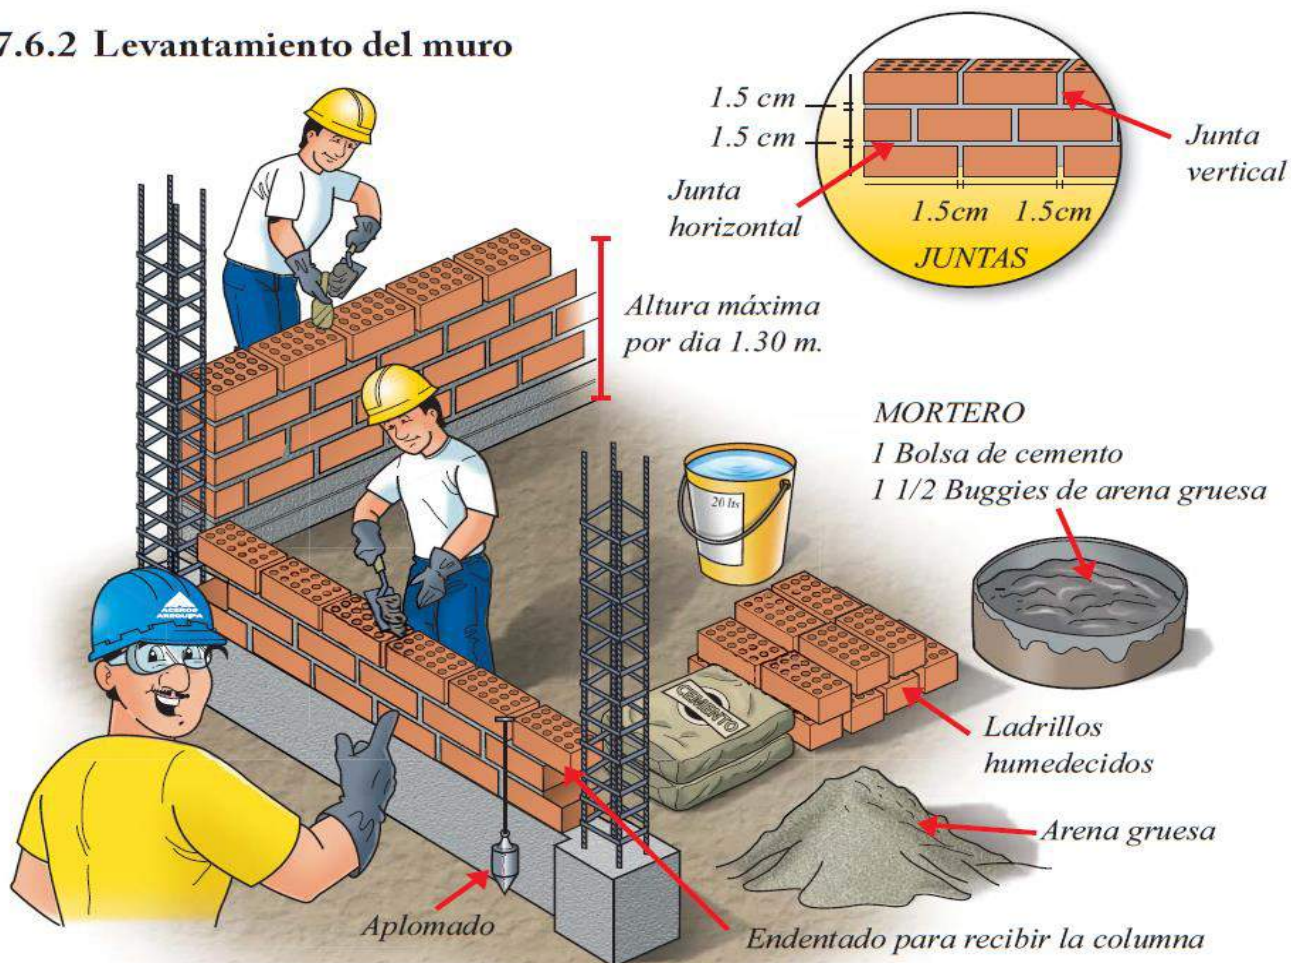

Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más usadas son amarre de soga y amarre de cabeza (Ver figura).

TIPOS DE AMARRES

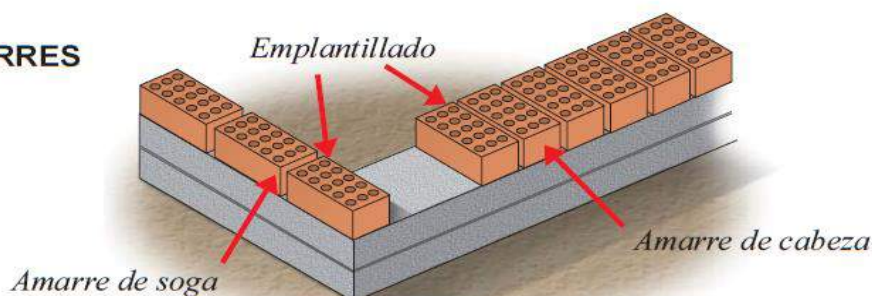


Para asentar los ladrillos primero hay que preparar el mortero, que tiene una proporción de 1 volumen de cemento por 5 volúmenes de arena gruesa; esto se logra usando 1 bolsa de cemento, 1 1/2 buggies de arena gruesa y la cantidad de agua necesaria para lograr una mezcla que permita un buen trabajo.

Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS

MORTEROS PARA MUROS:

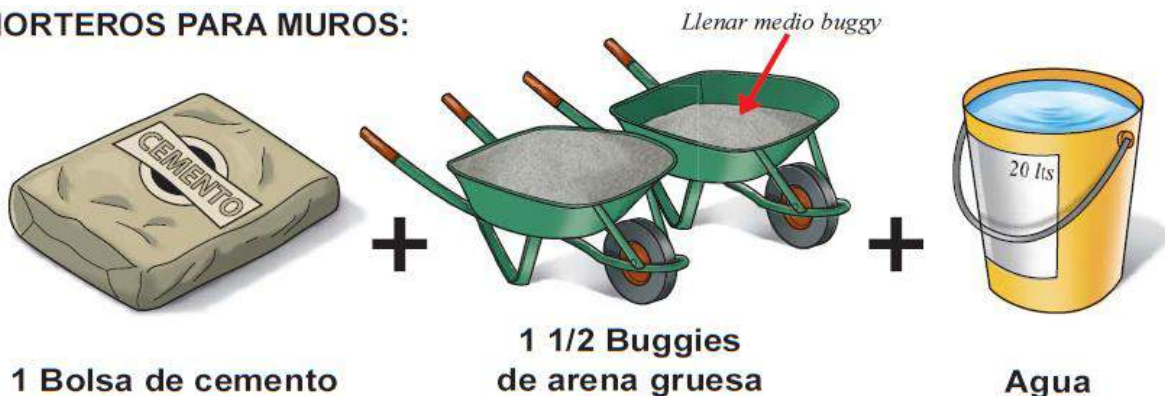


El levantamiento del muro se inicia extendiendo el mortero sobre el *emplantilla-do*. Los ladrillos deben humedecerse con agua antes de ser colocados, para evitar que el ladrillo seco absorba el agua del mortero, impidiendo una buena pega.

El espacio entre cada ladrillo debe ser de 1.5 cm aproximadamente. A este espacio se denomina junta y puede ser vertical u horizontal.

La altura máxima de un muro que se puede construir en una jornada de trabajo es de 1.3 m, que equivale a 12 ó 13 filas. El resto se completará al día siguiente. Esto se hace para que las hiladas superiores no compriman a las inferiores, adelgazando las juntas horizontales. Además, un muro con mortero fresco de más de 1.3 m de altura es inestable y peligroso.

Hay que tener presente que las juntas verticales deben quedar en medio del ladrillo de la fila inferior, esto garantiza un buen amarre de los ladrillos. Los extremos de los muros que terminan contra una *columna de amarre* deben quedar endentados en 5 cm como máximo.

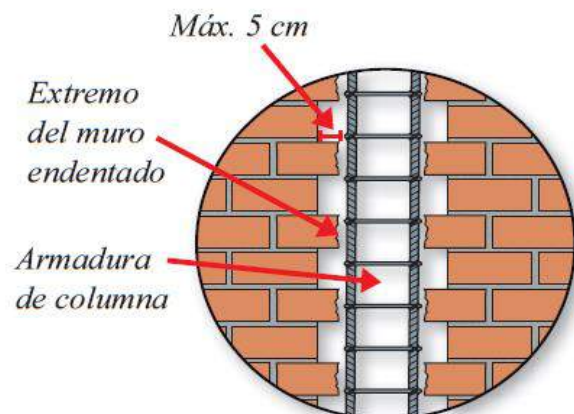

TEN EN CUENTA

Luego de cada jornada de trabajo, se debe verificar la verticalidad de los muros. El *desplome* no debe ser mayor de 4 mm en toda su altura.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

"Un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo".



PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRESO PARA TODOS

Trabajamos con responsabilidad y transparencia
por una educación de calidad



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO,
CONTAMOS CONTIGO!



Oficina General de Ética Pública y Transparencia

Rumbo a la nota más alta

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
