

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INFORME MENSUAL

Equipo de Ejecución de Obras

Febrero 2015



Unidad Gerencial de Estudios y Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

Contenido:

- 01.- Obras en Ejecución a Febrero 2015**
- 02.- Procesos de Convocatoria**
- 03.- Obras Terminadas en Febrero 2015**
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú**
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.**
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión**
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2015 (Febrero)**
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias**
- 09.- Términos y Definiciones.**
- 10.- Descripción Visual de Actividades realizadas en diversas Obras Civiles.**



Equipo de Ejecución de Obras - PRONIED
Anexo 25458 - Ans. Boris Alvarez Rodriguez



PERÚ

Ministerio
de Educación





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	31
2	PROGRAMA REGULAR	5
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	6
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		42

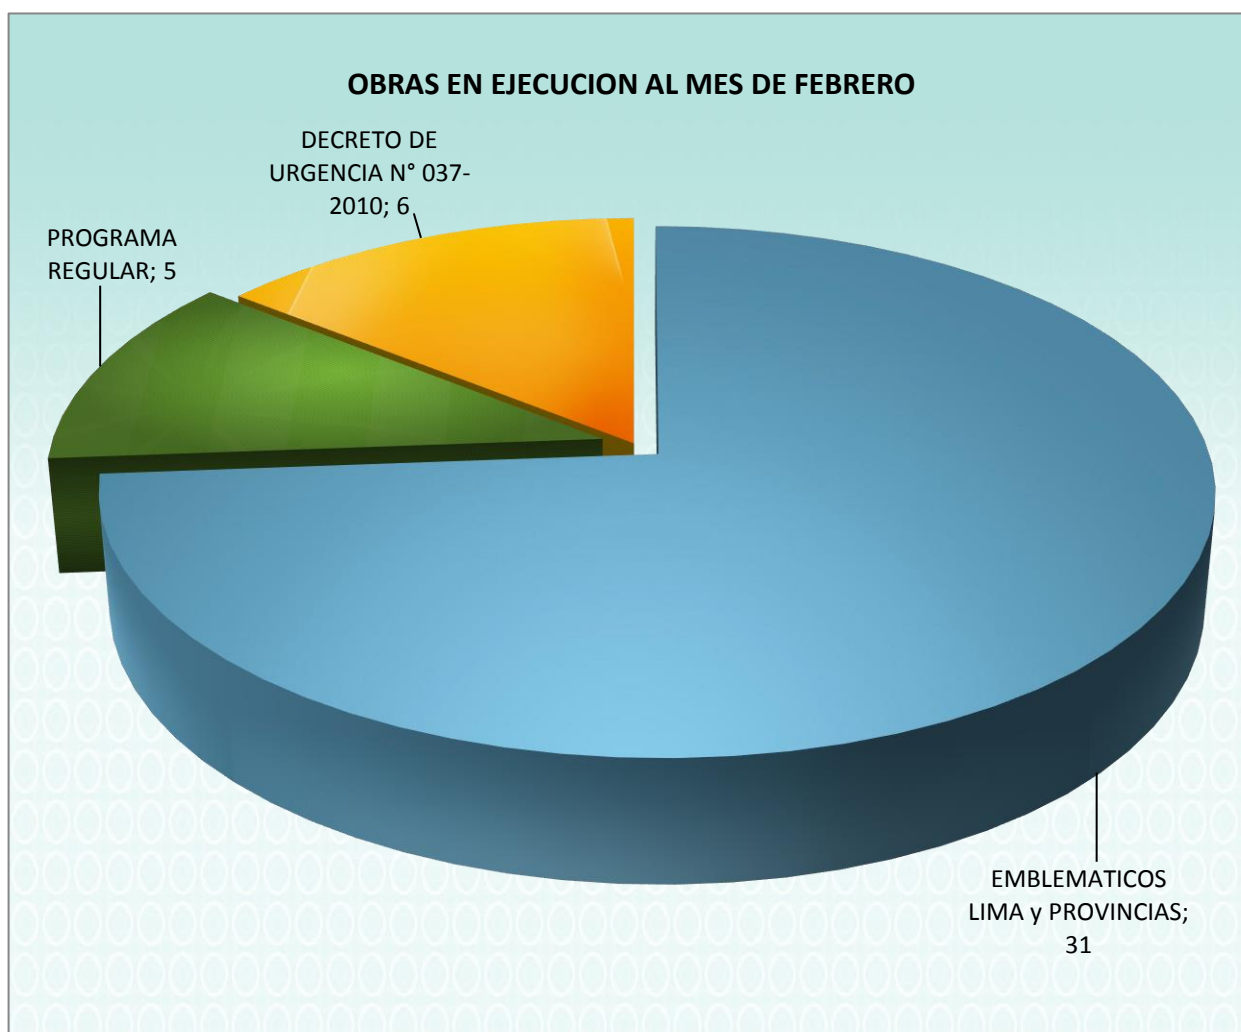

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito			Inicio	Fin	

EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS

1	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ	SAN NICOLAS	410.758,92	90	13/02/2015	13/05/2015	-
2	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	8.720.999,29	240	25/09/2014	22/05/2015	40,15%
3	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	24/01/2015	17/02/2016	1,07%
4	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	420	19/09/2013	18/02/2015	66,94%
5	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	210	08/04/2014	03/11/2014	73,47%
6	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO (P)	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	01/04/2014	24/02/2015	92,50%
7	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	360	04/07/2014	04/07/2015	19,08%
8	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	360	06/05/2014	09/05/2015	59,74%
9	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHIMBOTE	SANTIAGO DE CHIMBOTE	27.806.000,00	360	14/06/2014	08/06/2015	35,55%
10	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18.429.104,54	360	06/06/2014	31/05/2015	49,03%
11	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL CAYMA	34.686.021,42	380	03/02/2015	17/02/2016	-
12	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	34.244.713,01	380	16/12/2014	30/12/2015	4,11%
13	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	10/10/2014	04/10/2015	30,36%
14	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	15/10/2014	09/10/2015	13,40%
15	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	15/01/2015	10/11/2015	1,38%
16	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LUNA	19.498.304,07	300	27/11/2014	22/09/2015	6,12%
17	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	01/11/2014	28/06/2015	13,25%
18	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	04/12/2014	28/11/2015	4,85%
19	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	27/11/2014	22/09/2015	5,17%
20	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	20/12/2014	14/12/2015	4,12%
21	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	14/01/2015	08/01/2016	0,71%
22	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	24/12/2014	19/10/2015	3,01%
23	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISAY	11.344.620,60	300	04/12/2014	29/09/2015	5,81%
24	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	26/11/2014	20/11/2015	10,71%
25	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	13/01/2015	08/11/2015	1,15%
26	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	21/01/2015	15/01/2016	1,02%
27	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	30/12/2014	25/09/2015	1,55%
28	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	22/12/2014	18/08/2015	2,83%
29	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	04/01/2013	04/04/2015	94,39%
30	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	22/01/2013	04/03/2015	91,39%
31	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	420	19/01/2013	05/09/2014	78,76%

PROGRAMA REGULAR

1	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	881.530,86	75	05/12/2014	17/02/2015	47,85%
2	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv- 10Kv (P)	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296.149,36	75	14/08/2014	27/10/2014	-
3	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2.850.259,95	180	07/06/2014	12/04/2015	32,67%
4	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1.786.247,42	150	04/10/2014	02/03/2015	87,09%
5	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAS	CARHUAS	12.876.435,34	300	12/12/2014	07/10/2015	4,10%

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIFUN	1.104.233,95	90	04/12/2014	03/03/2015	50,03%
2	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5.896.843,66	180	04/11/2014	02/05/2015	21,82%
3	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5.586.133,51	180	14/05/2014	19/04/2015	65,28%
4	IE 7059 - JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIFUN	3.137.673,94	180	23/12/2014	20/06/2015	21,68%
5	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYN	CASTROVIRREYN	2.247.766,20	180	31/12/2014	28/06/2015	6,43%
6	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	5.844.004,16	240	20/01/2015	16/09/2015	6,29%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la UGEO.

-(P) = Obra Paralizada.

**PERÚ**Ministerio de
Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional


Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	3
2	POR CONVOCAR	26
TOTAL DE OBRAS EN PROCESO		29

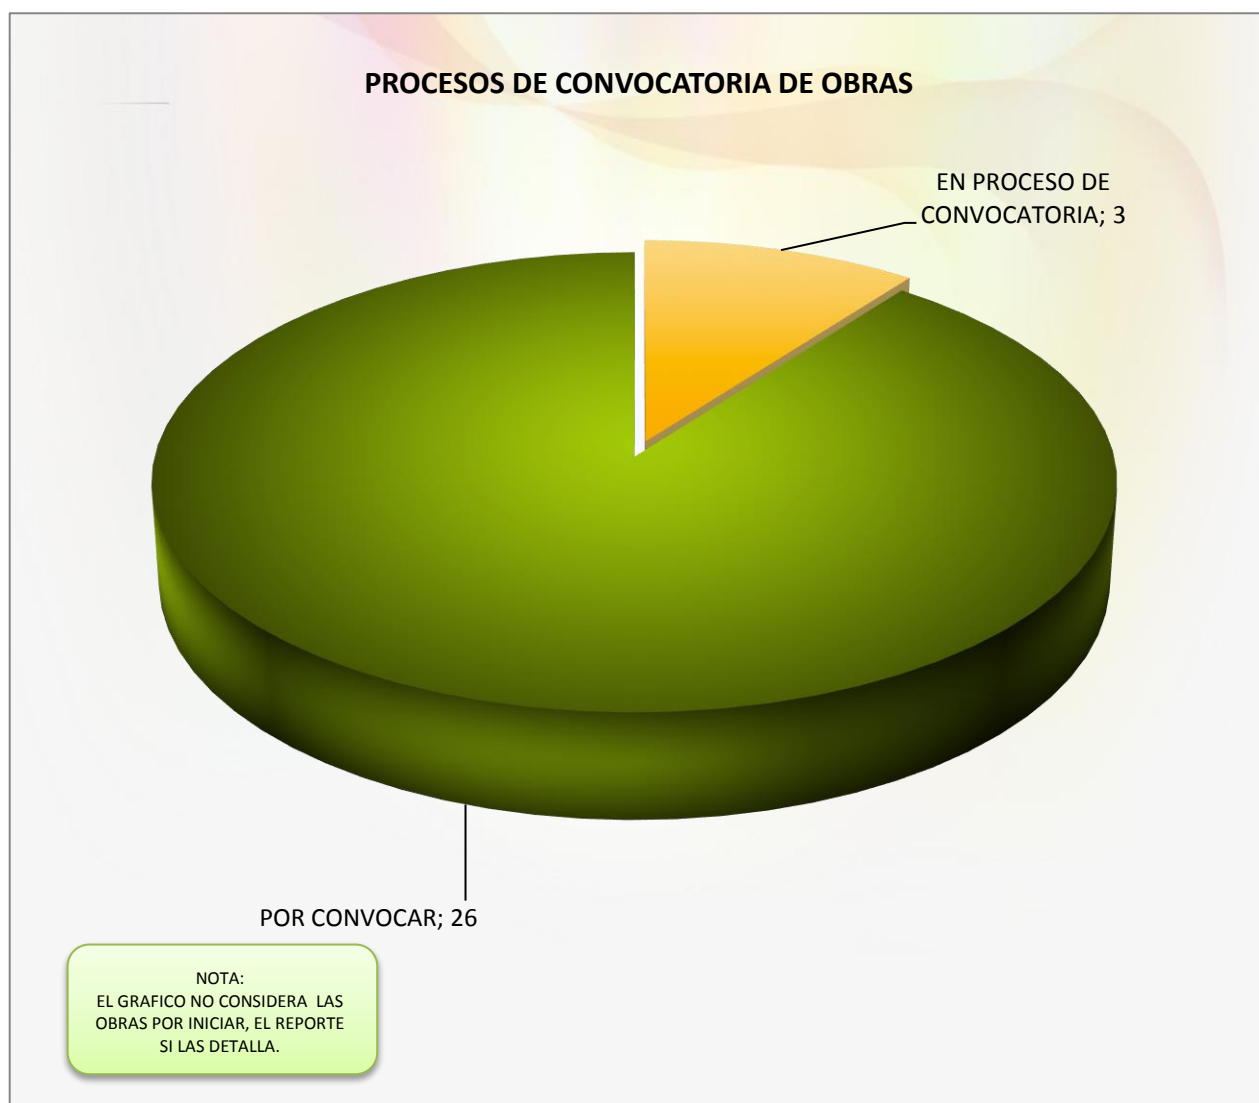

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



REPORTE DE PROCESOS EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Procesos en Convocatoria y Obras por Iniciar:

	EMBLEMATICAS - LIMA	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	031058	013-2014-UGEO	11/11/2014	1.305.954,62	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 27/01/2015 a Pro Building S.A.C. Monto Adjudicado S/. 1'175,359.16
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	021465	0215-2014-ED	14/05/2014	16.189.378,22	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 28/10/2014 a Consorcio Juanjui (Proconces E.I.R.L. - Huracan Inversiones E.I.R.L. - Contratista Atlas E.I.R.L. - Comeco SR.LTDA.) Monto Adjudicado S/. 13,718,000.00
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	022190	0249-2014-ED	04/06/2014	28.615.249,50	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 03/12/2014 a Consorcio TCT Amazonia (Terrak S.A.C. - Torres Camara y Cia de Obras S.A. Sucursal del Perú) Monto Adjudicado S/. 24,490,288.53
	EMBLEMATICAS - PROV.	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	029417	007-2014-UGEO	15/10/2014	8.876.818,95	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 27/01/2015 a Consorcio Inti (Grecia Contratistas Generales SRL - Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA, Sucursal del Perú - Project Construction S.A.C. Monto Adjudicado S/. 7'989,137.06
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	027857	005-2014-UGEO	29/09/2014	25.120.109,35	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 19/01/2015 a Consorcio MATH - TERRATS (MATH Construcción y Consultoría SAC - Hijos de TERRATS Construcciones S.A. Sucursal del Perú) Monto Adjudicado S/. 22,608,098.42
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	024904	014-2014-UGEO	02/12/2014	3.542.348,60	Buena Pro otorgada el 04/02/2015 a Consorcio Piura (Candiotti Group Sociedad Anónima Cerrada - Candiotti Group S.A.C. - Carlos Ovidio Salas Hurtado) Monto Adjudicado S/. 3'188,113.74
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	029009	008-2014-UGEO	15/10/2014	34.495.555,12	Evaluación de Propuestas
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	028057	006-2014-UGEO	01/10/2014	20.587.624,82	Buena pro otorgada el 04/02/2015 a Consorcio GLC (Multiobras S.A. Contratistas Generales - Extraco S.A. Sucursal Perú) Monto Adjudicado S/. 18'528,862.34

02.- Procesos por Convocar :

1	PROGRAMA REGULAR	IE JOHN F. KENNEDY - SISTEMA MEDIA TENSION	ICA	022996	0265-2014-ED	19/06/2014	239.551,46	Proceso por Convocar
2	EMBLEMATICAS - PROV.	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	024788	0295-2014-ED	09/07/2014	212.776,37	Proceso por Convocar
3	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	019824	009-2014-UGEO	24/10/2014	201.709,62	Proceso por Convocar
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	032381	016-2014-UGEO	11/12/2014	26.074.595,34	Proceso por Convocar
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	031779	010-2014-UGEO	10/11/2014	23.444.087,11	Proceso por Convocar
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	033273	0004-2015-UGEO	13/01/2015	11.538.403,94	Proceso por Convocar
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SANTO TOMAS	CUSCO	032524	0018-2014-UGEO	15/12/2014	19.596.392,82	Proceso por Convocar
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN RAMON	JUNIN	033272	0003-2015-UGEO	13/01/2015	35.342.530,15	Proceso por Convocar
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GENARO HERRERA	LORETO	032383	015-2014-UGEO	11/12/2014	21.420.377,34	Proceso por Convocar
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	033270	001-2015-UGEO	08/01/2015	22.961.307,11	Proceso por Convocar
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	031119	012-2014-UGEO	10/11/2014	32.835.984,47	Proceso por Convocar
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	032382	017-2014-UGEO	12/12/2014	21.498.797,95	Proceso por Convocar
13	EMBLEMATICAS - PROV.	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	033117	011-2014-UGEO	10/11/2014	15.084.419,51	Proceso por Convocar
14	PROGRAMA REGULAR	IE 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION - MEDIA TENSION	LIMA	019825	0038-2014-ED	28/01/2014	200.091,04	Proceso por Convocar
15	PROGRAMA REGULAR	IE 22468 MARIA PARADO DE BELLIDO - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	ICA	026471	0179-2014-ED	22/04/2014	228.388,05	Proceso por Convocar
16	PROGRAMA REGULAR	IE 20191 ALFONSO UGARTE - MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	LIMA	019819	0269-2014-ED	24/06/2014	242.998,49	Proceso por Convocar
17	EMBLEMATICAS - PROV.	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	027759	001-2014-UGEO	15/09/2014	1.613.854,44	Proceso por Convocar
18	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	033271	002-2015-UGEO	13/01/2015	1.306.464,55	Proceso por Convocar
19	PROGRAMA REGULAR	IE CASA BLANCA DE JESUS	LIMA	033274	005-2015-UGEO	13/01/2015	3.082.946,41	Proceso por Convocar
20	PROGRAMA REGULAR	IE GUILLERMO BILLINGHURST	LIMA	033269	006-2015-UGEO	13/01/2015	12.766.909,41	Proceso por Convocar



PERÚ

Ministerio de Educación

REPORTE DE PROCESOS **EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR**

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INF Obras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	
21	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	033478	0009-2015-UGEO	30/01/2015	32.011.807,81	Proceso por Convocar
22	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	033479	0010-2015-UGEO	30/01/2015	34.799.693,40	Proceso por Convocar
23	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	033475	007-2015-UGEO	30/01/2015	22.583.814,36	Proceso por Convocar
24	PROGRAMA REGULAR	IE 153	LIMA	033476	008-2015-UGEO	30/01/2015	1.829.935,42	Proceso por Convocar
25	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS - MEDIA TENSION	APURIMAC	033790	012-2015-UGEO	19/02/2015	196.148,57	Proceso por Convocar
26	PROGRAMA REGULAR	IE 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA	LIMA	033787	011-2015-UGEO	10/02/2015	2.855.164,62	Proceso por Convocar
29								



PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Febrero 2015

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	2
2	PROGRAMA REGULAR	0
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	0
TOTAL OBRAS TERMINADAS		2



Equipo de Ejecución de Obras - PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DEL MES DE ENERO A FEBRERO 2015

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	-
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	-

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	(1)
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	(2)
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	(3)
4	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	(4)

(*) Obras en proceso de recepcion de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) CONTRATO DE OBRA RESUELTO : CON OFICIO N°0046-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DE FECHA 30-12-2014, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

(2) CONTRATO DE OBRA RESUELTO - MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°0023-2015-MINEDU-PRONIED-OGA DEL 12-01-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA.

(3) CONTRATO RESUELTO, CON MEMORANDUM N°0714-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA 20-02-2015, SE SOLICITA A LA OGA, CURSAR CARTA NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA AL HABERSE ACUMULADO MAS DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - EXP. 6653-2015, (CARTA NOTARIAL N°0063-2015-PRONIED-DE-OGA DEL 23-02-2015)

(4) CONTRATO RESUELTO - CON OFICIO N°053-2015-PRONIED-OGA DEL 16-02-2015, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE LA OBRA. (CON MEMORANDUM N°0604-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DE FECHA 12-02-2015, SE SOLICITA A LA OGA, DECLARE RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA Y PROGRAME LA CONSTATACION FISICA DEL 24 AL 27 FEBRERO). EXP. 5431-2015.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Se vienen ejecutando a la fecha

42

Obras de Infraestructura Educativa

Equipo de Ejecución de Obras





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE FEBRERO 2015



Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS - PROV.	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODRIGUEZ	SAN NICOLAS	-
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	5,17%
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	4,12%
4	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	4,10%
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	91,39%
6	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	21,82%
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	1,38%
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	1,15%
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	30,36%
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	13,40%
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	4,85%
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	78,76%
13	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	59,74%
14	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	94,39%
15	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCANELICA	TAYACAJA	PAMPAS	3,01%
16	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCANELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	6,43%
17	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	2,83%
18	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	1,07%
19	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO (P)	HUANUCO	AMBO	AMBO	92,50%
20	EMBLEMATICAS - PROV.	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	13,25%
21	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	0,71%
22	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	47,85%
23	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	87,09%
24	EMBLEMATICAS - PROV.	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	40,15%
25	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	10,71%
26	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	73,47%
27	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUC	SANTIAGO DE CHUC	35,55%
28	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	6,12%
29	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	50,03%
30	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv (P)	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	-
31	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	65,28%
32	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	32,67%
33	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	49,03%
34	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	-
35	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	4,11%
36	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 - JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAFLORES	21,68%
37	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	LIMA	PACHACAMAC	6,29%
38	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	1,55%
39	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	66,94%
40	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISAPATA	5,81%
41	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	1,02%
42	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	19,08%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la UGEO.



PERÚ

Ministerio de
Educación



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	10 ➡		
			10	20%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	32	80%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			42	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

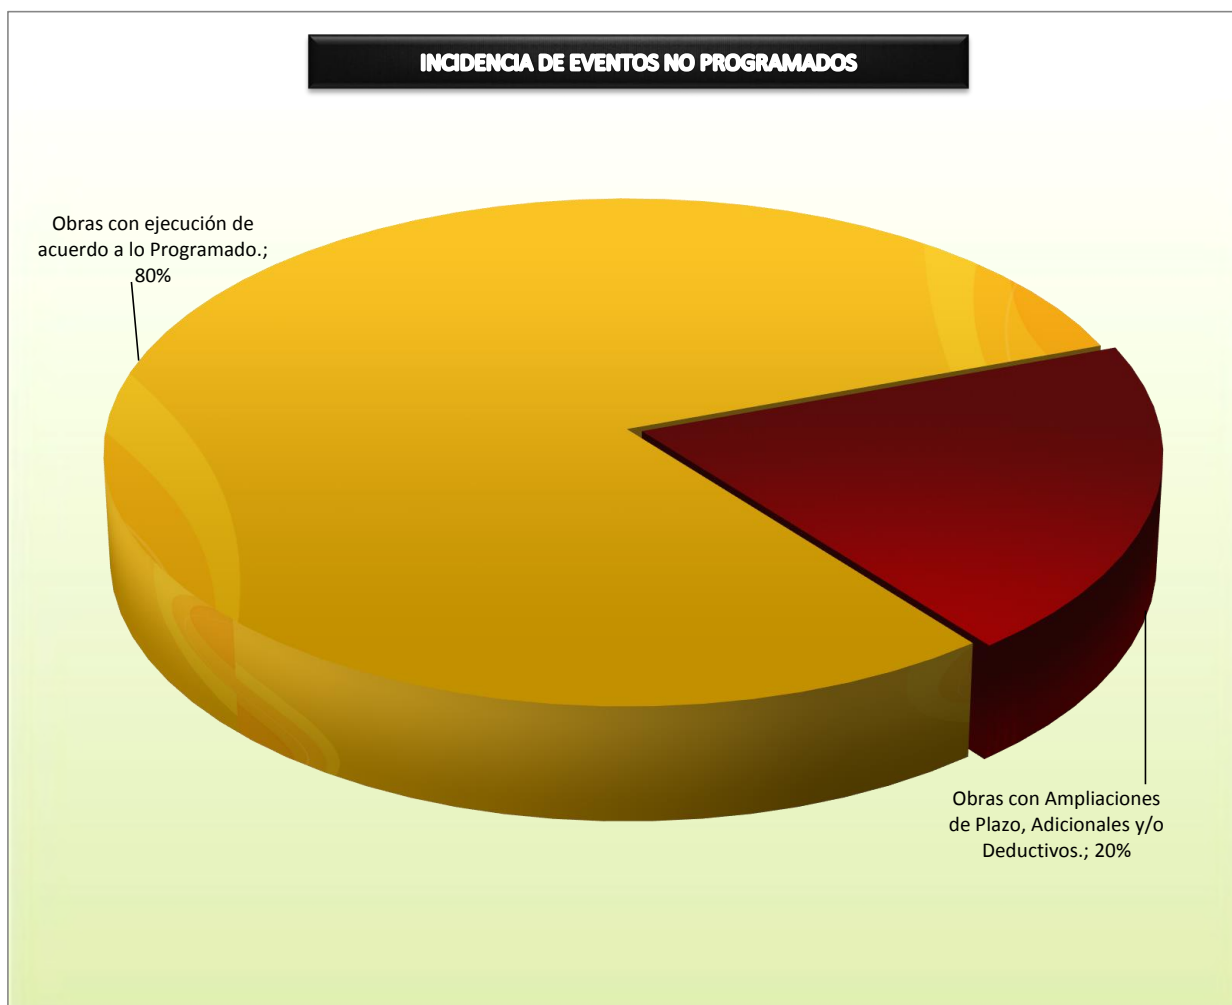

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra , pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construcción, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Febrero 2015)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - FEB	1	1	2 (*)
		1	1	2

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.



**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - FEBRERO 2015)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO
				Contratado	Resolucion	Fecha	Liquidacion Final
01.- OBRA							
1	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	APURIMAC	3.441.687,51	RD-0022-2015-ED	22/01/2015	3.587.658,05
2	-	-	-	-	-	-	-
02.- SUPERVISION							
1	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. - OIST S.A.	AREQUIPA	1.760.437,89	RD-0035-2015-ED	03/02/2015	1.643.655,36
2	-	-	-	-	-	-	-

**PERÚ**Ministerio
de Educación

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2015


Resumen :

PERIODO		OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01.-	PERIODO - 2006	44	48.465.534,33
02.-	PERIODO - 2007	64	52.142.241,97
03.-	PERIODO - 2008	25	40.765.868,98
04.-	PERIODO - 2009	29	61.225.516,19
05.-	PERIODO - 2010	67	243.203.569,79
06.-	PERIODO - 2011	42	589.848.336,93
07.-	PERIODO - 2012	36	390.716.522,88
08.-	PERIODO - 2013	29	289.457.225,51
09.-	PERIODO - 2014	15	240.345.411,33
10.-	PERIODO - 2015 (Febrero)	2	66.987.024,66
Total Obras e Inversión Estimada		353	2.023.157.252,57

(*) No Estan consideradas las Obras Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras - UGEO

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

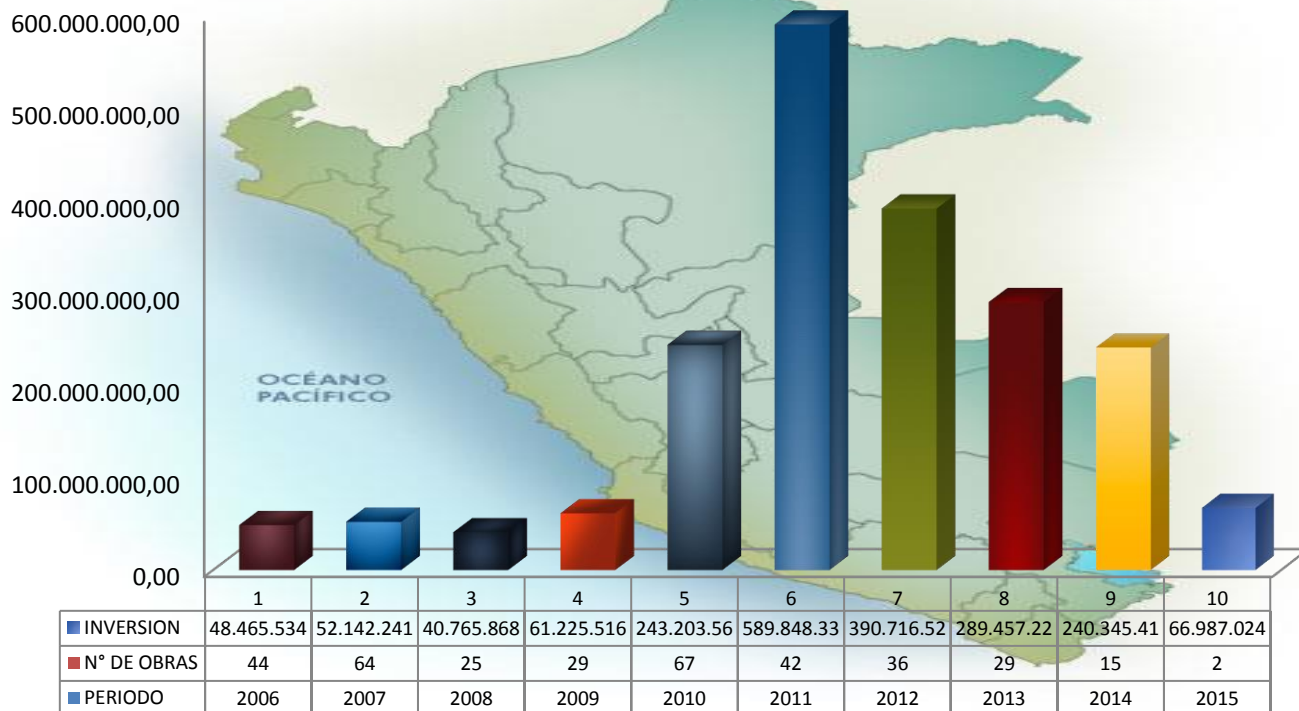

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboracion de Expediente Técnico, Ejecucion de Obra y Supervisión, así como importes generados por Obras Adicionales etc.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

OBRAS EMBLEMATICAS



Lima y Regiones al Mes de Febrero 2015

RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	3	2	49
2	REGIONES	46	28	22	96
Totales :		90	31	24	145

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS A NIVEL NACIONAL

EN EJECUCION; 31;
21%POR EJECUTAR; 24;
17%TERMINADAS; 90;
62%

INDICE DE INTERVENCION DE OBRAS EMBLEMATICAS EN LIMA y REGIONES DEL PERU

REGIONES; 96; 66%

LIMA y Provincias;
49; 34%**PERÚ**Ministerio
de Educación

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Febrero 2015




RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	3	2	49
2	REGIONES	46	28	22	96
Totales :		90	31	24	145

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
EN LIMA PROVINCIAS**

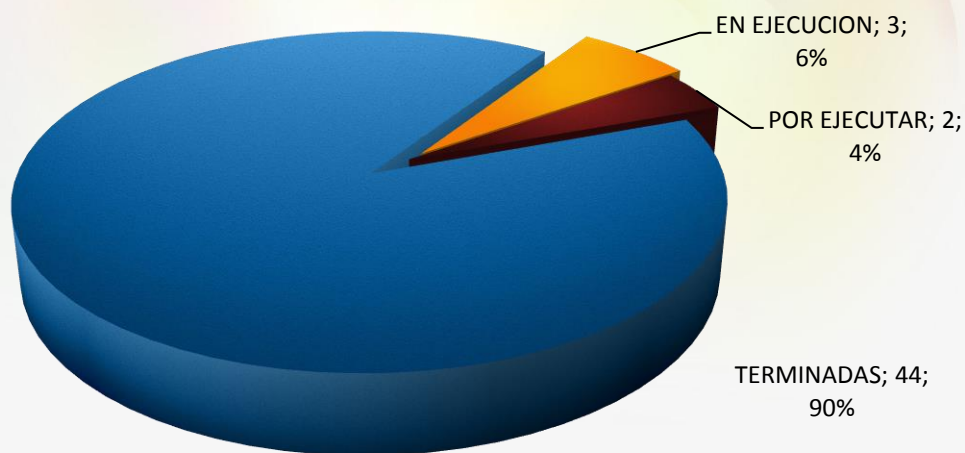

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS
PROVINCIAS**

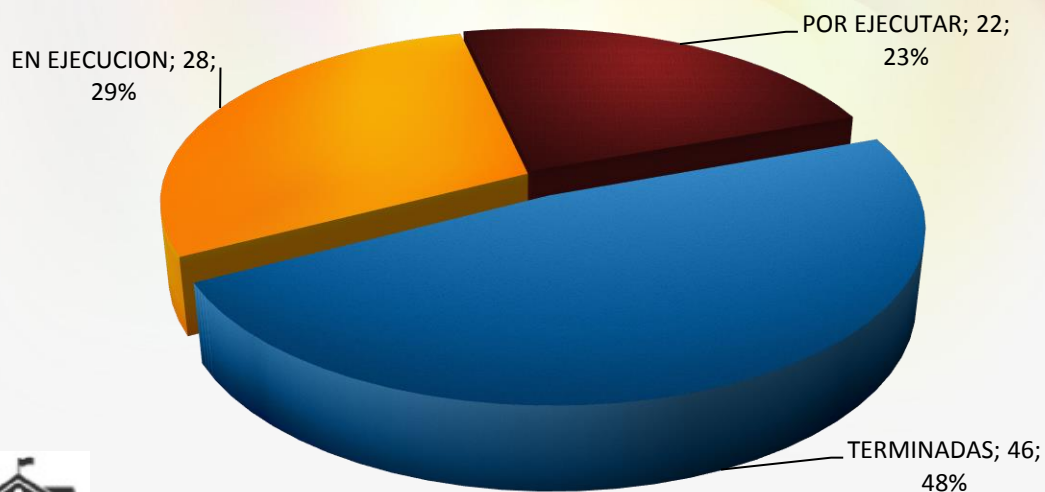

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS TERMINADAS



Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242.850,10	90	100,00%	100,00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	35	100,00%	100,00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19.247.752,85	240	100,00%	100,00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10.984.825,12	240	100,00%	100,00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7.499.087,49	240	100,00%	100,00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14.698.756,22	270	100,00%	100,00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17.809.857,86	240	100,00%	100,00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST.	24.850.130,00	300	100,00%	100,00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44.922.369,46	288	100,00%	100,00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56.895.969,19	420	100,00%	100,00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	7.546.407,26	240	100,00%	100,00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12.552.231,68	240	100,00%	100,00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22.606.616,90	210	100,00%	100,00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18.733.216,84	300	100,00%	100,00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553.458,16	60	100,00%	100,00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8.498.883,99	180	100,00%	100,00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54.450.760,00	360	100,00%	100,00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7.725.531,18	240	100,00%	100,00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16.352.313,60	300	100,00%	100,00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28.760.197,28	360	100,00%	100,00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27.303.268,20	300	100,00%	100,00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20.567.329,08	300	100,00%	100,00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39.709.126,15	300	100,00%	100,00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10.819.997,45	270	100,00%	100,00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODRI	SAN NICOLAS	21.830.737,21	270	100,00%	100,00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5.192.205,06	180	100,00%	100,00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22.087.820,38	330	100,00%	100,00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5.803.114,30	180	100,00%	100,00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9.966.975,86	240	100,00%	100,00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15.001.252,09	150	100,00%	100,00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15.716.683,73	240	100,00%	100,00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2.762.375,59	120	100,00%	100,00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12.926.017,97	180	100,00%	100,00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109.160,87	45	100,00%	100,00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	270	100,00%	100,00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193.598,06	45	100,00%	100,00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	360	100,00%	100,00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2.546.695,38	120	100,00%	100,00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77.103,64	30	100,00%	100,00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	420	100,00%	100,00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196.003,67	45	100,00%	100,00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6.950.503,23	180	100,00%	100,00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14.730.418,50	240	100,00%	100,00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10.598.133,02	240	100,00%	100,00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13.274.564,17	270	100,00%	100,00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11.568.701,69	240	100,00%	100,00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10.386.423,92	210	100,00%	100,00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13.699.468,94	240	100,00%	100,00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7.669.799,25	180	100,00%	100,00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.540.886,61	270	100,00%	100,00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6.450.213,48	180	100,00%	100,00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16.102.546,53	270	100,00%	100,00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18.976.461,40	270	100,00%	100,00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13.767.910,99	240	100,00%	100,00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12.337.712,85	180	100,00%	100,00%	27/09/2011
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5.955.773,30	45	100,00%	100,00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2.727.463,60	75	100,00%	100,00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3.775.993,03	90	100,00%	100,00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUE	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3.723.072,73	90	100,00%	100,00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8.121.877,69	120	100,00%	100,00%	21/01/2011

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14.489.268,00	300	100,00%	100,00%	20/02/2012
62	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.224.843,00	240	100,00%	100,00%	21/09/2011
63	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29.943.516,23	270	100,00%	100,00%	13/02/2013
64	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14.955.474,15	240	100,00%	100,00%	25/08/2011
65	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920.031,48	30	100,00%	100,00%	28/10/2010
66	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2.677.215,75	150	100,00%	100,00%	03/10/2011
67	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26.519.751,67	300	100,00%	100,00%	01/04/2013
68	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28.750,88	20	100,00%	100,00%	24/11/2011
69	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3.569.179,06	90	100,00%	100,00%	17/05/2011
70	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19.932.413,36	300	100,00%	100,00%	23/04/2014
71	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33.382.049,92	360	100,00%	100,00%	02/04/2014
72	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6.785.340,79	120	100,00%	100,00%	29/12/2011
73	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8.206.571,31	270	100,00%	100,00%	10/10/2012
74	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26.740.032,38	360	100,00%	100,00%	04/09/2013
75	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17.676.984,47	270	100,00%	100,00%	07/01/2013
76	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979.595,01	90	100,00%	100,00%	09/01/2012
77	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5.695.943,21	150	100,00%	100,00%	04/05/2012
78	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6.094.843,57	150	100,00%	100,00%	09/08/2012
79	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DE	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4.013.808,33	90	100,00%	100,00%	08/11/2012
80	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1.969.105,31	120	100,00%	100,00%	21/03/2012
81	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1.079.857,24	45	100,00%	100,00%	11/04/2012
82	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4.884.836,81	240	100,00%	100,00%	11/02/2014
83	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3.757.857,00	120	100,00%	100,00%	06/11/2012
84	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURICO	20.829.352,78	330	100,00%	100,00%	11/08/2014
85	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	330	100,00%	100,00%	19/12/2014
86	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	360	100,00%	100,00%	30/01/2015
87	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	360	100,00%	100,00%	06/02/2015
88	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	360	100,00%	100,00%	-
89	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	360	100,00%	100,00%	-
90	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	360	100,00%	100,00%	-



Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS

OBRAS EN EJECUCION - INSTITUCIONES EMBLEMATICAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	89	2014	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - A) AMP. POT	AMAZONAS	TORIBIO RODR	SAN NICOLAS	410.758,92	90	-	-	-
2	AMC	56	2014	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	8.720.999,29	240	43,77%	40,15%	-
3	AMC	191	2014	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRAD	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	0,12%	1,07%	-
4	LP	1	2013	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	420	92,91%	66,94%	-
5	LP	25	2013	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	210	100,00%	73,47%	-
6	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	100,00%	92,50%	-
7	LP	33	2013	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	360	47,74%	19,08%	-
8	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCIO	SANTA ANA	22.630.000,00	360	67,72%	59,74%	-
9	LP	35	2013	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE C	SANTIAGO DE CHUC	27.806.000,00	360	60,72%	35,55%	-
10	LP	36	2013	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18.429.104,54	360	51,42%	49,03%	-
11	LP	2	2014	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	34.686.021,42	380	-	-	-
12	LP	3	2014	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	34.244.713,01	380	3,85%	4,11%	-
13	LP	4	2014	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	29,62%	30,36%	-
14	LP	5	2014	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	14,63%	13,40%	-
15	LP	7	2014	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	1,25%	1,38%	-
16	LP	12	2014	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLC	19.498.304,07	300	5,90%	6,12%	-
17	LP	13	2014	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	14,54%	13,25%	-
18	LP	14	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	5,50%	4,85%	-
19	LP	15	2014	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	6,13%	5,17%	-
20	LP	17	2014	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	5,13%	4,12%	-
21	LP	18	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	0,36%	0,71%	-
22	LP	19	2014	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	1,91%	3,01%	-
23	LP	20	2014	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	8,17%	5,81%	-
24	LP	21	2014	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	5,49%	10,71%	-
25	LP	27	2014	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	1,84%	1,15%	-
26	LP	28	2014	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	0,55%	1,02%	-
27	LP	33	2014	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO	LORETO	ALTO AMAZON	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	1,55%	1,55%	-
28	LP	37	2014	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	3,24%	2,83%	-
29	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	96,00%	94,39%	-
30	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	99,08%	91,39%	-
31	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	420	100,00%	78,76%	-

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la USOM.

OBRAS EMBLEMATICAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	ADP	50	2014	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.175.359,16	120	-	-	POR INICIAR
2	LP	30	2014	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CAC	JUANJUI	13.718.000,00	330	-	-	POR INICIAR
3	LP	39	2014	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	24.490.288,53	360	-	-	POR INICIAR
4	LP	45	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	22.608.098,42	360	-	-	POR INICIAR
5	LP	46	2014	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	7.989.137,06	180	-	-	POR INICIAR
6	AMC	278	2013	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	201.709,62	45	-	-	-
7	LP	43	2014	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	20.587.624,82	360	-	-	-
8	ADS	87	2014	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	212.776,37	60	-	-	-
9	LP	48	2014	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	34.495.555,12	360	-	-	-
10	-	-	-	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	26.074.595,34	360	-	-	-
11	-	-	-	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLEND	23.444.087,11	360	-	-	-
12	-	-	-	IE JUAN UGAZ	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	11.538.403,94	240	-	-	-
13	-	-	-	IE SANTO TOMAS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	19.596.392,82	360	-	-	-
14	-	-	-	IE SAN RAMON	JUNIN	TARMA	TARMA	35.342.530,15	390	-	-	-
15	-	-	-	IE FRANCISCO DE IRAZOLA	JUNIN	SATIPO	SATIPO	34.799.693,40	390	-	-	-
16	-	-	-	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	21.420.377,34	360	-	-	-
17	-	-	-	IE GUILLERMO BILLINGHURST	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	PUERTO MALDONA	22.961.307,11	360	-	-	-
18	-	-	-	IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	PIURA	SULLANA	SULLANA	32.011.807,81	360	-	-	-
19	-	-	-	IE SANTO TORIBIO	SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	22.583.814,36	360	-	-	-
20	-	-	-	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	32.835.984,47	420	-	-	-
21	-	-	-	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	21.498.797,95	360	-	-	-
22	-	-	-	GUE SAN CARLOS - II ETAPA	PUNO	PUNO	PUNO	15.084.419,51	270	-	-	-
23	-	-	-	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1.613.854,44	120	-	-	-
24	-	-	-	IE GONZALES VIGIL - II ETAPA - PISTA ATLETICA SINTETICA	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1.306.464,55	45	-	-	-

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES



7. CIMIENTOS

Se denomina cimientos a una parte de la estructura que tiene como misión transmitir adecuadamente el peso de la edificación al terreno.

Los cimientos de una casa siempre deben estar apoyados en terreno natural y firme; por ningún motivo pueden descansar sobre rellenos.

Debido a que la resistencia del suelo generalmente es menor que la de la estructura que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación siempre será más grande que los elementos soportados.

7.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

a. Ubicación de agua y desagüe


Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles.

b. Excavación de zanjas

La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en los planos. La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas).

Tal como se explicó en el capítulo 4, generalmente cuando se tiene un terreno ubicado en ladera, antes de la construcción de la vivienda, se efectúan los trabajos de corte y relleno para obtener una o más plataformas niveladas, las que son soportadas en sus bordes por muros de contención.

En estos casos es de suma importancia que el fondo de la excavación no se quede en las zonas de relleno, ya que con el tiempo o con un sismo, la parte de la casa ubicada sobre suelo rellenado se asentará, produciendo graves rajaduras (ver figura 68).

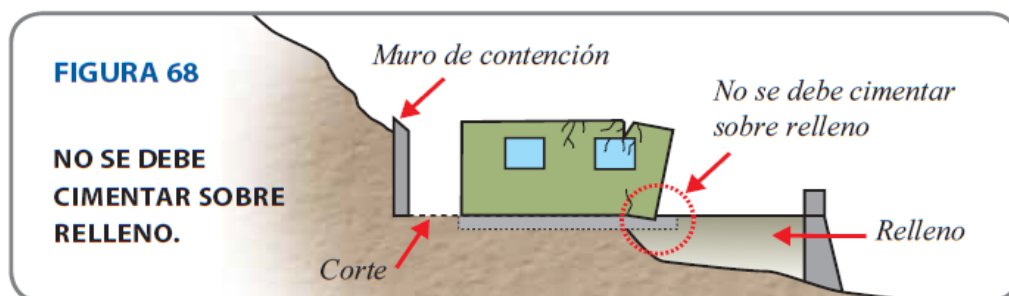



ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES

Por este motivo, aún cuando sea muy trabajoso, hay que excavar transpasando todo el relleno hasta llegar a suelo natural y firme.

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado.

Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto.

c. Apisonado

El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre (ver figura 69).



d. Eliminación de material excedente

El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos. Con ello, además, facilitamos la circulación de los trabajadores al momento de vaciar la zanja.

Luego de haber seleccionando el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados.

Consideraciones:

- No se debe cimentar sobre suelo con excesiva materia orgánica (residuos de plantas o animales), desmorte o relleno, porque no soportará el peso de la edificación.
- Las zonas de relleno pueden servir para vaciar los pisos, pero nunca para apoyar los cimientos.
- Cuando se realicen las excavaciones con profundidades superiores a 1.5 m, hay que tomar precauciones para evitar accidentes por probables derrumbes de las paredes.

Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS


12. ESCALERAS

La escalera de concreto es una losa dentada e inclinada, que nos permite subir o bajar de un nivel a otro.

Una escalera está conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por escalones; y los escalones, por pasos y contrapasos (ver figura 107).

FIGURA 107

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UNA ESCALERA.

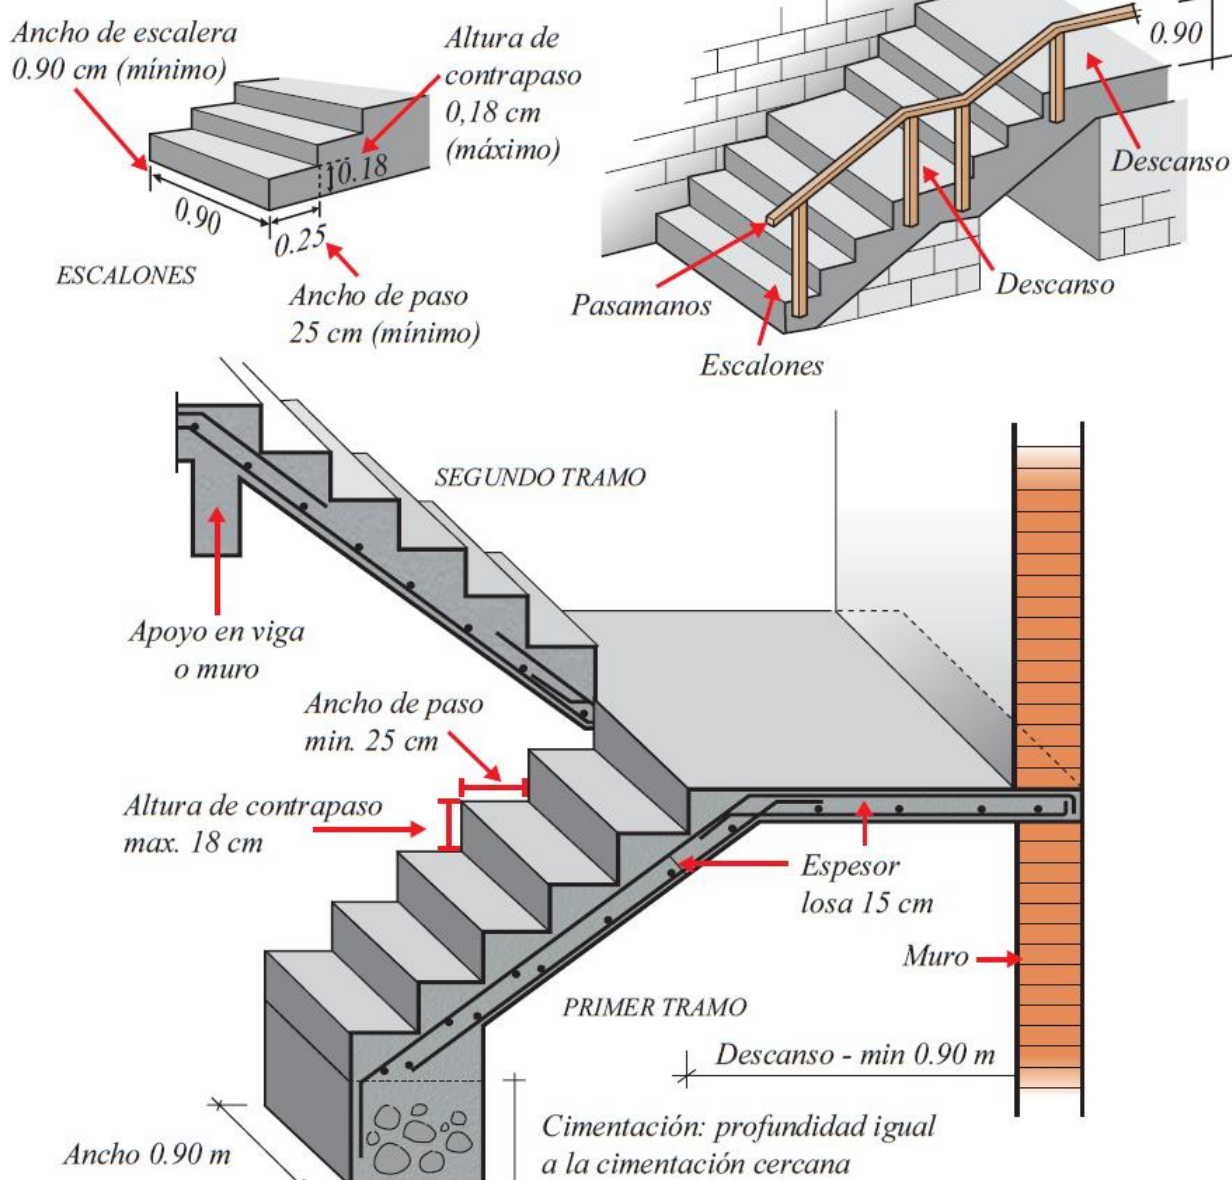



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016"

"Si quieres llegar rápido, camino solo.
Si quieres llegar lejos camina en grupo".

- Proverbio Africano



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROGRESO
PARA TODOS

Trabajamos con responsabilidad y transparencia
por una educación de calidad



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO,
CONTAMOS CONTIGO!



Oficina General de Ética Pública y Transparencia
