

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"



INFORME MENSUAL

Equipo de Ejecución de Obras

Diciembre 2014



Unidad Gerencial de Estudios y Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

Contenido:

- 01.- Obras en Ejecución a Diciembre 2014**
- 02.- Procesos de Convocatoria**
- 03.- Obras Terminadas de Ene. - Dic. 2014**
- 04.- Obras en Ejecución por Regiones del Perú**
- 05.- Incidencia de Eventos no Programados durante la Ejecución de Obra.**
- 06.- Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión**
- 07.- Resumen Obras Ejecutadas 2006 - 2014 (Diciembre)**
- 08.- Obras Emblemáticas Lima y Provincias**
- 09.- Términos y Definiciones.**
- 10.- Descripción Visual de Actividades y/o de elementos empleados en diversas Obras Civiles**



Equipo de Ejecución de Obras - PRONIED
Anexo 25458 - Ans. Boris Alvarez Rodriguez



PERÚ

Ministerio
de Educación





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

01.- OBRAS EN EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS	29
2	PROGRAMA REGULAR	5
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	5
TOTAL OBRAS EN EJECUCION		39

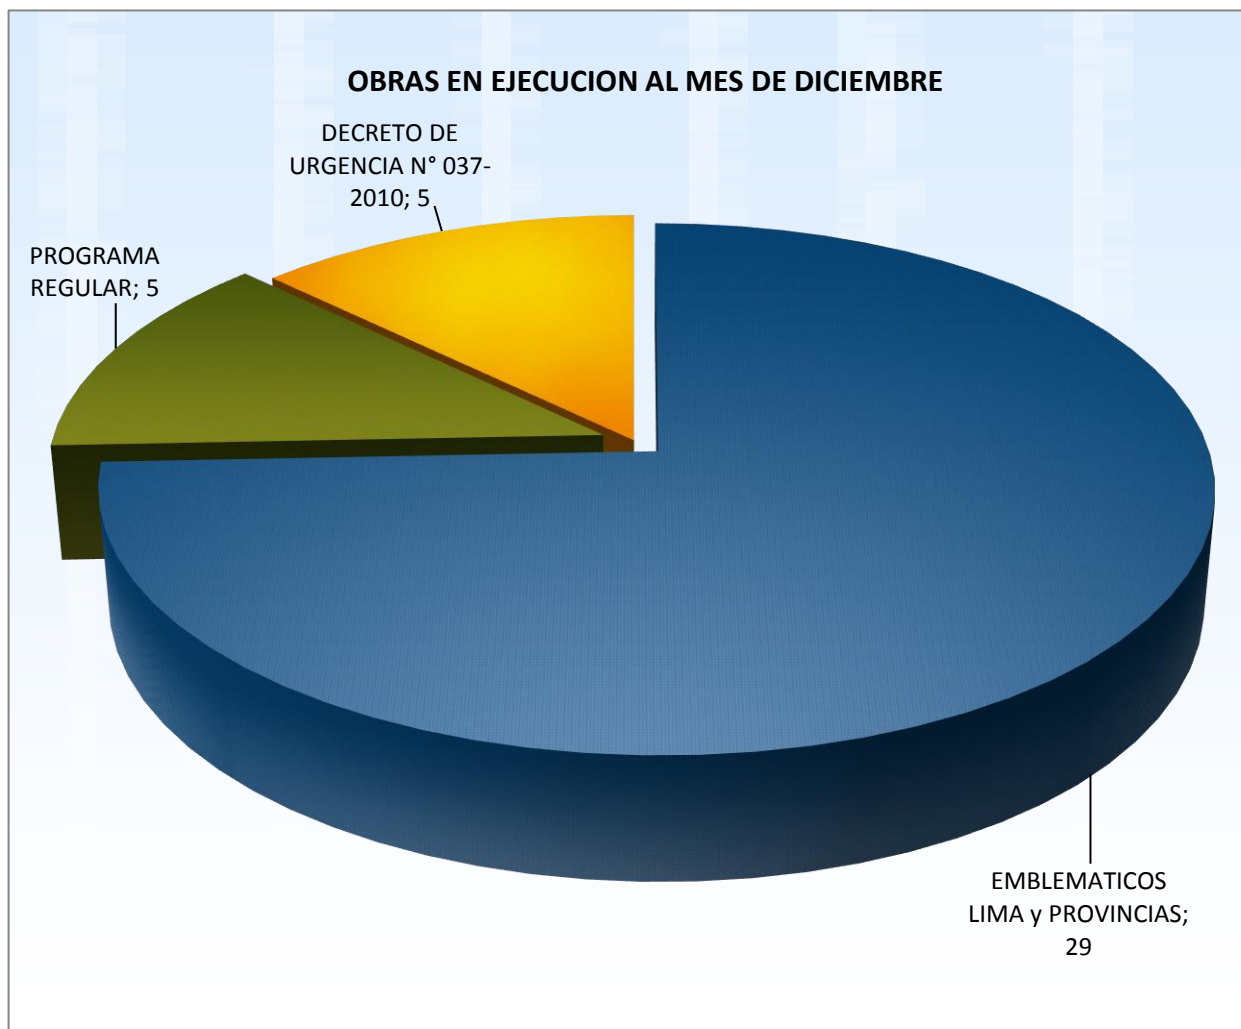

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



PERÚ

Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EN EJECUCION

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contractual	CONTRACTUAL		AVANCE FISICO
		Región	Prov.	Distrito			Inicio	Fin	

EMBLEMATICOS LIMA y PROVINCIAS

1	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUA	JAUA	8.720.999,29	240	25/09/2014	22/05/2015	24,24%
2	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	399	25/01/2011	27/02/2012	98,60%
3	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	518	19/09/2013	18/02/2015	60,23%
4	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	210	08/04/2014	03/11/2014	70,23%
5	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	01/04/2014	25/01/2015	91,17%
6	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	240	10/05/2014	04/01/2015	18,22%
7	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	360	04/07/2014	28/06/2015	14,11%
8	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	369	06/05/2014	09/05/2015	52,01%
9	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO	27.806.000,00	360	14/06/2014	08/06/2015	27,85%
10	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18.429.104,54	360	06/06/2014	31/05/2015	40,33%
11	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	34.244.713,01	380	16/12/2014	30/12/2015	-
12	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	10/10/2014	04/10/2015	5,40%
13	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	15/10/2014	09/10/2015	6,30%
14	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	19.498.304,07	300	27/11/2014	22/09/2015	4,05%
15	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	01/11/2014	28/06/2015	4,97%
16	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	04/12/2014	28/11/2015	1,58%
17	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	27/11/2014	22/09/2015	1,66%
18	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	20/12/2014	14/12/2015	-
19	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCANELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	24/12/2014	19/10/2015	-
20	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	04/12/2014	29/09/2015	3,55%
21	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	26/11/2014	20/11/2015	3,33%
22	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	22/12/2014	18/08/2015	-
23	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	424	30/01/2013	29/03/2014	99,54%
24	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	620	14/12/2012	25/08/2014	97,33%
25	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	726	14/12/2012	09/12/2014	99,37%
26	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	706	04/01/2013	10/12/2014	93,89%
27	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	772	22/01/2013	04/03/2015	91,23%
28	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	595	19/01/2013	05/09/2014	73,34%
29	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	612	15/02/2013	19/10/2014	76,33%

PROGRAMA REGULAR

1	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MEDIA TENSION	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	881.530,86	75	05/12/2014	17/02/2015	35,32%
2	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv- 10Kv (P)	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	296.149,36	75	14/08/2014	27/10/2014	-
3	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	2.850.259,95	310	07/06/2014	12/04/2015	31,18%
4	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SECTOR B)	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	1.786.247,42	150	04/10/2014	02/03/2015	62,46%
5	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	12.876.435,34	300	12/12/2014	07/10/2015	-

DECRETO DE URGENCIA 037-2010

1	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIF	1.104.233,95	90	04/12/2014	03/03/2015	11,37%
2	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	5.896.843,66	180	04/11/2014	02/05/2015	10,17%
3	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	5.586.133,51	251	14/05/2014	19/01/2015	52,56%
4	IE 22424	ICA	PALPA	RIO GRANDE	2.381.260,63	273	26/03/2014	23/12/2014	93,74%
5	IE 7059 - JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIF	3.137.673,94	180	23/12/2014	20/06/2015	-

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Ultima Valorizacion tramitada por la USOM. Los plazos de ejecución incluye las ampliaciones de plazo aprobadas por la Entidad.

- (P) = Obra Paralizada.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional


Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

02.- PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA OBRAS

Item	OBRAS	Nro. Obras
1	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	6
2	POR CONVOCAR	15
TOTAL DE OBRAS EN PROCESO		21

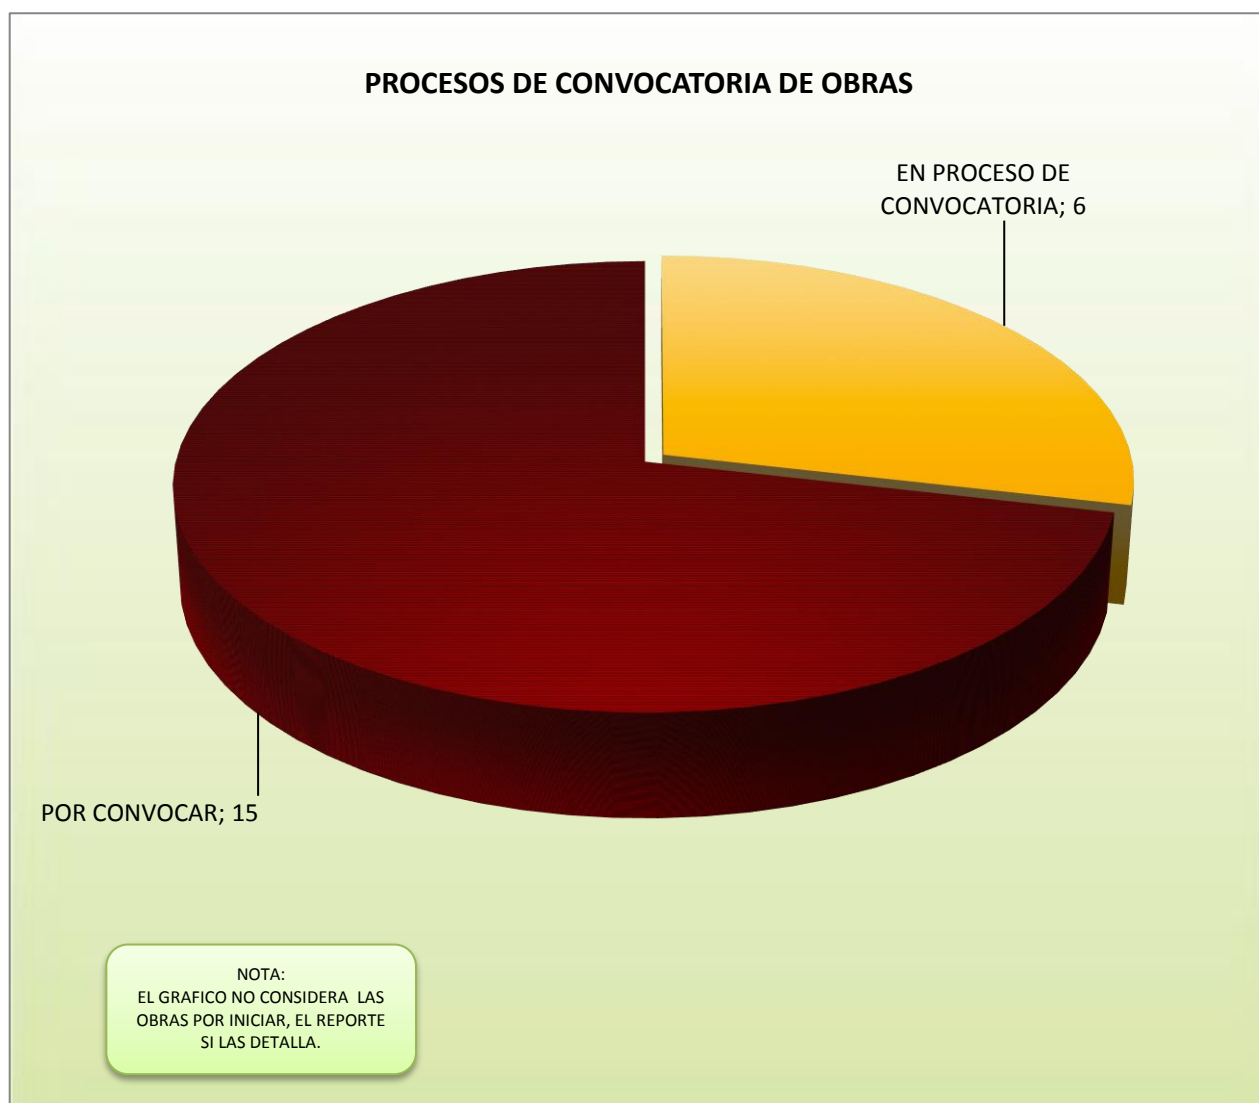

**Equipo de Ejecución de Obras
PRONIED**



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE PROCESOS EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

01.- Procesos en Convocatoria y Obras por Iniciar:

	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	016814	0285-2014-ED	02/07/2014	34.528.233,91	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 26/11/2014 a Consorcio Constructor Amazonico (Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. - Alianza Constructora de Obras S.A.C.) Monto Adjudicado S/. 29,998,129.62
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	019841	0300-2014-ED	14/07/2014	18.139.135,40	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 21/11/2014 a Consorcio Arequipa (Construcciones Reusma S.A. - Construcciones y Consultoría Chan Chan SAC - J & F Contratistas y Constructores del Perú S.A.C.) Monto Adjudicado S/. 16,325,221.86
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	019978	0153-2014-ED	03/04/2014	22.101.902,53	POR INICIAR : Buena Pro otorgada a Consorcio LAMBDA Monto Adjudicado S/. 19,858,039,02
	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAVELICA	019821	0003-2014-UGEO	23/09/2014	2.660.327,08	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 05/11/2014 a Constructora JHR S.R. Ltda. Monto Adjudicado S/. 2,247,766,20
	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672	LIMA	023547	0284-2014-ED	01/07/2014	6.493.337,95	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 12/11/2014 a Consorcio Pachacamac (Chung & Tong Ingenieros S.A.C. - A.S.A. Asociados S.A.) Monto Adjudicado S/. 5,844,004.16
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	019817	0002-2014-UGEO	23/09/2014	21.714.288,11	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 17/11/2014 a Consorcio Amazonia MATH - TR (TR Construya, S.L.U. Sucursal en el Perú - MATH Construcciones y Consultoría SAC) Monto Adjudicado S/. 18'348,999.00
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	019789	0357-2014-ED	26/08/2014	38.540.023,79	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 26/11/2014 a Consorcio Triunfo (Rover Alcisa Perú - Empresa Constructora A.R.C. S.R. Ltda.) Monto Adjudicado S/. 34,686,021.42
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	021498	0194-2014-ED	29/04/2014	23.808.077,05	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 24/11/2014 a Consorcio Constructor Amazonico (Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. - Alianza Constructora de Obras S.A.C.) Monto Adjudicado S/. 21,141,572.42
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	021465	0215-2014-ED	14/05/2014	16.189.378,22	POR INICIAR : Buena pro otorgada el 28/10/2014 a Consorcio Juanjuí (Proconces E.I.R.L. - Huracan Inversiones E.I.R.L. - Contratista Atlas E.I.R.L. - Comeco SR.LTDA.) Monto Adjudicado S/. 13,718,000.00
	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	022191	0236-2014-ED	27/05/2014	16.456.566,22	POR INICIAR : Buena Pro otorgada el 10/11/2014 a Consorcio TCT Amazonia (Terrak S.A. - Torres Camara y Cia de Obras S.A. Sucursal del Perú) Monto Adjudicado S/. 13,870,000.00
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE JORGE BASADRE DE MALACASI	PIURA	024904	RD-0014-2014-UGEO	02/12/2014	3.542.348,60	Absolucion de Consultas, Fecha de Consentimiento 16-02-2015, Firma de Contrato 04-03-2015.
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	029009	0008-2014-UGEO	15/10/2014	34.495.555,12	Absolucion de Consultas, Fecha de Consentimiento 20-02-2015, Firma de Contrato 10-03-2015.
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	027857	0005-2014-UGEO	29/09/2014	25.120.109,35	Absolucion de Observaciones, Fecha de Consentimiento 28-01-2015, Firma de Contrato 13-02-2015.
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	022190	0249-2014-ED	04/06/2014	28.615.249,50	Buena pro otorgada el 03/12/2014 a Consorcio TCT Amazonia (Terrak S.A.C. - Torres Camara y Cia de Obras S.A. Sucursal del Perú) Monto Adjudicado S/. 24,490,288.53
5	EMBLEMATICAS - PROV.	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	019846	0004-2014-UGEO	23/09/2014	456.398,79	Buena Pro otorgada el 17/12/2014 a Virgo Contratistas Generales E.I.R.L. Monto Adjudicado S/. 410,758.92
6	EMBLEMATICAS - PROV.	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	029417	0007-2014-UGEO	15/10/2014	8.876.818,95	Absolucion de Observaciones, Fecha de Consentimiento 29-01-2015, Firma de Contrato 16-02-2015.

**PERÚ**Ministerio de
Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE PROCESOS EN CONVOCATORIA y POR CONVOCAR

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	REGION	CODIGO	EXPEDIENTE TECNICO			OBSERVACIONES
				INFObras	RESOLUCION	FECHA	MONTO	

02.- Procesos por Convocar :

1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	032381	0016-2014-UGEO	11/12/2014	26.074.595,34	Por convocar.
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	031779	0010-2014-UGEO	10/11/2014	23.444.087,11	Por convocar.
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	028057	0006-2014-UGEO	01/10/2014	20.587.624,82	Proceso Declarado Nulo
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SANTO TOMAS	CUSCO	032524	0018-2014-UGEO	15/12/2014	19.596.392,82	Por convocar.
5	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GENARO HERRERA	LORETO	032383	0015-2014-UGEO	11/12/2014	21.420.377,34	Por convocar.
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	031119	0012-2014-UGEO	10/11/2014	32.835.984,47	Por convocar.
7	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	032382	0017-2014-UGEO	12/12/2014	21.498.797,95	Por convocar.
8	EMBLEMATICAS - LIMA	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	031058	0013-2014-UGEO	11/11/2014	1.305.954,62	Por convocar.
9	PROGRAMA REGULAR	IE 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION - MEDIA TENSION	LIMA	019825	0038-2014-ED	28/01/2014	200.091,04	Por convocar.
10	PROGRAMA REGULAR	IE 22468 MARIA PARADO DE BELLIDO - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	ICA	026471	0179-2014-ED	22/04/2014	228.388,05	Por convocar.
11	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	019824	0009-2014-UGEO	24/10/2014	201.709,62	Declarado Desierto
12	PROGRAMA REGULAR	IE JOHN F. KENNEDY - SISTEMA MEDIA TENSION	ICA	022996	0265-2014-ED	19/06/2014	239.551,46	Declarado Desierto
13	PROGRAMA REGULAR	IE 20191 ALFONSO UGARTE - MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	LIMA	019819	0269-2014-ED	24/06/2014	242.998,49	Por convocar.
14	EMBLEMATICAS - PROV.	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	024788	0295-2014-ED	09/07/2014	212.776,37	Declarado Desierto
15	EMBLEMATICAS - PROV.	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	027759	0001-2014-UGEO	15/09/2014	1.613.854,44	Por convocar.
21								

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

03.- OBRAS TERMINADAS Enero - Diciembre 2014

ITEM	PROGRAMA	Nro. Obras
1	EMBLEMATICAS LIMA y PROVINCIAS	10
2	PROGRAMA REGULAR	1
3	DECRETO DE URGENCIA N° 037-2010	4
TOTAL OBRAS TERMINADAS		15

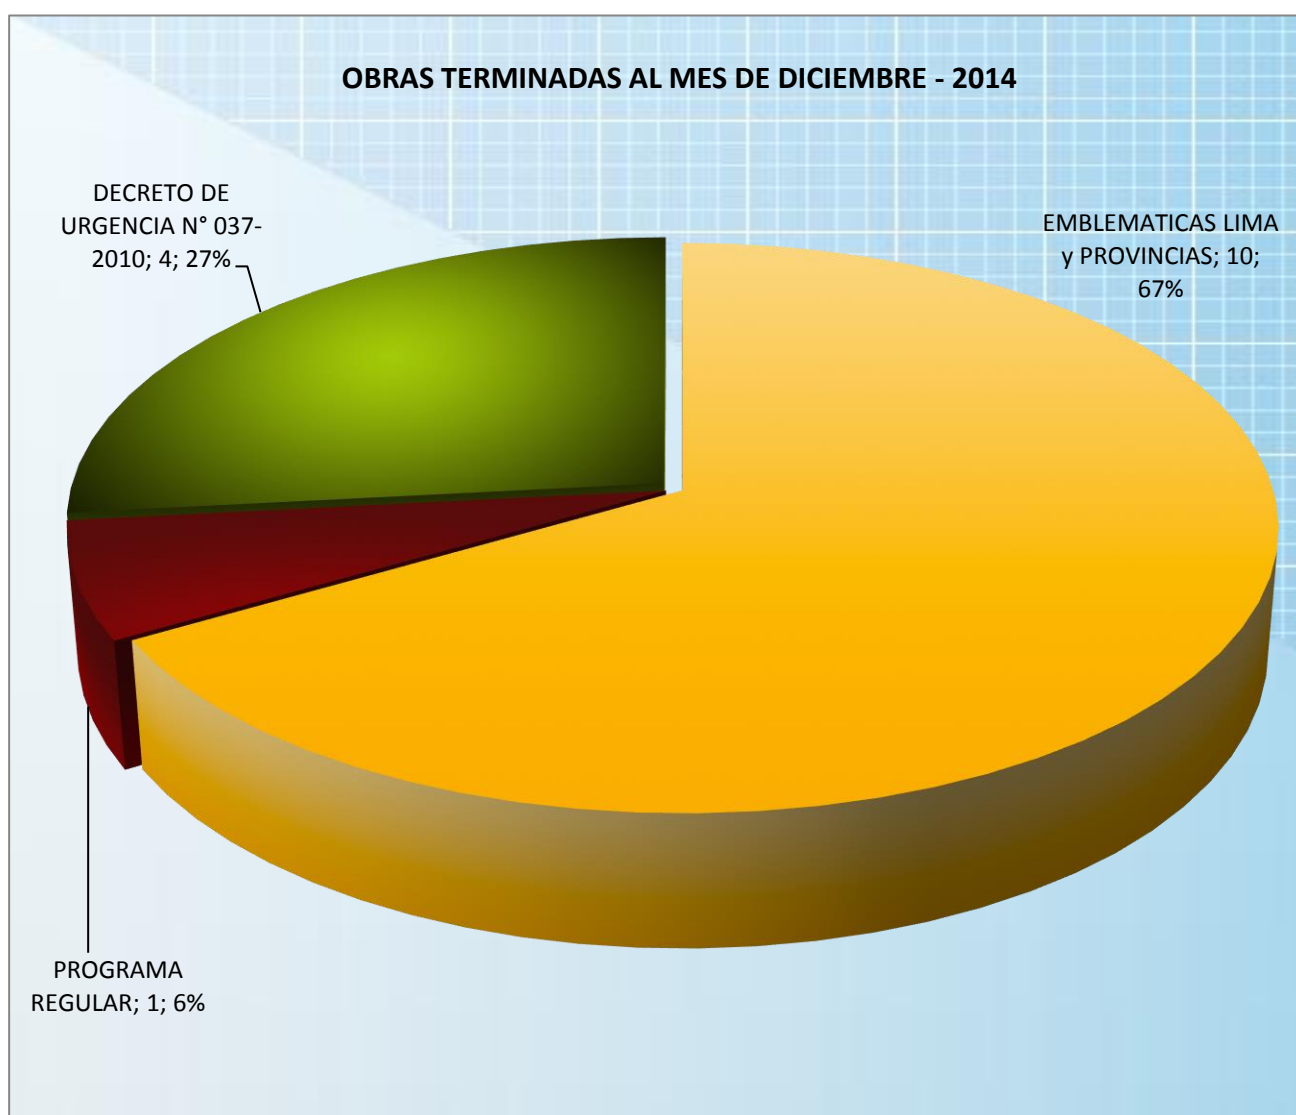

Equipo de Ejecución de Obras - PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE OBRAS TERMINADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	ACTA Recep.
			Región	Prov.	Distrito		
1	D. URGENCIA N°037-2010	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	1.616.926,40	21/04/2014
2	D. URGENCIA N°037-2010	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	5.050.746,00	23/04/2014
3	D. URGENCIA N°037-2010	IE 9 DE DICIEMBRE	ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	3.329.900,07	-
4	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54006 SAGRADO CORAZON DE JESUS	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	3.441.687,51	11/11/2014
5	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	26/05/2014
6	EMBLEMATICAS - PROV.	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	-
7	EMBLEMATICAS - PROV.	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	30/04/2014
8	EMBLEMATICAS - PROV.	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	09/04/2014
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	-
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	20.829.352,78	11/08/2014
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	19/12/2014
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	26/06/2014
13	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	-
14	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	-
15	PROGRAMA REGULAR	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	1.869.793,32	13/06/2014

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS - OBSERVADOS

1	D. URGENCIA N°037-2010	IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481	HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	2.247.766,20	(1)
2	EMBLEMATICAS - PROV.	GUE SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	39.662.413,51	(2)
3	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE REPUBLICA DE ARGENTINA	ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	23.682.900,79	(3)
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE AURELIO CARDENAS PACHAS	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	13.694.839,87	(4)

(*) Obras en proceso de recepción de obra y/o levantamiento de observaciones.

(1) ONTRATO DE OBRA DECLARADO NULO MEDIANTE RM-0053-2014-ED, : POR HABERSE CONFIGURADO EL SUPUESTO LEGAL DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS FALSOS, POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA MARIA - VIRGO SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL - C&S GUTIERREZ S.R.L.

(2) EN PROCESO DE RESOLUCION DE OBRA, CON MEMORANDUM N°00524-2014-MINEDU-VMGI-OINFE, LA UNIDAD DE OBRAS, JUSTIFICA LA DECLARACION DE RESOLUCION DEL CONTRATO N°0201-2010-ME-SG-OGA-UA-APP, SOLICITANDO AL JEFE DE LA OGA, DAR TRAMITE AL EXPEDIENTE Y DECLARAR LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. (EXP. N° 20386-2014).

(3) CONTRATO RESUELTO, CON CARTA NOTARIAL N°007-2014-CR-RL-FRS DE FECHA 31-03-2014, EL CONTRATISTA COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. - LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRA SE PROGRAMO PARA EL 03-04-2014.

(4) CONTRATO RESUELTO : CON MEMORANDUM N°0929-2014-UGEO, SE INFORMA A LA OGA SOBRE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SE DECLARE LA RESOLUCION AL NO HABER CUMPLIDO EL CONTRATISTA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EXP. 7593-2014.

**PERÚ**Ministerio
de Educación



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

04.- OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU

MAPA DE EJECUCION :



Se vienen ejecutando a la fecha

39

Obras de Infraestructura Educativa

Equipo de Ejecución de Obras





Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EN EJECUCION POR REGIONES DEL PERU AL MES DE DICIEMBRE 2014



Nro.	PROGRAMA	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			Avance Físico %
			Región	Prov.	Distrito	

Instituciones Educativas:

1	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	1,66%
2	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	-
3	PROGRAMA REGULAR	IE 86269 MARIA AUXILIADORA	ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	-
4	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	91,23%
5	D. URGENCIA N°037-2010	IE 54004 FRAY ARMANDO BONIFAZ	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	10,17%
6	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	97,33%
7	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	98,60%
8	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	5,40%
9	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	6,30%
10	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	1,58%
11	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	73,34%
12	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	52,01%
13	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	93,89%
14	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	-
15	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	-
16	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	91,17%
17	EMBLEMATICAS - PROV.	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VA	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	4,97%
18	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	76,33%
19	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE OBRA Y MED	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	35,32%
20	D. URGENCIA N°037-2010	IE 22424	ICA	PALPA	RIO GRANDE	93,74%
21	PROGRAMA REGULAR	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SALDO DE OBRA (SEC	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	62,46%
22	EMBLEMATICAS - PROV.	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	24,24%
23	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	3,33%
24	EMBLEMATICAS - PROV.	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	70,23%
25	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUC	SANTIAGO DE CHUC	27,85%
26	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLO	4,05%
27	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	99,37%
28	EMBLEMATICAS - PROV.	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO D	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	18,22%
29	D. URGENCIA N°037-2010	IE 636 VILLA SOLIDARIDAD	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAF	11,37%
30	PROGRAMA REGULAR	IE PEDRO LABARTHE - MEDIA TENSION 22.9 Kv-10Kv	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	-
31	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	52,56%
32	PROGRAMA REGULAR	IE 3022 JOSE SABOGAL	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	31,18%
33	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	40,33%
34	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PO	-
35	D. URGENCIA N°037-2010	IE 7059 - JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE MIRAF	-
36	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	99,54%
37	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	60,23%
38	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	3,55%
39	EMBLEMATICAS - RM-0318-ED	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	14,11%

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la UGEO.





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa


Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

05.- INCIDENCIA DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

DETALLE DE EVENTOS NO PROGRAMADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA				
N°	Descripción	N° de Obras	Totales	% Incidencia
1	Obras con Ampliaciones de Plazo, Adicionales y/o Deductivos.	14		
		➡	14	40%
2	Obras con ejecución de acuerdo a lo Programado.	➡	25	60%
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION			39	100%

Observacion : Dentro del grupo de obras del ítem (2), puede haber obras con avance físico retrasado con respecto a lo programado.

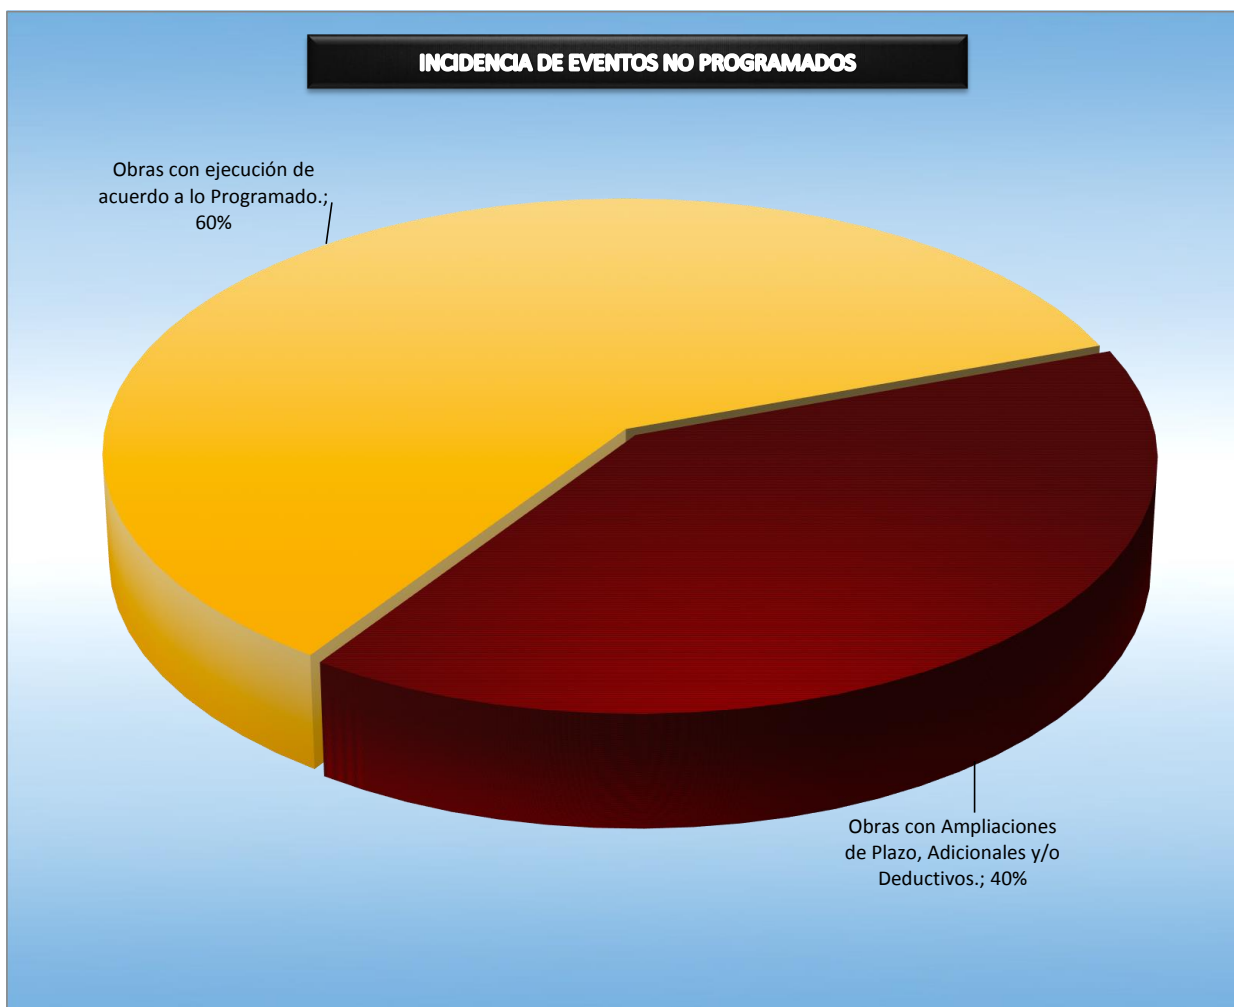

Las Causas no Programadas que generan atraso en la ejecución de la obra , pueden deberse a trámites administrativos que encamina y aprueba la Entidad como adicionales de obra, ampliaciones de plazo, absolucion de consultas, trámites de licencia de construcción, omisiones en el expediente técnico. y/o incapacidad técnica y económica del contratista, así como eventos fortuitos y ajenos a la ejecución normal de obra.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras


"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

06.- CONTRATOS DE OBRA y SUPERVISION LIQUIDADOS (Enero - Diciembre 2014)



Item	Mes	Liq. Obra	Liq. Supervisión	Acumulado
1	ENE - DIC	22	17	39 (*)
		22	17	39

(*) Este Reporte considera las Liquidaciones elaboradas por Reformulaciones.

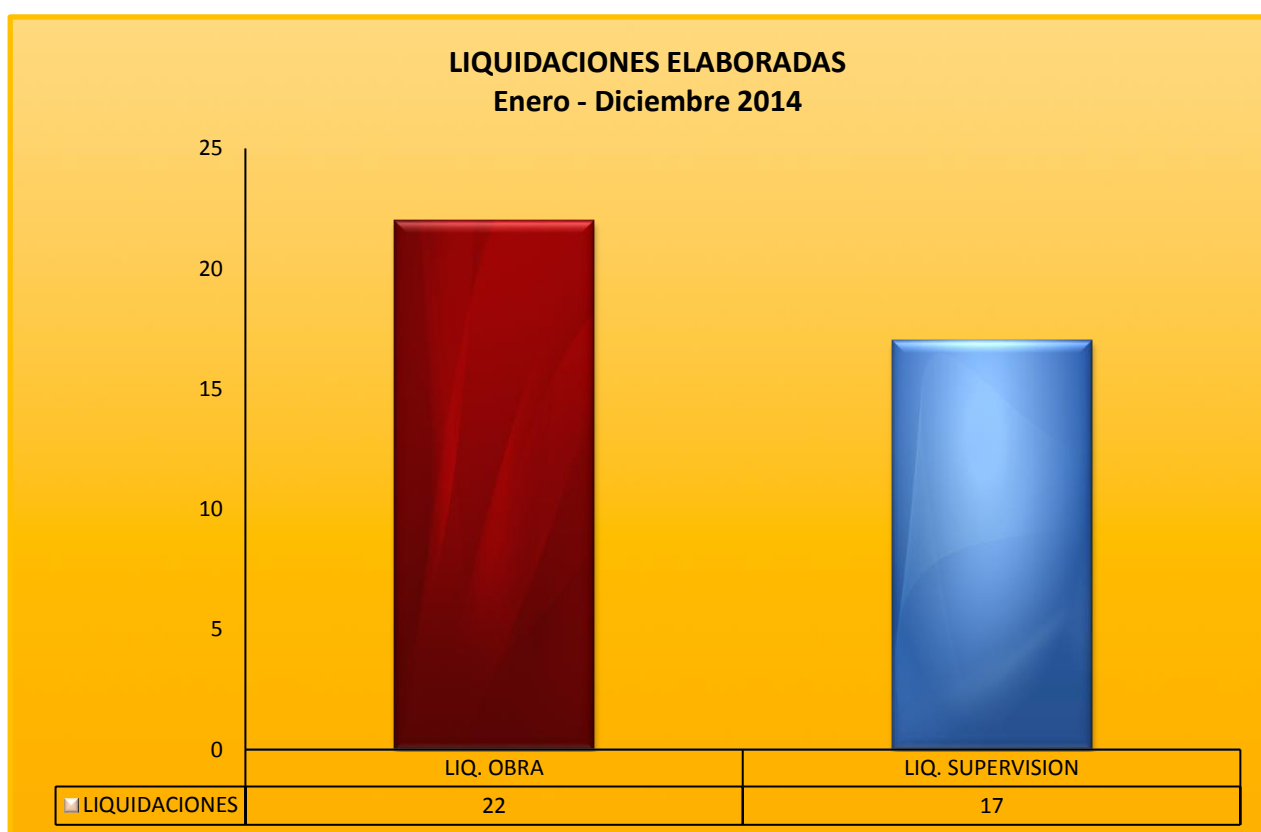

Equipo de Ejecución de Obras PRONIED



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION

LIQUIDADADOS CON RESOLUCION JEFATURAL (ENERO - DICIEMBRE 2014)

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE OBRA	REGION	MONTO Contratado	LIQUIDACION DE OBRA		MONTO Liquidacion Final
					Resolucion	Fecha	

01.- OBRA

1	IE 7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA	TORRES HARO CARLOS ALBERTO	LIMA	289.436,22	RJ-0003-2014-ED	03/01/2014	301.368,72
2	IE 6073 JORGE BASADRE	ONO ASOCIADOS S.A.C.	LIMA	294.568,15	RJ-0005-2014-ED	03/01/2014	304.365,83
3	IE 38083 LOS LICENCIADOS - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO	AYACUCHO	115.200,66	RJ-0004-2014-ED	03/01/2014	115.200,66
4	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	FAMOGA E.I.R.L	APURIMAC	242.850,10	RJ-0007-2014-ED	06/01/2014	238.767,68
5	IE 649 SANTA ROSA DE LIMA	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	LIMA	244.003,94	RJ-0030-2014-ED	24/01/2014	253.534,99
6	IE BANDERA DEL PERU	M & C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.LTDA	ICA	6.030.816,18	RJ-0033-2014-ED	24/01/2014	6.410.069,22
7	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	FAMOGA E.I.R.L	APURIMAC	242.850,10	RJ-0062-2014-ED	17/02/2014	238.767,68
8	IE JOSE CARLOS MARIATEGUI - SISTEMA TENSION 10-22.9 KV	RF CONSTRUCCION & INVERSIONES S.A.C.	ICA	348.161,19	RJ-0063-2014-ED	20/02/2014	359.096,92
9	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	CONSORCIO FANNING II	LIMA	17.676.984,47	RJ-0178-2014-ED	22/04/2014	18.073.494,12
10	IE 80844	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	611.425,51	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	595.670,02
11	IE 80875	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	529.720,60	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	515.036,37
12	IEI 1831	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	394.191,58	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	388.348,02
13	IE 80061	CONSORCIO ASISMON-MONTREALEX-ASSISTANCE@CONTRUCTION SAC	LA LIBERTAD	1.021.863,44	RJ-0228-2014-ED	26/05/2014	750.646,56
14	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO GRUPO MAIN - MATH CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAC - INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES SAC	SAN MARTIN	5.050.746,00	RJ-0316-2014-ED	25/07/2014	5.231.495,20
15	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1.616.926,40	RJ-0342-2014-ED	13/08/2014	1.679.673,71
16	IE HORACIO ZEBALLOS GAMEZ	MEDARDO NESTOR VASQUEZ ANGELES	LIMA	1.616.926,40	RJ-0358-2014-ED	26/08/2014	Reformulación
17	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CONSORCIO CUSCO - A.R.C. S.R.L. - CORRALES INGENIEROS S.R.L.	CUSCO	23.946.215,94	RJ-0340-2014-ED	13/08/2014	25.280.692,28
18	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NUEVAS	JAST S.R.L. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES	AREQUIPA	25.113.894,42	RJ-0331-2014-ED	06/08/2014	28.952.632,48
19	IE MARIANO MELGAR	MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES	AREQUIPA	38.754.082,09	RJ-0353-2014-ED	21/08/2014	39.909.149,47
20	IE 5181 JOSE OLAYA BALANDRA	CONSTRUCCIONES EQQU S.A.	LIMA	1.869.793,32	RD-0023-2014-ED	15/09/2014	1.956.090,54
21	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO DEL CARMEN	CAJAMARCA	22.087.820,38	RD-0016-2014-ED	08/09/2014	21.893.461,93
22	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO DEL CARMEN	CAJAMARCA	22.087.820,38	RD-0102-2014-ED	14/11/2014	Reformulación

02.- SUPERVISION

1	MIGUEL GRAU	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	APURIMAC	1.114.000,00	RJ-0085-2014-ED	04/03/2014	1.237.977,94
2	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C.	LIMA	940.069,51	RJ-0097-2014-ED	05/03/2014	968.271,56
3	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	900.451,81	RJ-0086-2014-ED	05/03/2014	1.026.577,37
4	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	900.451,81	RJ-0103-2014-ED	11/03/2014	1.026.577,37
5	IE 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES	CONSORCIO ICA	ICA	148.701,72	RJ-0113-2014-ED	14/03/2014	126.387,52
6	DOS DE MAYO	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	MADRE DE DIOS	465.817,44	RJ-0226-2014-ED	20/05/2014	523.513,36
7	IE SANTA ISABEL	CONSORCIO SUPERVISOR ALFA - JUAN ERNESTO ROMUALDO SANCHEZ MAYORA - REGNER BASURCO JIMENEZ	JUNIN	2.124.000,00	RJ-0036-2014-ED	28/01/2014	112.572,00
8	IE 5088 HEROES DEL PACIFICO	CONSORCIO ZUÑIGA - ESTELA PALOMINO RUIZ - ELMER ALFONSO SULCA BARRON	CALLAO	183.633,94	RJ-0037-2014-ED	28/01/2014	192.601,95
9	IE HIPOLITO UNANUE	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	LIMA	310.000,00	RJ-0011-2014-ED	08/01/2014	354.827,41
10	IE CORONEL CORTEGANA	CONSORCIO MORE & ORUE	CAJAMARCA	1.138.022,52	RJ-0266-2014-ED	20/06/2014	1.138.022,52
11	IE TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	CONSORCIO FERNICE INGENIEROS	AMAZONAS	560.000,00	RJ-0290-2014-ED	03/07/2014	602.834,00
12	CLORINDA MATTO DE TURNER - SALDO DE OBRA	LIDVA INGENIEROS S.A.C.	CUSCO	659.604,66	RJ-0337-2014-ED	11/08/2014	901.643,69
13	IST PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO	CONSORCIO ING. JULIAN MENDOZA & ING. CESAR TAPIA JULCA	SAN MARTIN	222.645,19	RJ-0356-2014-ED	21/08/2014	222.645,19
14	IE ANTENOR ORREGO	ROJAS PAZOS ENRIQUE FERNANDO	LIMA	1.033.000,72	RD-0040-2014-ED	02/10/2014	967.003,45
15	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI	CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	LORETO	590.000,00	RD-0097-2014-ED	12/11/2014	564.282,07
16	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI	CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	LORETO	590.000,00	RD-0111-2014-ED	21/11/2014	Reformulación
17	EL TRIUNFO - II ETAPA	CONSULTORIA Y SUPERVISION G y M S.A.C	TUMBES	289.896,26	RD-0091-2014-ED	11/11/2014	289.896,26

**PERÚ**Ministerio de
Educación

07.- RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION ESTIMADA 2006 -2014


Resumen :

PERIODO		OBRAS TERMINADAS (*)	INVERSION ESTIMADA
01. -	PERIODO - 2006	44	48.465.534,33
02.-	PERIODO - 2007	64	52.142.241,97
03.-	PERIODO - 2008	25	40.765.868,98
04.-	PERIODO - 2009	29	61.225.516,19
05.-	PERIODO - 2010	67	243.203.569,79
06.-	PERIODO - 2011	42	589.848.336,93
07.-	PERIODO - 2012	36	390.716.522,88
08.-	PERIODO - 2013	29	289.457.225,51
09.-	PERIODO - 2014 (Enero - Diciembre)	15	237.889.533,87
Total Obras e Inversión Estimada		351	1.953.714.350,45

(*) No Estan consideradas las Obras Resueltas.

Equipo de Ejecución de Obras - UGEO

OBRAS EJECUTADAS y MONTOS DE INVERSION

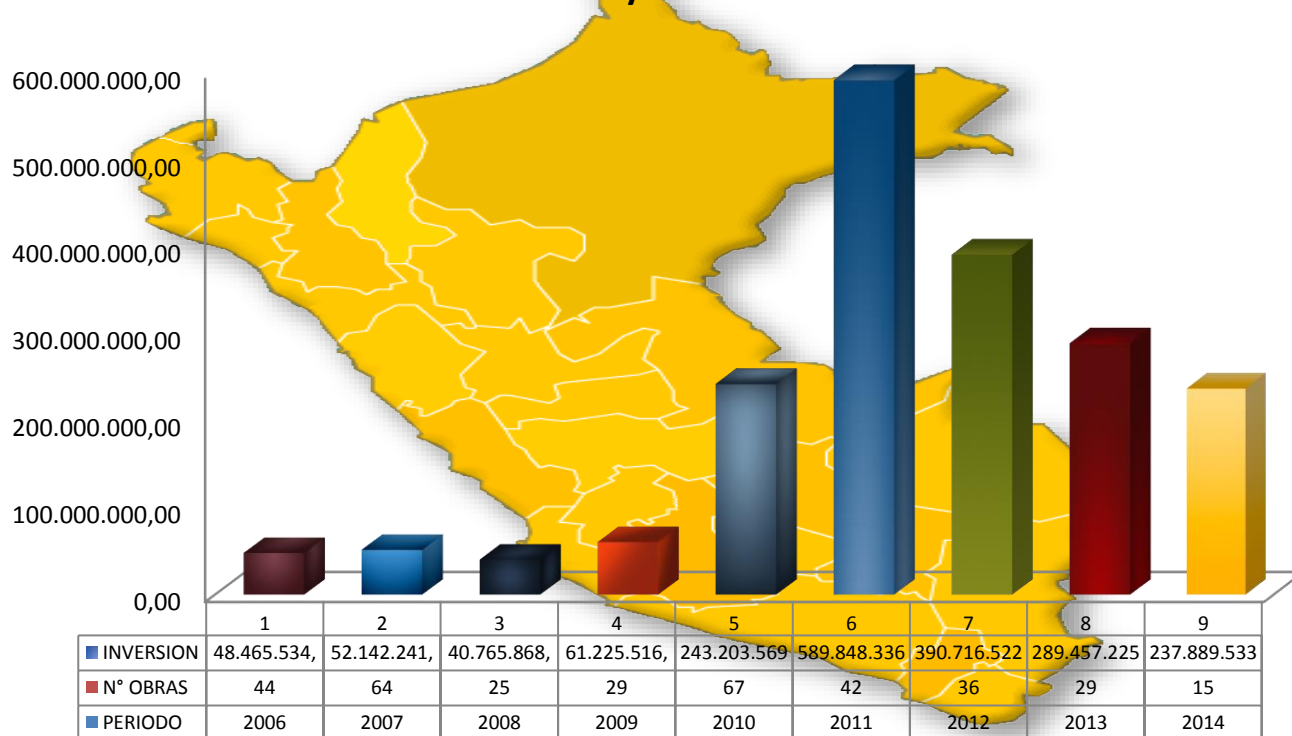

El Total de Inversión, solo considera los montos contractuales por elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión, así como importes generados por Obras Adicionales etc.




OBRAS EMBLEMATICAS

Lima y Regiones al Mes de Diciembre 2014



RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	3	3	50
2	REGIONES	45	26	21	92
Totales :		89	29	24	142

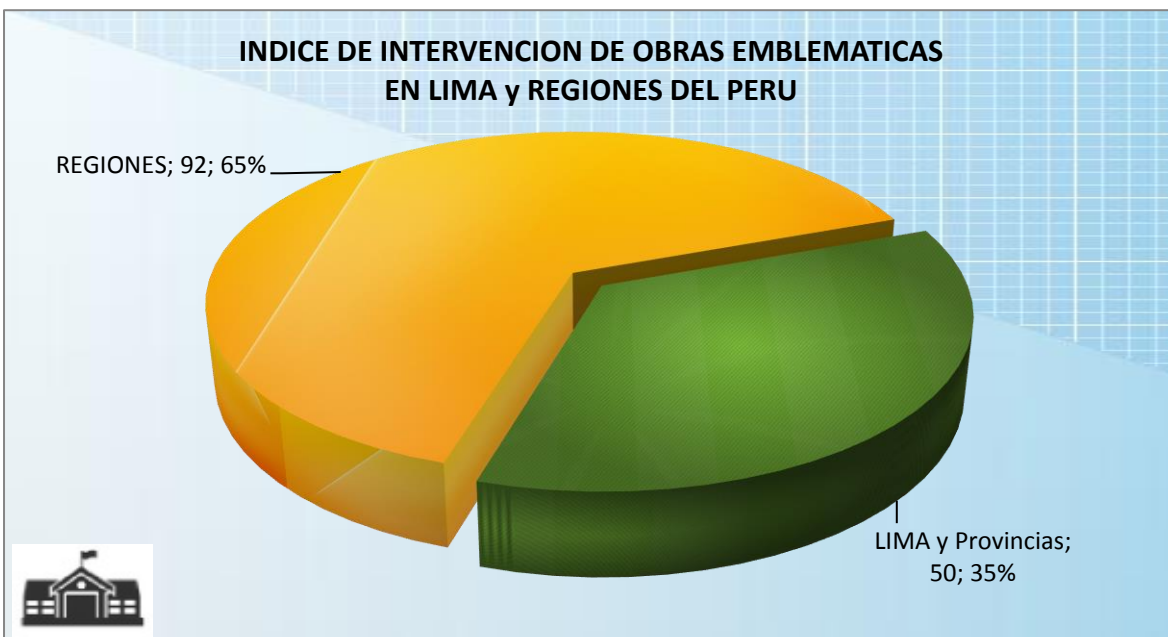

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

OBRAS EMBLEMATICAS


Lima y Regiones al Mes de Diciembre 2014




RESUMEN:

N°	UBICACIÓN	TERMINADAS	EN EJECUCION	POR EJECUTAR	Total Obras
1	LIMA y Provincias	44	3	3	50
2	REGIONES	45	26	21	92
Totales :		89	29	24	142

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS EN LIMA PROVINCIAS

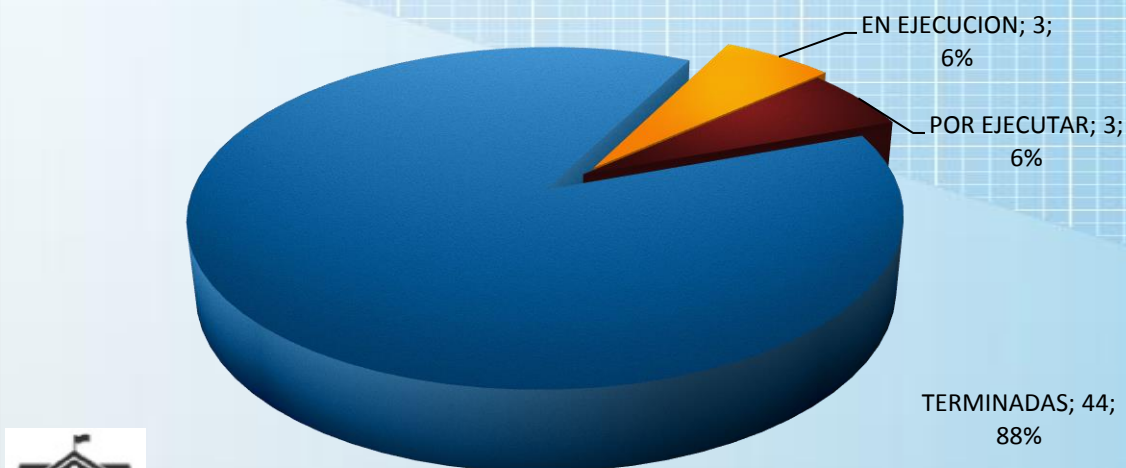

ESTADO SITUACIONAL DE OBRA EMBLEMATICAS PROVINCIAS

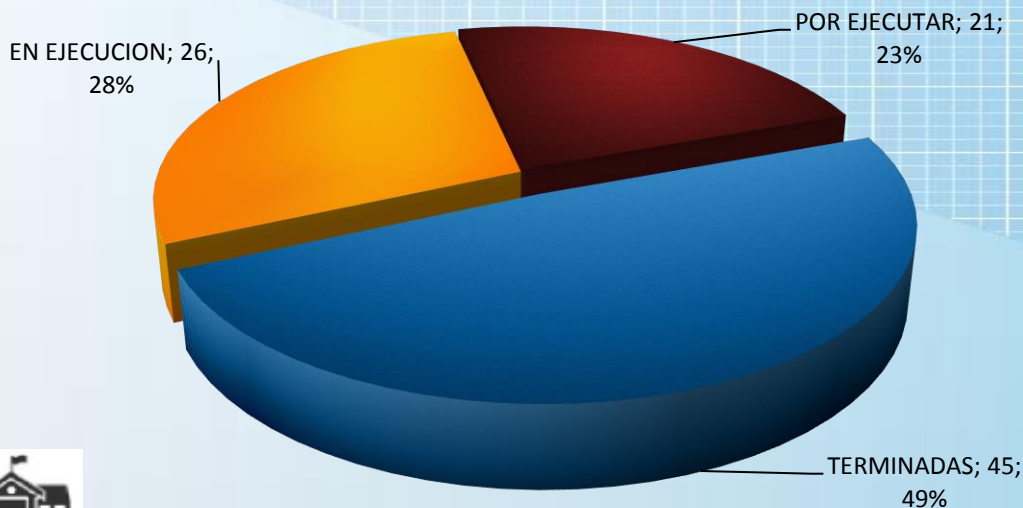**PERÚ**Ministerio
de Educación

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS**
OBRAS TERMINADAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO	PLAZO	AVANCE FISICO		Acta
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	ADS	5	2013	MIGUEL GRAU - SISTEMA TENSION 13.2 KV	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	242.850,10	90	100,00%	100,00%	28/09/2013
2	ADS	11	2013	IE JOSE DE SAN MARTIN - SISTEMA TENSION 10-22	ICA	PISCO	PISCO	397.704,05	35	100,00%	100,00%	26/05/2014
3	EXON	2	2010	SIMON BOLIVAR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	19.247.752,85	240	100,00%	100,00%	03/04/2012
4	EXON	17	2010	INDEPENDENCIA AMERICANA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	10.984.825,12	240	100,00%	100,00%	28/09/2011
5	EXON	18	2010	DOS DE MAYO	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	7.499.087,49	240	100,00%	100,00%	12/07/2012
6	EXON	19	2010	CN SAN MIGUEL	PIURA	PIURA	PIURA	14.698.756,22	270	100,00%	100,00%	23/09/2011
7	EXON	25	2010	SAN JUAN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	17.809.857,86	240	100,00%	100,00%	30/11/2011
8	EXON	28	2010	COLEGIO NACIONAL DE IQUITOS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTIST.	24.850.130,00	300	100,00%	100,00%	07/09/2012
9	EXON	36	2010	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	44.922.369,46	288	100,00%	100,00%	30/01/2012
10	EXON	54	2010	IE COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CALLAO	CALLAO	LA PERLA	56.895.969,19	420	100,00%	100,00%	28/12/2012
11	EXON	70	2010	FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	HUANCANELICA	7.546.407,26	240	100,00%	100,00%	27/07/2011
12	EXON	75	2010	CORONEL BOLOGNESI	TACNA	TACNA	TACNA	12.552.231,68	240	100,00%	100,00%	13/07/2011
13	EXON	86	2010	IE SAN JOSE	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	22.606.616,90	210	100,00%	100,00%	02/06/2012
14	EXON	87	2010	GREGORIO MARTINELLY	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	18.733.216,84	300	100,00%	100,00%	06/03/2012
15	EXON	90	2010	IE JOSE DE SAN MARTIN - I ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	553.458,16	60	100,00%	100,00%	17/12/2010
16	EXON	100	2010	EL TRIUNFO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	8.498.883,99	180	100,00%	100,00%	17/09/2011
17	EXON	111	2010	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	LORETO	MAYNAS	IQUITOS	54.450.760,00	360	100,00%	100,00%	11/12/2012
18	EXON	113	2010	SAN JUAN DE LA LIBERTAD	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	7.725.531,18	240	100,00%	100,00%	26/03/2012
19	EXON	115	2010	CN GLORIOSO SAN CARLOS	PUNO	PUNO	PUNO	16.352.313,60	300	100,00%	100,00%	29/01/2013
20	EXON	126	2010	LEONCIO PRADO	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	28.760.197,28	360	100,00%	100,00%	27/03/2013
21	EXON	127	2010	FAUSTINO MALDONADO	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	27.303.268,20	300	100,00%	100,00%	14/07/2012
22	EXON	128	2010	CN SERAFIN FILOMENO	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	20.567.329,08	300	100,00%	100,00%	01/06/2012
23	PESP	162	2010	INCA GARCILASO DE LA VEGA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	39.709.126,15	300	100,00%	100,00%	29/01/2014
24	PESP	168	2010	IE NICOLAS LA TORRE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO O	10.819.997,45	270	100,00%	100,00%	21/09/2012
25	PESP	1	2011	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA	AMAZONAS	TORIBIO RODRI	SAN NICOLAS	21.830.737,21	270	100,00%	100,00%	07/03/2014
26	PESP	16	2011	CORONEL BOLOGNESI - OBRAS NUEVAS	TACNA	TACNA	TACNA	5.192.205,06	180	100,00%	100,00%	09/02/2012
27	PESP	25	2011	IE CORONEL CORTEGANA	CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	22.087.820,38	330	100,00%	100,00%	25/01/2014
28	PESP	30	2011	SAN RAMON - II ETAPA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	5.803.114,30	180	100,00%	100,00%	27/02/2013
29	PESP	36	2011	IE SAN LUIS GONZAGA	ICA	ICA	ICA	9.966.975,86	240	100,00%	100,00%	03/04/2013
30	PESP	40	2011	SAN JOSE - II ETAPA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	15.001.252,09	150	100,00%	100,00%	07/09/2012
31	PESP	167	2011	IE JOSE DE SAN MARTIN - II ETAPA - OBRAS DEPOR	ICA	PISCO	PISCO	15.716.683,73	240	100,00%	100,00%	02/10/2013
32	PESP	182	2011	SIMON BOLIVAR - OBRAS NUEVAS - CAMPO DEPOR	MOQUEGUA	MARISCAL NIET	MOQUEGUA	2.762.375,59	120	100,00%	100,00%	01/08/2012
33	PESP	16	2012	EL TRIUNFO - II ETAPA	TUMBES	TUMBES	TUMBES	12.926.017,97	180	100,00%	100,00%	23/05/2014
34	PESP	25	2012	GREGORIO MARTINELLY - SISTEMA ELECTRICO - M	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	109.160,87	45	100,00%	100,00%	01/08/2012
35	PESP	36	2012	CLORINDA MATO DE TURNER - SALDO DE OBRA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	23.946.215,94	270	100,00%	100,00%	30/04/2014
36	PESP	43	2012	CN SERAFIN FILOMENO - SISTEMA ELECTRICO - M	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	193.598,06	45	100,00%	100,00%	06/12/2012
37	PESP	44	2012	INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA - OBRAS NI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	25.113.894,42	360	100,00%	100,00%	09/04/2014
38	PESP	46	2012	CN SAN MIGUEL - II ETAPA	PIURA	PIURA	PIURA	2.546.695,38	120	100,00%	100,00%	25/01/2013
39	PESP	47	2012	GREGORIO MARTINELLY - CONEXIONES DOMICILIA	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	77.103,64	30	100,00%	100,00%	09/01/2013
40	PESP	58	2012	IE MARIANO MELGAR	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	38.754.082,09	420	100,00%	100,00%	26/06/2014
41	PESP	76	2012	SAN JOSE - SISTEMA MEDIA TENSION	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	196.003,67	45	100,00%	100,00%	04/06/2013
42	EXON	5	2009	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	6.950.503,23	180	100,00%	100,00%	20/05/2010
43	EXON	6	2009	IE RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	14.730.418,50	240	100,00%	100,00%	19/11/2010
44	EXON	7	2009	IE MARIA PARADO DE BELLIDO	LIMA	LIMA	RIMAC	10.598.133,02	240	100,00%	100,00%	02/06/2010
45	EXON	8	2009	IE 1071 ALFONSO UGARTE	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	13.274.564,17	270	100,00%	100,00%	14/05/2010
46	EXON	9	2009	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	11.568.701,69	240	100,00%	100,00%	01/07/2010
47	EXON	10	2009	IE BARTOLOME HERRERA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	10.386.423,92	210	100,00%	100,00%	05/11/2010
48	EXON	11	2009	IE MARIANO MELGAR	LIMA	LIMA	BREÑA	13.699.468,94	240	100,00%	100,00%	02/11/2010
49	EXON	13	2009	IE MIGUEL GRAU	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL M	7.669.799,25	180	100,00%	100,00%	21/05/2010
50	EXON	15	2009	IE ISABEL LA CATOLICA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.540.886,61	270	100,00%	100,00%	21/07/2010
51	EXON	20	2009	IE CARLOS WIESE	LIMA	LIMA	COMAS	6.450.213,48	180	100,00%	100,00%	31/08/2010
52	EXON	39	2009	IE PEDRO A. LABARTHE	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	16.102.546,53	270	100,00%	100,00%	26/04/2011
53	EXON	40	2009	IE 1070 MELITON CARVAJAL	LIMA	LIMA	LINCE	18.976.461,40	270	100,00%	100,00%	15/02/2011
54	EXON	41	2009	IE 6052 JOSE MARIA EGUREN	LIMA	LIMA	BARRANCO	13.767.910,99	240	100,00%	100,00%	22/09/2010
55	EXON	91	2009	IE ROSA DE SANTA MARIA	LIMA	LIMA	BREÑA	12.337.712,85	180	100,00%	100,00%	27/09/2011
56	EXON	24	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	5.955.773,30	45	100,00%	100,00%	21/07/2010
57	EXON	27	2010	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	2.727.463,60	75	100,00%	100,00%	05/10/2010
58	EXON	29	2010	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	3.775.993,03	90	100,00%	100,00%	29/10/2010
59	EXON	30	2010	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS NUE	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	3.723.072,73	90	100,00%	100,00%	25/10/2010
60	EXON	33	2010	IE RICARDO BENTIN - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	8.121.877,69	120	100,00%	100,00%	21/01/2011

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS****OBRAS TERMINADAS**

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
61	EXON	35	2010	IE HIPOLITO UNANUE	LIMA	LIMA	MIRONES BAJO	14.489.268,00	300	100,00%	100,00%	20/02/2012
62	EXON	48	2010	IE CESAR VALLEJO	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	11.224.843,00	240	100,00%	100,00%	21/09/2011
63	EXON	53	2010	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA	LIMA	LIMA	RIMAC	29.943.516,23	270	100,00%	100,00%	13/02/2013
64	EXON	64	2010	IE TERESA GONZALES DE FANNING	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	14.955.474,15	240	100,00%	100,00%	25/08/2011
65	EXON	80	2010	IE CARLOS WIESE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	COMAS	920.031,48	30	100,00%	100,00%	28/10/2010
66	EXON	91	2010	IE GNRL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	2.677.215,75	150	100,00%	100,00%	03/10/2011
67	EXON	104	2010	IE RICARDO PALMA	LIMA	LIMA	SURQUILLO	26.519.751,67	300	100,00%	100,00%	01/04/2013
68	EXON	42	2011	IE 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - II ETAPA - OBRA	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	28.750,88	20	100,00%	100,00%	24/11/2011
69	PESP	157	2010	IE 1071 ALFONSO UGARTE - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	3.569.179,06	90	100,00%	100,00%	17/05/2011
70	PESP	183	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	19.932.413,36	300	100,00%	100,00%	23/04/2014
71	PESP	184	2010	IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	LIMA	LIMA	BREÑA	33.382.049,92	360	100,00%	100,00%	02/04/2014
72	PESP	186	2010	IE PEDRO A. LABARTHE - SALDO DE OBRA	LIMA	LIMA	LA VICTORIA	6.785.340,79	120	100,00%	100,00%	29/12/2011
73	PESP	18	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - OBRAS NUEVAS	LIMA	LIMA	LINCE	8.206.571,31	270	100,00%	100,00%	10/10/2012
74	PESP	24	2011	IE LUIS FABIO XAMMAR JURADO	LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	26.740.032,38	360	100,00%	100,00%	04/09/2013
75	PESP	28	2011	IE TERESA GONZALES DE FANNING - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	17.676.984,47	270	100,00%	100,00%	07/01/2013
76	PESP	38	2011	IE MARIA PARADO DE BELLIDO - MEJORAMIENTO	LIMA	LIMA	RIMAC	979.595,01	90	100,00%	100,00%	09/01/2012
77	PESP	39	2011	IE RICARDO BENTIN - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	RIMAC	5.695.943,21	150	100,00%	100,00%	04/05/2012
78	PESP	44	2011	IE BARTOLOME HERRERA - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	6.094.843,57	150	100,00%	100,00%	09/08/2012
79	PESP	47	2011	IE 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT - OBRAS DEPORTIVAS	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	4.013.808,33	90	100,00%	100,00%	08/11/2012
80	PESP	48	2011	IE ROSA DE SANTA MARIA - OBRA NUEVA (PAB. F)	LIMA	LIMA	BREÑA	1.969.105,31	120	100,00%	100,00%	21/03/2012
81	PESP	173	2011	IE 1070 MELITON CARVAJAL - PISTA ATLETICA	LIMA	LIMA	LINCE	1.079.857,24	45	100,00%	100,00%	11/04/2012
82	PESP	175	2011	IE 20318 JOSE A. MACNAMARA	LIMA	HUAURA	HUACHO	4.884.836,81	240	100,00%	100,00%	11/02/2014
83	PESP	12	2012	IE MARIANO MELGAR - OBRA NUEVA	LIMA	LIMA	BREÑA	3.757.857,00	120	100,00%	100,00%	06/11/2012
84	PESP	50	2012	IE ANTENOR ORREGO	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURICO	20.829.352,78	330	100,00%	100,00%	11/08/2014
85	AMC	39	2014	DOS DE MAYO - SISTEMA ELECTRICO - MEDIA TENSION	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	116.708,99	30	100,00%	100,00%	-
86	PESP	51	2012	IE 20449 ANDRES DE LOS REYES	LIMA	HUARAL	HUARAL	22.117.574,83	330	100,00%	100,00%	19/12/2014
87	PESP	59	2012	IE SANTA TERESITA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	25.890.382,85	360	100,00%	100,00%	-
88	LP	2	2013	IE KARL WEISS	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	26.641.088,84	360	100,00%	100,00%	-
89	PESP	66	2012	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	20.665.659,98	360	100,00%	100,00%	-

OBRAS EN EJECUCION - INSTITUCIONES EMBLEMATICAS

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Contractual	PLAZO Contrato	AVANCE FISICO		Acta Recep.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Real	
1	AMC	56	2014	IE SAN JOSE - II ETAPA	JUNIN	JAUIJA	JAUIJA	8.720.999,29	240	24,29%	24,24%	-
2	EXON	154	2010	SAN RAMON	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	29.432.256,47	240	100,00%	98,60%	-
3	LP	1	2013	IE MARIA AUXILIADORA	PUNO	PUNO	PUNO	36.049.600,51	420	96,45%	60,23%	-
4	LP	25	2013	SAN JUAN - II ETAPA + MEDIA TENSION 10 KV	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	4.768.794,46	210	100,00%	70,23%	-
5	LP	28	2013	IE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	HUANUCO	AMBO	AMBO	19.695.000,00	300	97,19%	91,17%	-
6	LP	29	2013	IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA - SALDO DE OBRA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6.577.174,33	240	86,64%	18,22%	-
7	LP	33	2013	IE FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	TACNA	TACNA	TACNA	29.472.235,45	360	28,74%	14,11%	-
8	LP	34	2013	IE MANCO II	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	22.630.000,00	360	53,30%	52,01%	-
9	LP	35	2013	IE CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE C	SANTIAGO DE CHUC	27.806.000,00	360	38,47%	27,85%	-
10	LP	36	2013	IE 20066 SIMON BOLIVAR	LIMA	OYON	OYON	18.429.104,54	360	37,00%	40,33%	-
11	LP	3	2014	IE JOSE GRANDA	LIMA	LIMA	SAN MARTIN DE PORO	34.244.713,01	380	-	-	-
12	LP	4	2014	IE JAEN DE BRACAMOROS	CAJAMARCA	JAEN	JAEN	22.666.666,66	360	4,41%	5,40%	-
13	LP	5	2014	IE TORIBIO CASANOVA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.607.488,94	360	6,25%	6,30%	-
14	LP	12	2014	IE JOSE ANDRES RAZURI	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLO	19.498.304,07	300	1,53%	4,05%	-
15	LP	13	2014	IE LEONCIO PRADO - RESTAURACION - PUESTA EN VALOR	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	5.200.000,00	240	5,84%	4,97%	-
16	LP	14	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	19.020.002,08	360	1,58%	1,58%	-
17	LP	15	2014	IE BLAS VALERA	AMAZONAS	LUYA	LAMUD	13.398.369,29	300	0,91%	1,66%	-
18	LP	17	2014	IE MANUEL ANTONIO MESONES MURO	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	20.590.000,00	360	-	-	-
19	LP	19	2014	IE DANIEL HERNANDEZ	HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAMPAS	11.283.696,50	300	-	-	-
20	LP	20	2014	IE 060 MANUEL MESONES MURO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	11.344.620,60	300	2,46%	3,55%	-
21	LP	21	2014	IE JOAQUIN CAPELO	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	16.507.594,95	360	2,51%	3,33%	-
22	LP	37	2014	IE JOSE MARIA ARGUEDAS	HUANCAYELICA	ANGARAES	LIRCAY	12.852.221,10	240	-	-	-
23	PESP	49	2012	IE MERCEDES INDACOCHEA	LIMA	LIMA	BARRANCO	24.270.355,38	330	100,00%	99,54%	-
24	PESP	52	2012	IE GONZALES VIGIL	AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	32.704.918,75	360	97,33%	97,33%	-
25	PESP	53	2012	IE JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	32.532.033,80	360	99,79%	99,37%	-
26	PESP	54	2012	IE MATEO PUMACAHUA	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	36.254.919,00	360	100,00%	93,89%	-
27	PESP	55	2012	IE 86019 LA LIBERTAD	ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	29.796.899,66	360	96,05%	91,23%	-
28	PESP	60	2012	IE SAN JUAN	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	31.029.000,00	420	100,00%	73,34%	-
29	PESP	67	2012	IE VICTOR E. VIVAR	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	13.010.208,00	300	100,00%	76,33%	-

- Observacion : Los % de Avances Físicos de Obra, son obtenidos de la Última Valorización tramitada por la USOM.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio
de Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"



INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMATICAS - LIMA y PROVINCIAS
OBRAS EMBLEMATICAS POR INICIAR - EN CONVOCATORIA - POR CONVOCAR

Id	MODALIDAD			INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			MONTO Referencial	PLAZO Ejecución	AVANCE FISICO		Observ.
	Mod.	Nro.	Año		Región	Prov.	Distrito			Prog.	Estimado	
1	AMC	191	2014	IE GOMEZ ARIAS DAVILA	HUANUCO	LEONCIO PRAD	RUPA RUPA	29.998.129,62	390	-	-	POR INICIAR
2	LP	2	2014	IE JUAN GUERRERO QUIMPER	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TR	34.686.021,42	380	-	-	POR INICIAR
3	LP	7	2014	IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	16.325.221,86	300	-	-	POR INICIAR
4	LP	18	2014	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	18.348.999,00	360	-	-	POR INICIAR
5	LP	27	2014	IE HONORIO DELGADO ESPINOZA	AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	19.858.039,02	300	-	-	POR INICIAR
6	LP	28	2014	IE 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ	SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	21.141.572,42	360	-	-	POR INICIAR
7	LP	30	2014	IE 0390 LA INMACULADA	SAN MARTIN	MARISCAL CAC	JUANJUI	13.718.000,00	330	-	-	POR INICIAR
8	LP	33	2014	IE MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI - SALDO DE OBRA	LORETO	ALTO AMAZON	YURIMAGUAS	13.870.000,00	270	-	-	POR INICIAR
9	-	-	-	IE 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	26.074.595,34	360	-	-	-
10	-	-	-	IE DEAN VALDIVIA	AREQUIPA	ISLAY	MOLLEND	23.444.087,11	360	-	-	-
11	-	-	-	IE SAN CARLOS	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	34.495.555,12	360	-	-	-
12	-	-	-	IE SANTO TOMAS	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	19.596.392,82	360	-	-	-
13	-	-	-	IE VENTURA CCALAMAQUI	LIMA	BARRANCA	BARRANCA	20.587.624,82	360	-	-	-
14	-	-	-	IE GENARO HERRERA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	21.420.377,34	360	-	-	-
15	-	-	-	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	PIURA	PIURA	PIURA	25.120.109,35	360	-	-	-
16	-	-	-	IE JUAN JIMENEZ PIMENTEL	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	32.835.984,47	420	-	-	-
17	-	-	-	IE 0425 CESAR VALLEJO	SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	21.498.797,95	360	-	-	-
18	-	-	-	IE 64721 HILDEBRANDO FUENTES	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	28.615.249,50	360	-	-	-
19	-	-	-	IE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA - II ETAPA	LIMA	LIMA	RIMAC	1.305.954,62	60	-	-	-
20	-	-	-	SAN RAMON - II ETAPA - SISTEMA MEDIA TENSION 10 KV	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	201.709,62	45	-	-	-
21	-	-	-	TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA -A) AMP. POTENCIA B) MEDIA TENSION 10-22.9 Kv	AMAZONAS	TORIBIO RODR	SAN NICOLAS	456.398,79	90	-	-	-
22	-	-	-	FAUSTINO MALDONADO - MEDIA TENSION 10 KV	UCAYALI	CORONEL POR	CALLERIA	212.776,37	60	-	-	-
23	-	-	-	IE MIGUEL GRAU - SALDO DE OBRA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	1.613.854,44	120	-	-	-
24	-	-	-	INCA GARCILASO DE LA VEGA - II ETAPA	CUSCO	CUSCO	CUSCO	8.876.818,95	180	-	-	-

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES




3. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

Para asegurar que los procedimientos constructivos se estén haciendo correctamente, es necesario entender y aprender algunas operaciones básicas que se describen a continuación.

3.4 ALINEAR

Es una operación que consiste en colocar varios elementos en una misma dirección o en línea para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo, podemos alinear una hilera de ladrillos, un grupo de paneles de encofrado, etc.

En el caso del asentado de ladrillos, el alineamiento se realiza con un cordel que es estirado y sujetado a las caras exteriores de unos ladrillos que se encuentran en los extremos del muro a asentar (ver figura 44).

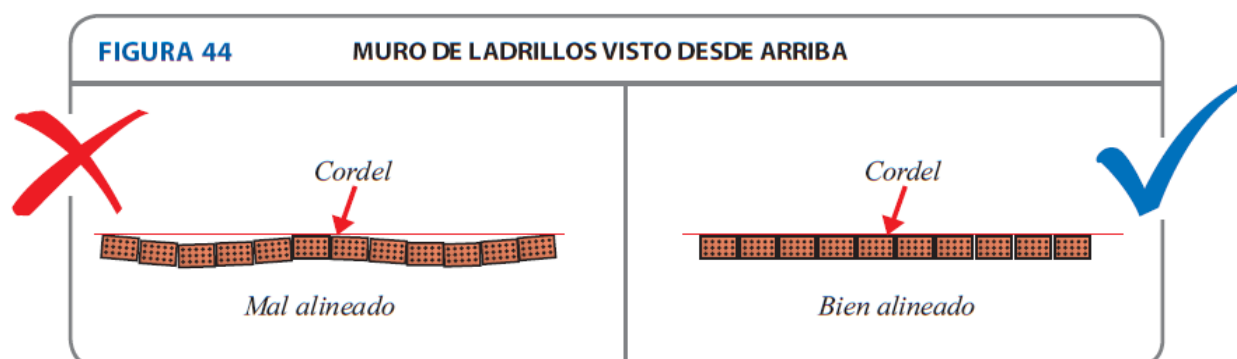


3.5 TRAZAR A ESCUADRA

Para asegurarnos que un trazado sea recto, se utiliza el "Triángulo de Pitágoras" llamado así en honor al matemático que demostró las propiedades de este tipo de triángulo, cuyos lados miden 3, 4 y 5 metros, formando una gran escuadra. Los lados que miden 3 y 4 hacen la escuadra de 90°. En cada punto de este triángulo se colocará una estaca. Cuando se emplee una wincha, procederemos a estirla hasta obtener 12 m., es decir, la suma de 3+4+5=12 m. Luego, uniremos el origen de la cinta (0 m.) con la marca en los 12 m y lo llevaremos al extremo donde se quiere trazar la escuadra. Después, jalaremos la cinta hasta marcar los 3 m y finalmente jalaremos la cinta hasta marcar los 7 m.

Para realizar este procedimiento es necesario contar con tres personas, para que cada una de ellas sujete la cinta en cada esquina del triángulo (ver figura 45).

Una forma de verificar si un lote rectangular ha sido bien trazado, es midiendo sus diagonales, las que deben tener la misma longitud. Si no fuera así, es porque hay algún error en las medidas. Por ejemplo, en el dibujo la longitud BD es igual a la longitud AC (ver figura 45).

ANEXO DE TERMINOS y DEFINICIONES

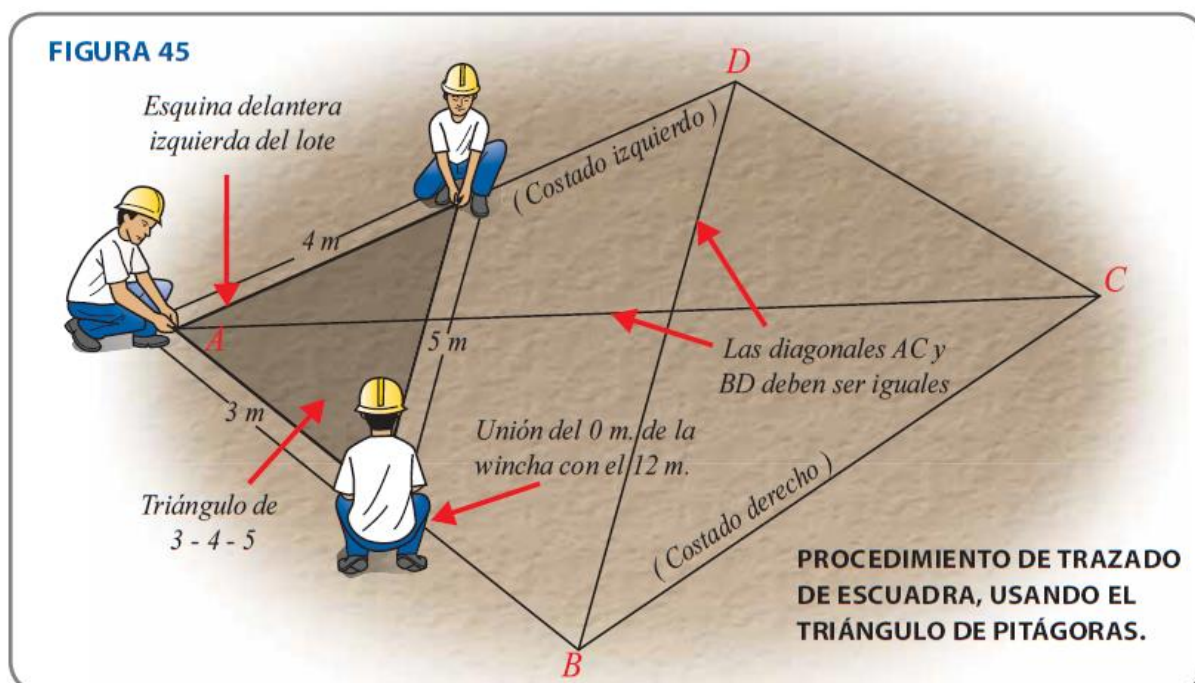
FIGURA 45


3.6 DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO

Las dosificaciones de mezclas de concreto son las cantidades de cemento y de otros materiales que se necesitan para obtener las resistencias indicadas en los planos de estructuras.

A continuación, se presenta un resumen de dosificaciones empleadas para las diferentes partes de una casa, ya explicadas en la sección 1.12.


PROPORCIONES PARA MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO

TIPOS DE CONCRETO Y MORTERO	PARTES DE LA CASA	MATERIALES							f'c kg/cm ²
		CEMENTO	ARENA GRUESA	PIEDRA CHANCADA	HORMIGÓN	ARENA FINA	PIEDRA DE ZANJA	PIEDRA CAJÓN	
CONCRETO SIMPLE	SOLADO	1 BOLSA			4 BUGGIES				80
	FALSO PISO	1 BOLSA			4 BUGGIES				80
	CONTRAPISO	1 BOLSA	1 1/2 BUGGIES						-
CONCRETO CICLOPEO	ZANJA DE CIMENTACIÓN	1 BOLSA			3 1/3 BUGGIES		30%		100
	SOBRECIMENTOS	1 BOLSA			2 1/2 BUGGIES			25%	100
CONCRETO ARMADO	COLUMNAS, MUROS DE CONTENCIÓN, TECHOS, VIGAS Y SOBRECIMIENTO ARMADO	1 BOLSA	1 BUGGY	1 BUGGY					175
MORTERO	ASENTADO DE LADRILLOS	1 BOLSA	1 1/2 BUGGIES						-
	TARRAJEO MUROS Y CIELORRASO	1 BOLSA				1 1/2 BUGGIES			-


Continuara....

DESCRIPCION VISUAL DE ACTIVIDADES y/o ELEMENTOS DE CONTRUCCION DE OBRAS**4. NIVELACIÓN DE TERRENOS EN LADERA**

Utilizando las marcas en las estacas, ya podemos medir en forma horizontal y proceder a demarcar los linderos (ver figura 53). Si medimos en forma inclinada, siguiendo la pendiente, obtendremos medidas incorrectas.

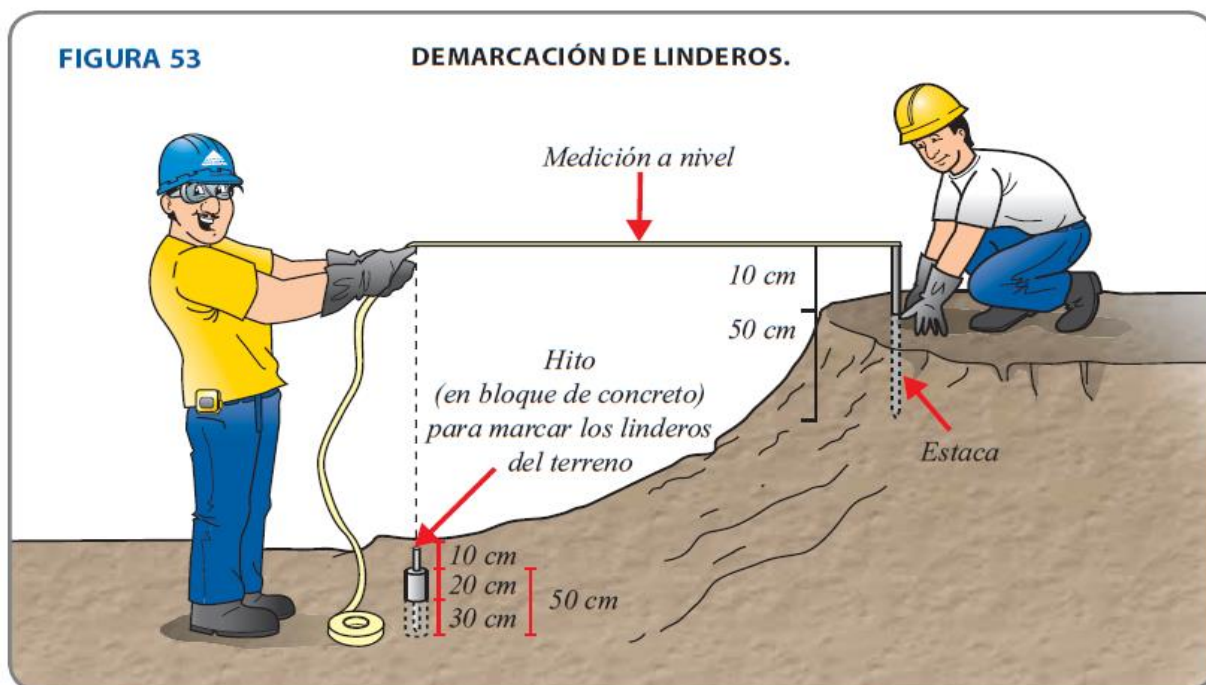

Si queremos calcular el desnivel del terreno, medimos la diferencia de alturas entre estacas y simplemente realizamos una resta (ver figura 54).

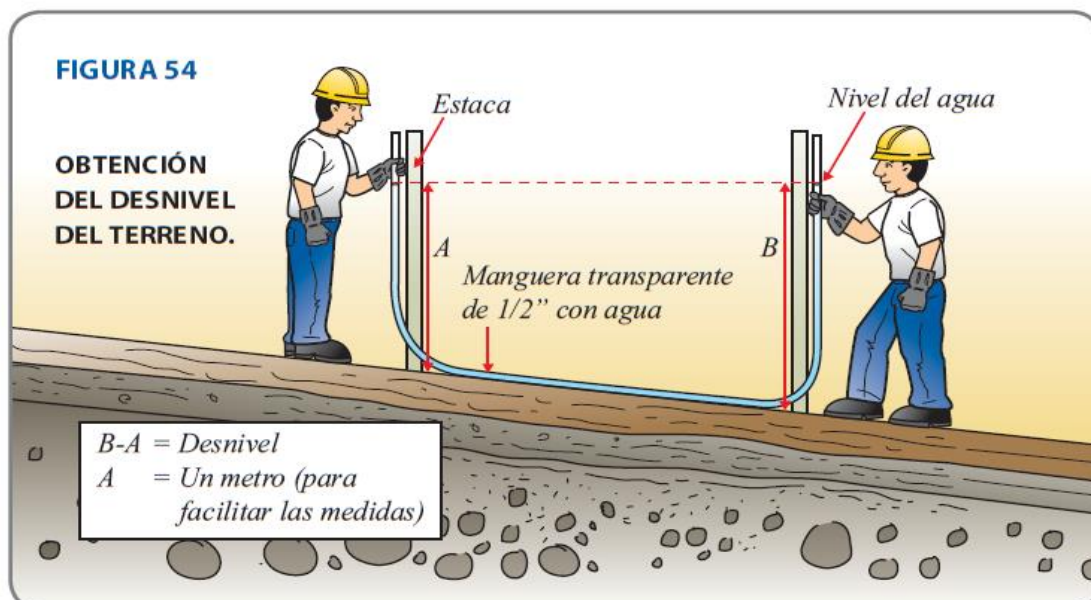



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

LA IMPOSIBILIDAD:

"Si crees que algo es imposible, lo harás imposible".

Bruce Lee



PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRESO PARA TODOS

Trabajamos con responsabilidad y transparencia por una educación de calidad



Responsabilidad

Es ejercer nuestra función de manera integral, siendo conscientes que el trabajo realizado lo hacemos en nombre de la nación y para el servicio de todos los ciudadanos.

¡LEVANTA LA MANO, CONTAMOS CONTIGO!



Oficina General de Ética Pública y Transparencia

